

現在：6工区5業者施工中

— 開通済区間
— 未開通区間（工事完成）

川内沢ダム建設事業全体平面図

川内沢ダムPR動画「見えるダム事業」公開中！


「あたりまえ」を
明日につなぐ仕事



<アクセスはこちらから>

【現時点の見どころ】

- ① 川内沢ダム本体工事 施工状況
- ④ 川内沢ダム管理事務所等新築工事 完成

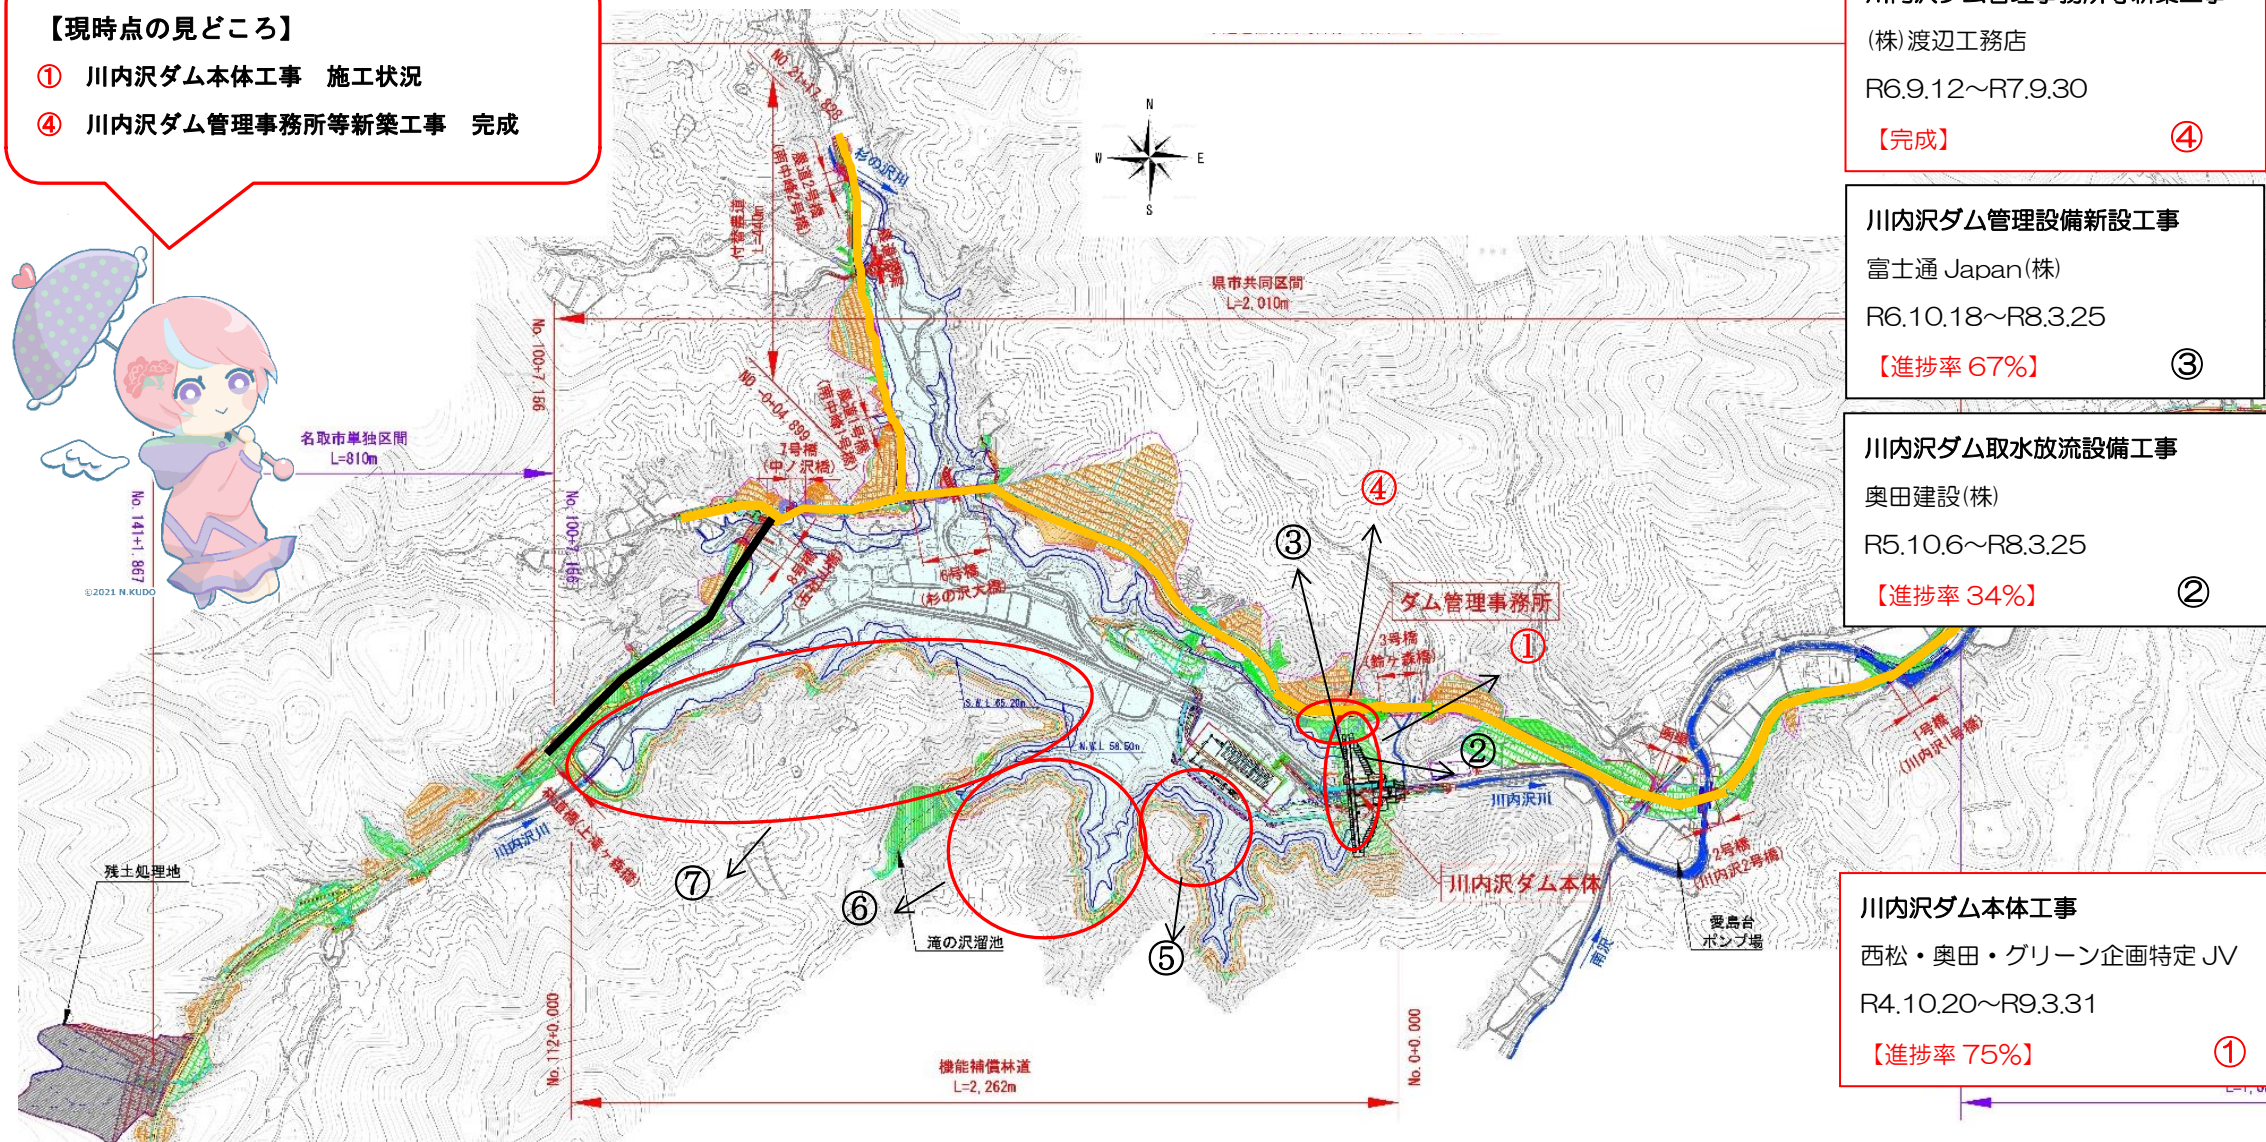

川内沢ダム管理事務所等新築工事
(株) 渡辺工務店
R6.9.12~R7.9.30
【完成】 ④



川内沢ダム管理設備新設工事
富士通 Japan (株)
R6.10.18~R8.3.25
【進捗率 67%】 ③

川内沢ダム取水放流設備工事
奥田建設(株)
R5.10.6~R8.3.25
【進捗率 34%】 ②



川内沢ダム本体工事
西松・奥田・グリーン企画特定 JV
R4.10.20~R9.3.31
【進捗率 75%】 ①



(R6 補) 林道改良工事(その6)
グリーン企画建設(株)
R7.3.25~R8.3.31
【進捗率 30%】 ⑦



(R6 補) 林道改良工事(その5)
奥田建設(株)
R7.3.25~R8.3.31
【進捗率 21%】 ⑥



(R6 補) 林道改良工事(その4)
(株) 橋本店
R7.3.25~R8.3.31
【進捗率 37%】 ⑤

