

現在：5工区4業者施工中


黄色線 開通済区間
黒線 未開通区間（工事完成）

川内沢ダム建設事業全体平面図



【現時点の見どころ】

- ② 川内沢ダム取水放流設備工事
放流設備棟 完成状況
- ⑤ 川内沢ダム取水設備棟外新築工事
水位観測設備棟 完成状況

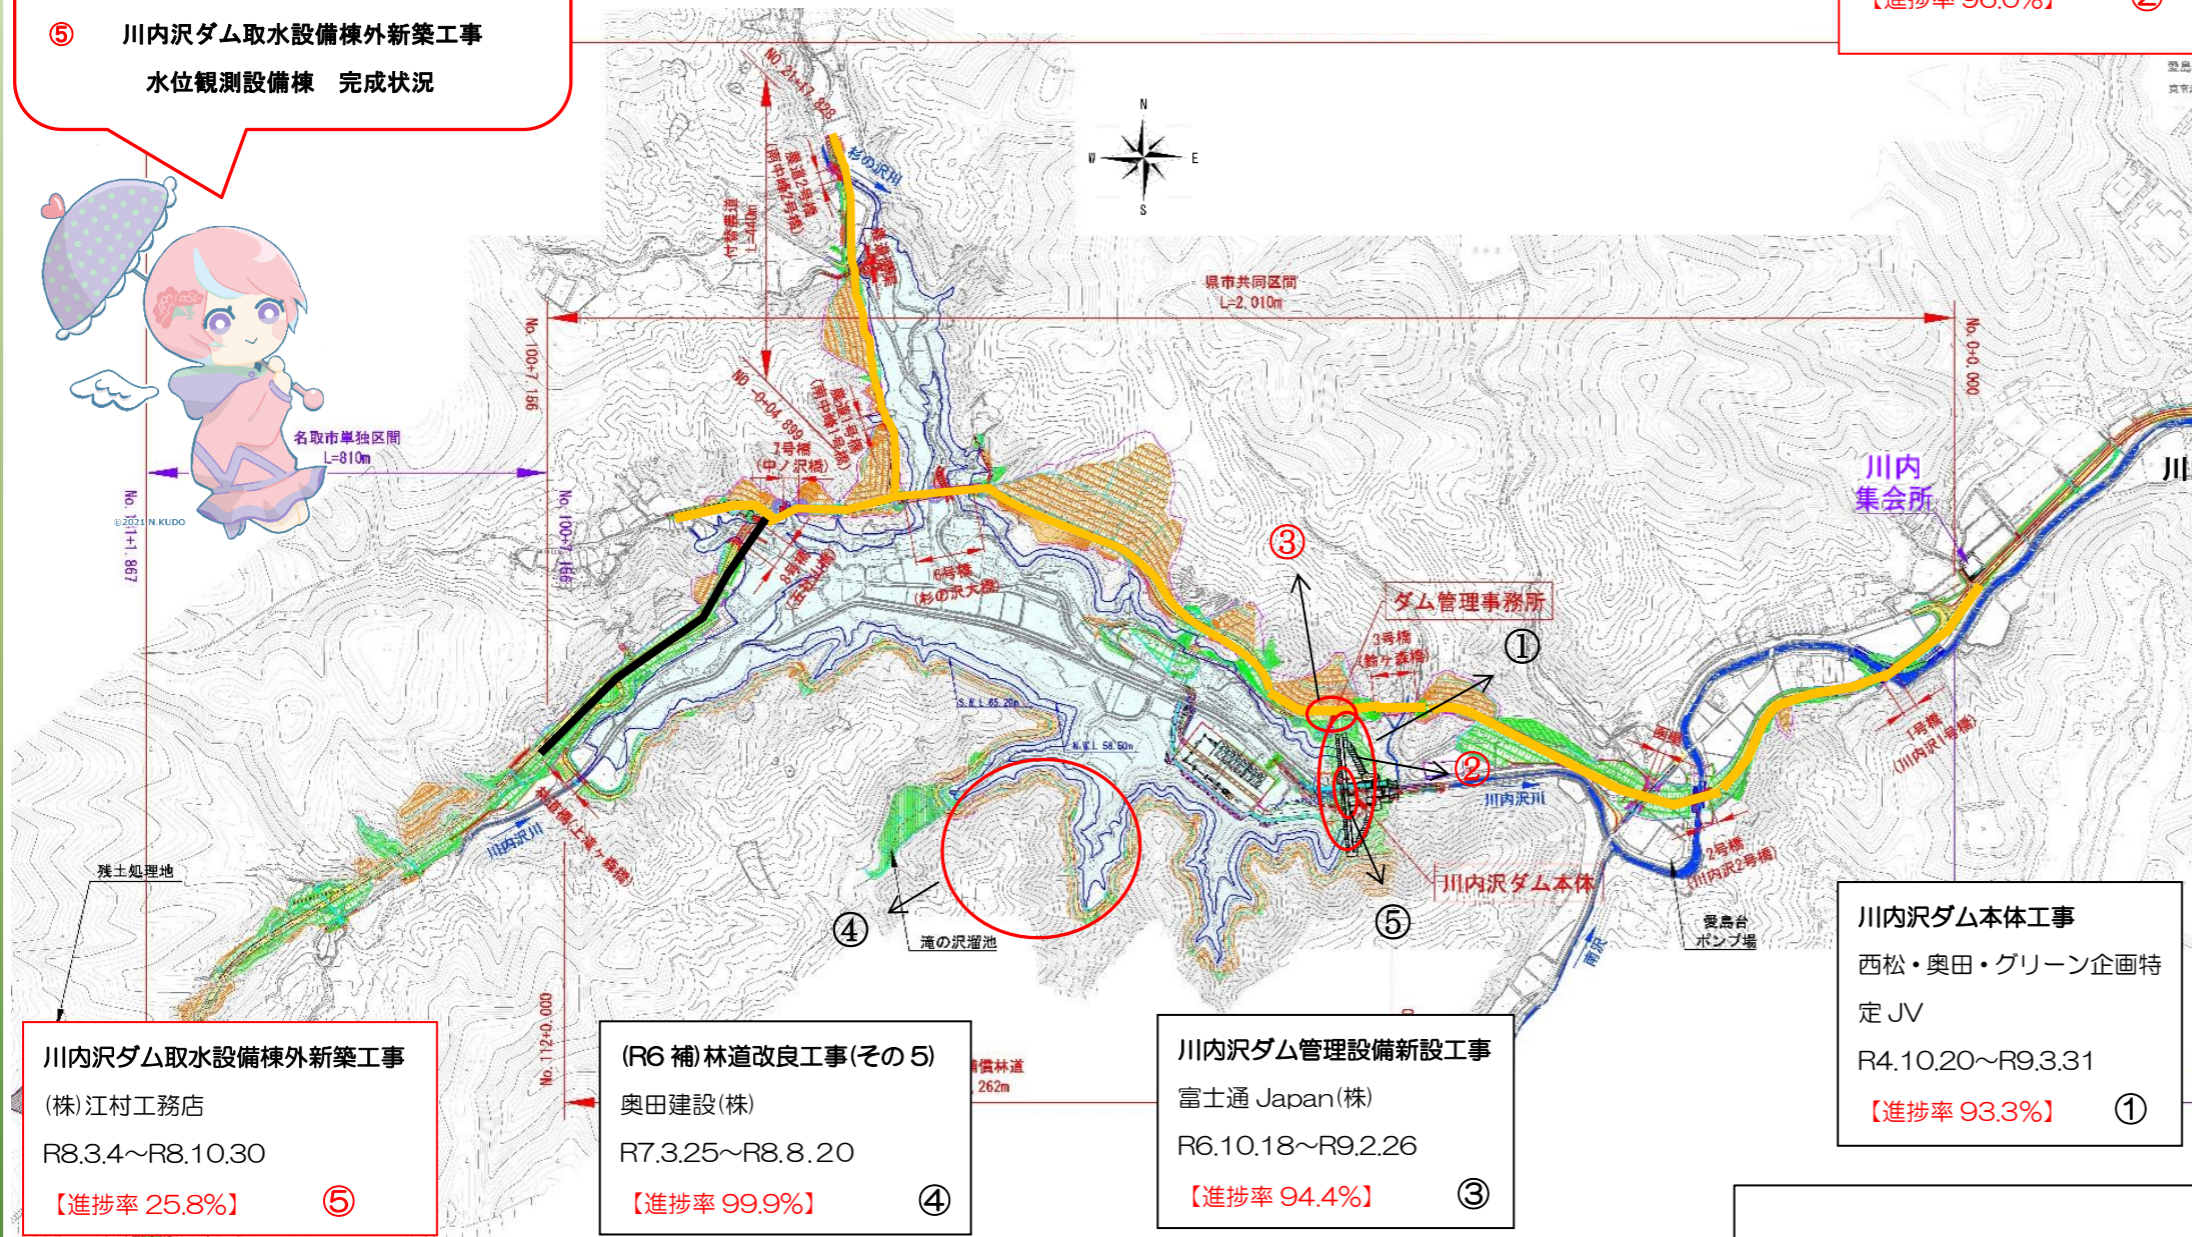

川内沢ダム取水放流設備工事
奥田建設(株)
R5.10.6~R8.10.30
【進捗率 96.0%】 ②



川内沢ダム本体工事
西松・奥田・グリーン企画特
定JV
R4.10.20~R9.3.31
【進捗率 93.3%】 ①

川内沢ダム取水設備棟外新築工事
(株)江村工務店
R8.3.4~R8.10.30
【進捗率 25.8%】 ⑤

(R6 補)林道改良工事(その5)
奥田建設(株)
R7.3.25~R8.8.20
【進捗率 99.9%】 ④

川内沢ダム管理設備新設工事
富士通 Japan(株)
R6.10.18~R9.2.26
【進捗率 94.4%】 ③

