

【①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工開始！】



【①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工開始！】



【①川内沢ダム本体工事 右岸基礎掘削開始！】




【②付替市道6号橋上部工工事 桁架設完了！】



# 川内沢ダム建設事業全体平面図

- (R5) 付替市道舗装工事  
(株)和建設  
R5.7.11~R6.3.29  
【進捗率5%】 ④
- (R4 補) 農道改良工事  
(株)宮城林産  
R5.3.28~R5.10.31  
【進捗率23%】 ③
- (R4) 付替市道6号橋上部工工事  
ライブティック(株)  
R4.10.27~R5.12.28  
【進捗率80%】 ②

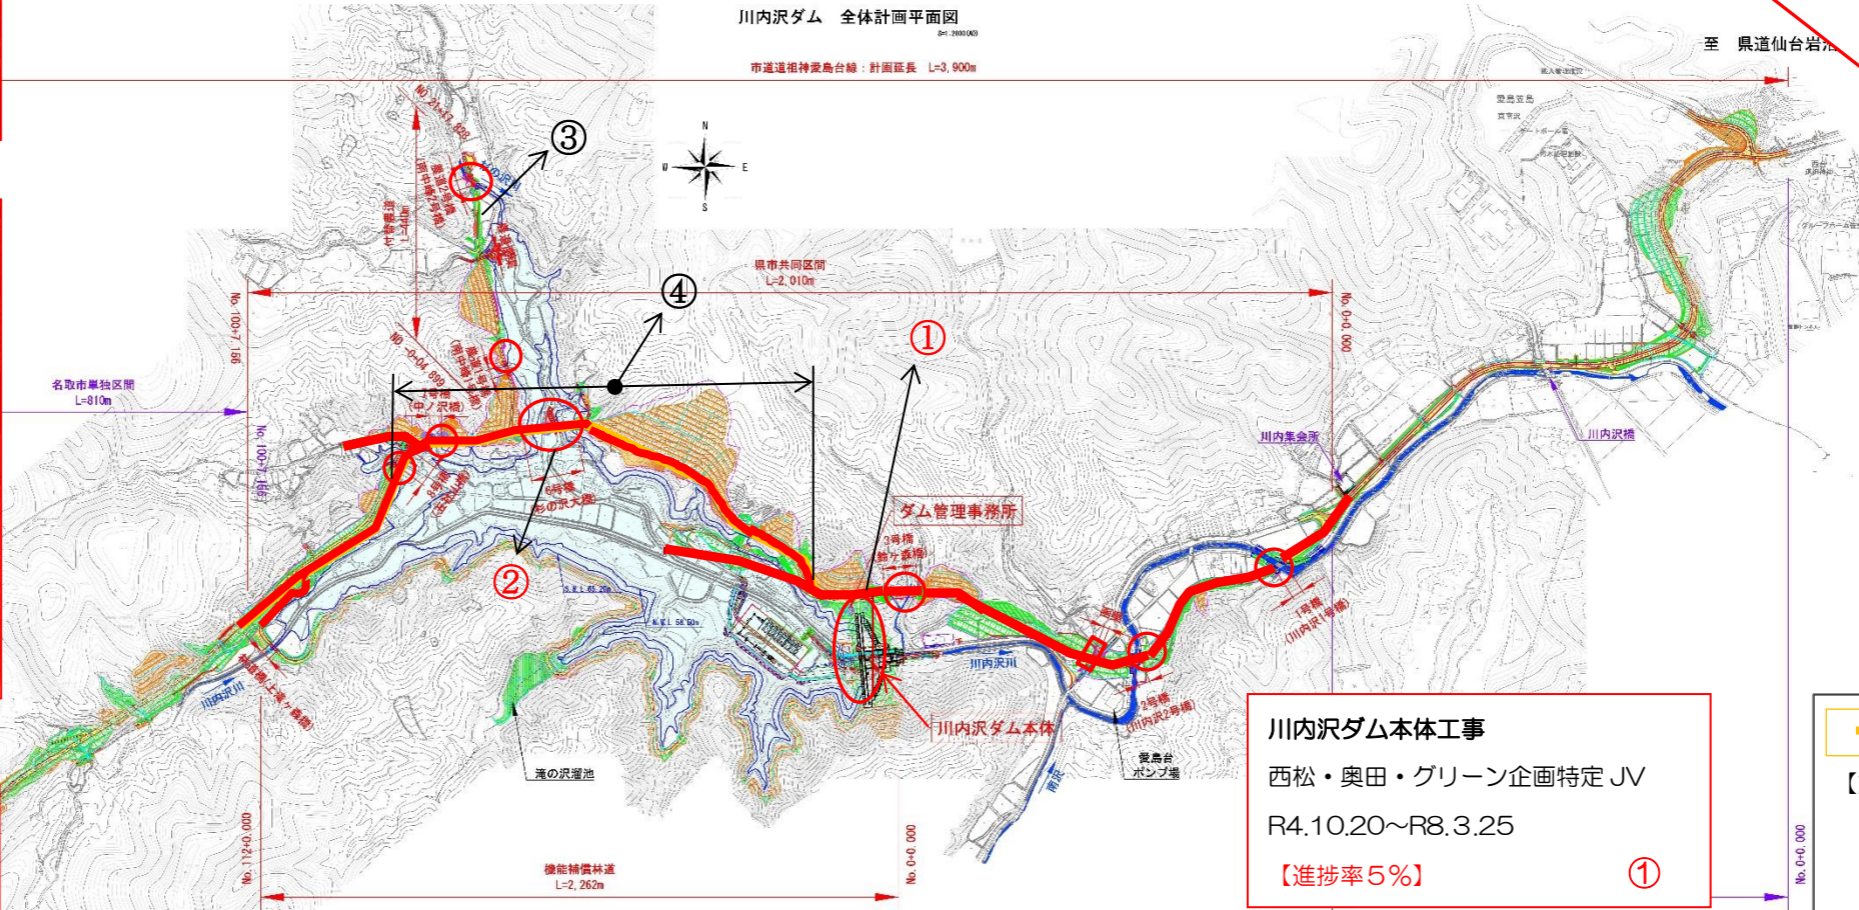

現在：4工区4業者施工中！

- 【9月末の見所】
- ①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工開始！
  - ①川内沢ダム本体工事 右岸基礎掘削開始！
  - ②付替市道6号橋上部工工事 桁架設完了！



令和4年9月作成

