

【①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工状況！】



【①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工状況！】



【①川内沢ダム本体工事 右岸基礎掘削状況！】




川内沢ダム建設事業全体平面図

(R5 補)付替農道改良外工事 グリーン企画建設(株) R6.3.1~R7.3.31 【進捗率 1%】	(R5 補)付替農道1号橋上部工工事 ライブティック(株) R6.2.9~R6.10.31 【進捗率 13%】	川内沢ダム取水放流設備工事 奥田建設(株) R5.10.6~R8.3.25 【進捗率 2%】	(R5)付替市道舗装工事 (株)和建设 R5.7.11~R6.6.28 【進捗率 73%】
⑤	④	③	②

現在：4工区4業者施工中！

【3月末の見所】

- ①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工状況！
- ①川内沢ダム本体工事 右岸基礎掘削状況！
- ②付替市道舗装工事 施工状況！

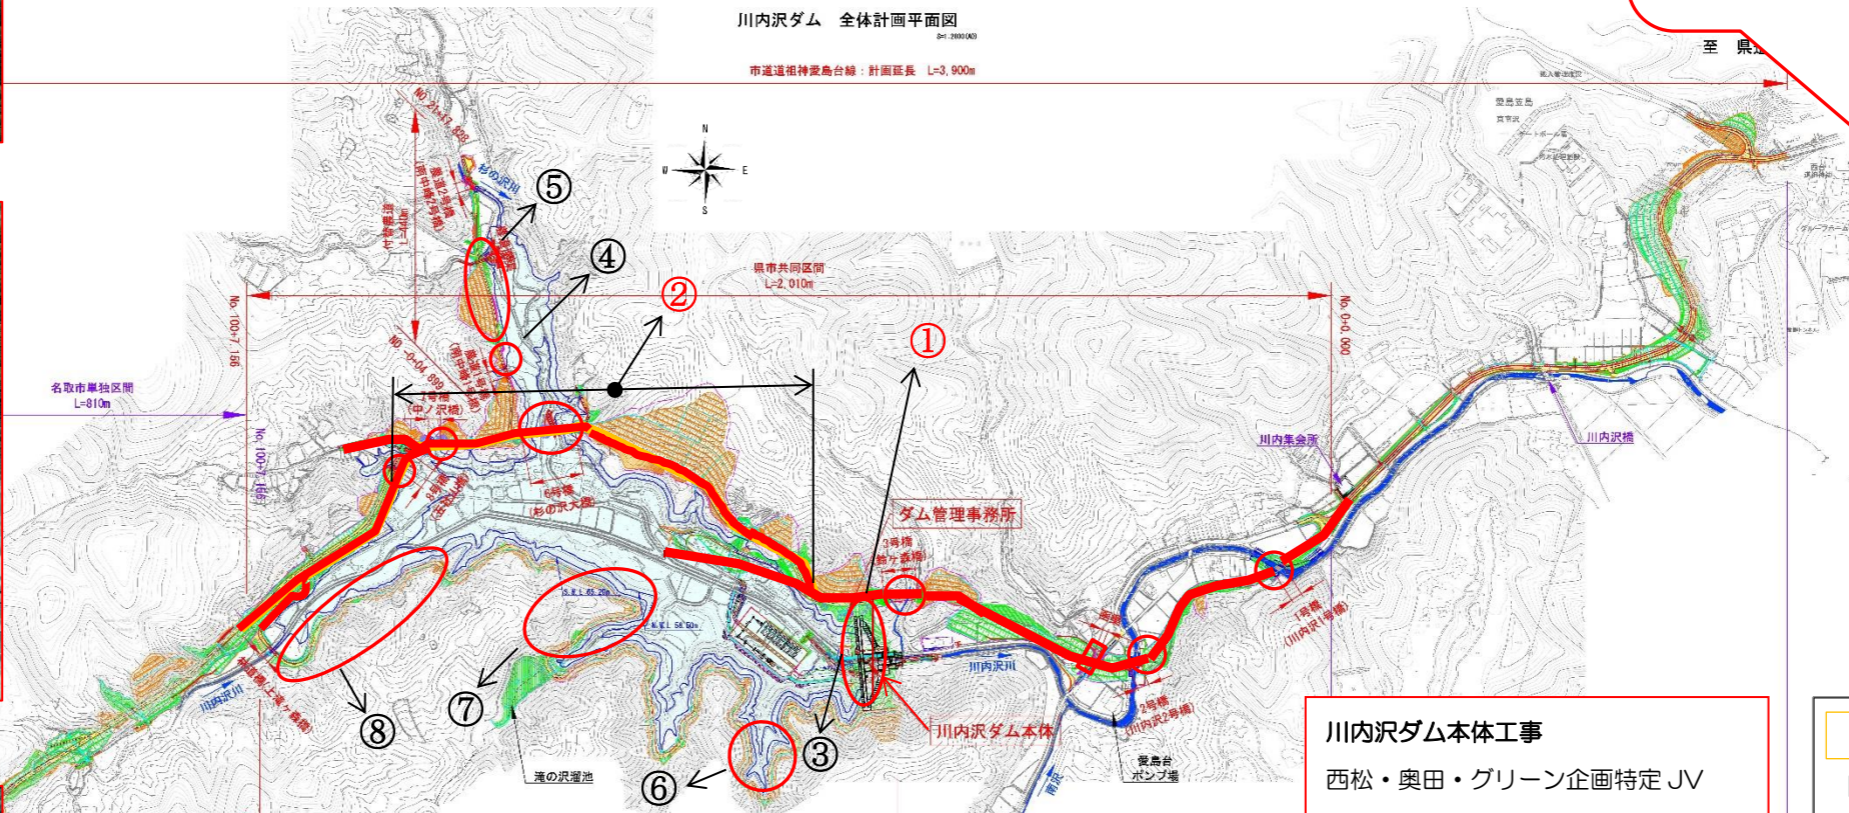

(R5 補)林道改良工事(その3) (株)センショウ・テック. R6.3.5~R7.3.31 【進捗率 0%】	(R5 補)林道改良工事(その2) 奥田建設(株) R6.3.1~R7.3.31 【進捗率 0%】	(R5 補)林道改良工事(その1) (株)橋本店 R6.3.1~R7.3.31 【進捗率 0%】
⑧	⑦	⑥

【②付替市道舗装工事 施工状況！】

