

## 気仙沼大島大橋本体工事第四回目の架設延期について

大島側補剛桁（第四回目）架設を平成29年3月20日（月）に予定していましたが、天候が不安定（風速10m/s以上）となったため、安全確保のために急遽作業を中止しました。大島側補剛桁架設については、3月26日（日）に実施することになりましたのでお知らせします。

また、3月26日（日）の「大島架橋本体工事見学会」については、大島側補剛桁の架設状況の見学に変更となります。

なお、中央径間の架設については、3月29日（水）に実施予定となります。取材を希望される各報道機関の方は、別紙取材申込書に記入の上「気仙沼土木事務所大島架橋建設班」に申込みをお願いします。

### 記

#### 1 見直し架設計画

		架設計画	見直し架設計画	
気仙沼側	アーチリブ	3月5日(日)	3月5日(日)	設置完了
	補剛桁	3月12日(日)	3月12日(日)	
大島側	アーチリブ	3月19日(日)	3月19日(日)	
	補剛桁	3月20日(月)	<b>3月26日(日)</b>	見直し
中央径間	3月26日(日)	<b>3月29日(水)</b>		

予備日：4月2日（日）

※<sub>1</sub> 天候及び潮流などの影響により、架設作業ができない場合には日程を見直します。

※<sub>2</sub> 日程を見直した場合は、各報道機関あて情報提供をいたします。

#### 2 架設作業の流れ

(1) 架設当日、午前1時から当日午前4時30分まで桁吊上げ作業

\* 中央径間の場合、架設前日、午後11時から当日午前4時30分


(2) 架設当日、午前4時30分から午前5時30分まで架設地点へ曳航作業

(3) 架設当日、午前5時30分から午後4時まで架設作業

#### 3 緊急時の対応

3月26日（日）の架設が中止になる場合は、3月25日の午後5時頃までに宮城県気仙沼土木事務所のホームページ（<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/>）に掲載しますのでご確認ください。

## 2 架設作業の流れ

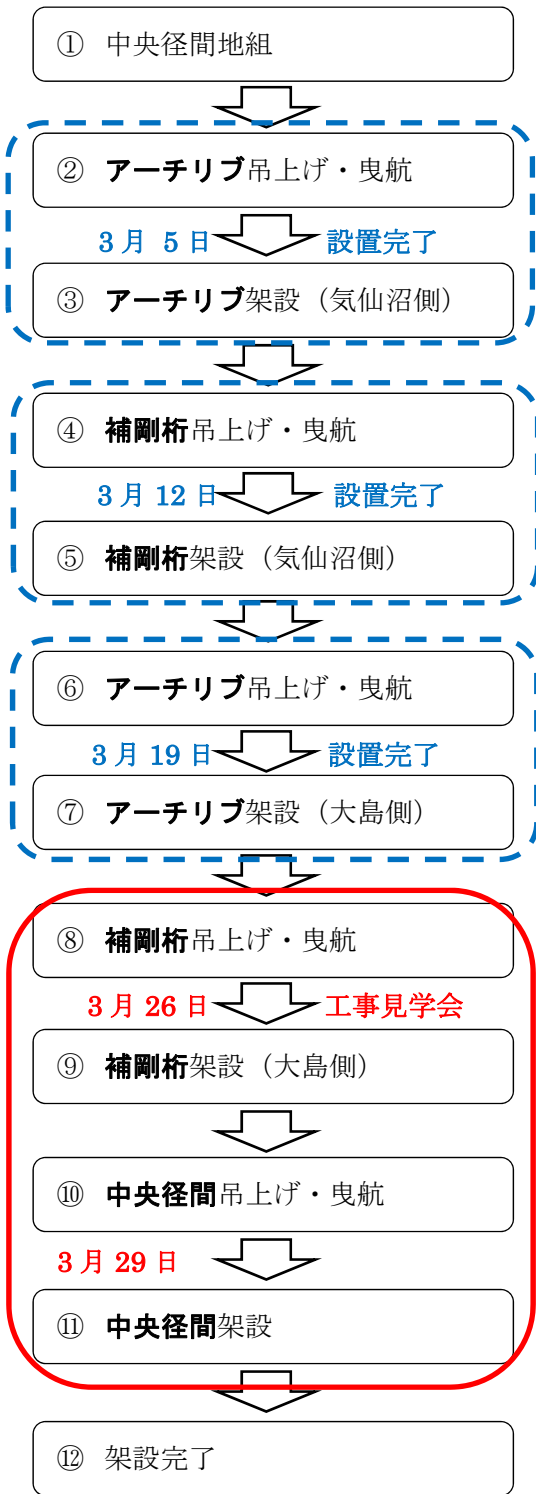

見直し

① 中央径間地組




②④⑥⑧⑩ 桁吊上げ・曳航



③⑦ アーチリブ架設



⑤⑨ 補剛桁架設



⑪ 中央径間架設



⑫ 架設完了

