

東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況

(令和元年7月末現在)

公共土木施設の災害復旧事業の進捗状況及び土木部最重点項目の「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」を推進するための津波対策、復興まちづくり事業、災害公営住宅の整備について、令和元年7月末現在の状況を以下のとおり取りまとめた。


1 公共土木施設の災害復旧事業（県事業）

- 公共土木施設全体 **2,296**箇所のうち、工事着手箇所は、県全体で**2,295**箇所（全体の約99%）に着手。
工事完成箇所は、県全体で**2,163**箇所（全体の約94%）が完成。

<内陸・沿岸部別>

- 内陸部は、**808**箇所全てが完成。
- 沿岸部は、**1,488**箇所のうち、**1,487**箇所（全体の約99%）に着手、そのうち**1,355**箇所（全体の約91%）が完成。

●公共土木施設の復旧工事の進捗状況

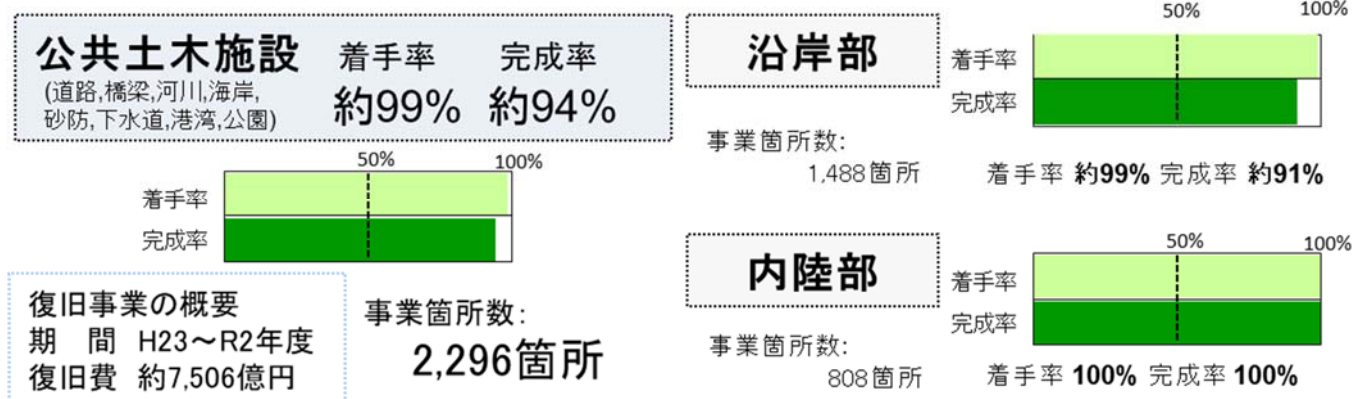

●現場の状況（写真）



桜川
(南三陸町)



清水橋
(南三陸町)

※下線部分は、前月からの変更点

2 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築

(1) 津波対策※

<河川施設>

- 全体42箇所**全てにおいて工事に着手**。
- 工事完了箇所数は、県全体で**10箇所**（全体の約24%）。

<海岸（建設・港湾）施設>

- 全体98地区海岸**全てにおいて工事に着手**。
- 工事完了箇所数は、県全体で**54地区**（全体の約55%）。

（※津波対策の対象施設は、災害復旧事業により実施する海岸や河川堤防のほか、復興事業により新設する堤防も含む）

(2) 復興まちづくり事業

<防災集団移転促進事業>

- 計画されていた12市町195地区**全地区で住宅等建築工事可能**。
（※住宅等建築工事可能とは、造成工事が完了する等、建築工事の準備が整った状態のことを示す）

<土地区画整理事業>

- 県全体で11市町35地区で計画されており、**全地区で事業認可・工事着工**、**11市町34地区**（全体の約97%）で**住宅等建築工事可能**。
- 換地処分地区数は、県全体で**17地区**。

<津波復興拠点整備事業>

- 8市町12地区で計画されており、**全地区で事業認可・工事着工・住宅等建築工事可能**。
- 事業完了地区数は、県全体で**7地区**。

(3) 災害公営住宅の整備事業


- 整備計画戸数15,823戸の**整備が完了**。

公共土木施設の復旧工事の進捗状況

(公共土木施設災害復旧事業：県事業)

公共土木施設
(道路、橋梁、河川、海岸、砂防、下水道、港湾、公園)

着手率 **約99%** 完成率 **約94%**



復旧事業の概要
期間 H23～R2年度
復旧費 約7,506億円


事業箇所数：
2,296箇所

沿岸部

着手率 1,487箇所
完成率 1,355箇所

事業箇所数：
1,488箇所

着手率 **約99%** 完成率 **約91%**




内陸部

着手率 808箇所
完成率 808箇所

事業箇所数：
808箇所

着手率 **100%** 完成率 **100%**



項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)
道路・橋梁施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～R2年度 復旧費 約919億円	着手率 100% 完成率 約98% 事業箇所数： 道路 1,411箇所, 橋梁 123箇所	砂防・地滑・急傾斜施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～24年度 復旧費 約8億円	着手率 100% 完成率 100% 事業箇所数：8施設
河川施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～R2年度 復旧費 約4,039億円	着手率 約99% 完成率 約88% 事業箇所数：273箇所	下水道施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～25年度 復旧費 約351億円	着手率 100% 完成率 100% 事業箇所数：121箇所
海岸保全施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～R2年度 復旧費 約1,272億円	着手率 100% 完成率 約69% 事業箇所数：73施設	公園施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～25年度 復旧費 約17億円	着手率 100% 完成率 100% 事業箇所数：7箇所
港湾施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～R2年度 復旧費 約899億円	着手率 100% 完成率 約83% 事業箇所数：280箇所	凡例： 着手 完成	

土木部最重要項目

災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の推進

令和元年7月末現在

津波対策※1

市町名	土木部所管 河川		土木部所管 海岸(建設・消波)	
	箇所数	上段：済・率(本格工事着手) 下段：済・率(工事完了)	箇所数	上段：済・率(本格工事着手) 下段：済・率(工事完了)
気仙沼市	7	7 100% 0 0.0%	24	24 100% 19 79.2%
青森町	10	10 100% 2 20.0%	7	7 100% 5 71.4%
石巻市	8	8 100% 0 0.0%	26	26 100% 8 30.8%
女川町	1	1 100% 1 100%	9	9 100% 8 88.9%
真木町	4	4 100% 2 50.0%	8	8 100% 5 62.5%
松島町	1	1 100% 1 100%	2	2 100% 2 100%
利府町				
雄勝町			11	11 100% 3 27.3%
七ヶ浜町			8	8 100% 4 50.0%
多賀城町	1	1 100% 1 100%		
仙台市	2	2 100% 0 0.0%	3	3 100% 0 0.0%
名取市	3	3 100% 0 0.0%		
瀬沼市	3	3 100% 3 100%		
亶理町				
山元町	2	2 100.0% 0 0.0%		
その他6市町				
合計	42	42 100% 10 23.8%	98	98 100% 54 55.1%

復興まちづくり事業

市町名	防災集団転移促進事業		土地区画整理事業	
	計画地区数	上段：済・率(工事着工(造成工事着手等)) 下段：済・率(住宅等建築工事可能)	計画地区数	上段：済・率(工事着工(造成工事着手等)) 下段：済・率(住宅等建築工事可能)
気仙沼市	51	51 100% 51 100%	4	4 100% 3 75.0%
青森町	26	26 100% 26 100%	1	1 100% 1 100%
石巻市	56	56 100% 56 100%	15	15 100% 15 100%
女川町	22	22 100% 22 100%	1※2	1 100% 1 100%
真木町	7	7 100% 7 100%	3	3 100% 3 100%
松島町				
利府町				
雄勝町	2	2 100% 2 100%	2	2 100% 2 100%
七ヶ浜町	5	5 100% 5 100%	4	4 100% 4 100%
多賀城町			1	1 100% 1 100%
仙台市	14	14 100% 14 100%	1	1 100% 1 100%
名取市	2	2 100% 2 100%	2	2 100% 2 100%
瀬沼市	2	2 100% 2 100%	1	1 100% 1 100%
亶理町	5	5 100% 5 100%		
山元町	3	3 100% 3 100%		
その他6市町				
合計	195	195 100% 195 100%	35	35 100% 34 97.1%

災害公営住宅の整備

市町名	災害公営住宅	
	計画戸数	上段：済・率(工事着手) 下段：済・率(工事完了)
気仙沼市	2,087	2,087 100% 2,087 100%
青森町	738	738 100% 738 100%
石巻市	4,456	4,456 100% 4,456 100%
女川町	859	859 100% 859 100%
真木町	1,101	1,101 100% 1,101 100%
松島町	52	52 100% 52 100%
利府町	25	25 100% 25 100%
雄勝町	390	390 100% 390 100%
七ヶ浜町	212	212 100% 212 100%
多賀城町	532	532 100% 532 100%
仙台市	3,179	3,179 100% 3,179 100%
名取市	655	655 100% 655 100%
瀬沼市	210	210 100% 210 100%
亶理町	477	477 100% 477 100%
山元町	490	490 100% 490 100%
その他6市町	360	360 100% 360 100%
合計	15,823	15,823 100% 15,823 100%

※1：復興事業による新設工事も含む

事業計画の交通大臣同意は全地区で得ている
●津波復興拠点整備事業は、8市町12地区が計画され、全地区で事業認可・工事着手、住宅等建築可能となり、7地区において事業が完了している。

※2：女川町は事業認可を4地区取得しているが、1地区として計上している。
※3：計画中
※4：計画中
※5：計画中
※6：計画中
※7：計画中
※8：計画中
※9：計画中
※10：計画中
※11：計画中
※12：計画中
※13：計画中
※14：計画中
※15：計画中
※16：計画中
※17：計画中
※18：計画中
※19：計画中
※20：計画中
※21：計画中
※22：計画中
※23：計画中
※24：計画中
※25：計画中
※26：計画中
※27：計画中
※28：計画中
※29：計画中
※30：計画中
※31：計画中
※32：計画中
※33：計画中
※34：計画中
※35：計画中
※36：計画中
※37：計画中
※38：計画中
※39：計画中
※40：計画中
※41：計画中
※42：計画中
※43：計画中
※44：計画中
※45：計画中
※46：計画中
※47：計画中
※48：計画中
※49：計画中
※50：計画中
※51：計画中
※52：計画中
※53：計画中
※54：計画中
※55：計画中
※56：計画中
※57：計画中
※58：計画中
※59：計画中
※60：計画中
※61：計画中
※62：計画中
※63：計画中
※64：計画中
※65：計画中
※66：計画中
※67：計画中
※68：計画中
※69：計画中
※70：計画中
※71：計画中
※72：計画中
※73：計画中
※74：計画中
※75：計画中
※76：計画中
※77：計画中
※78：計画中
※79：計画中
※80：計画中
※81：計画中
※82：計画中
※83：計画中
※84：計画中
※85：計画中
※86：計画中
※87：計画中
※88：計画中
※89：計画中
※90：計画中
※91：計画中
※92：計画中
※93：計画中
※94：計画中
※95：計画中
※96：計画中
※97：計画中
※98：計画中
※99：計画中
※100：計画中
