

12月末の見所!

- ① R2 道路改良工事(その2) 1~2号橋区間完成
- ⑨ 林道橋コンクリート打設完了
- ⑪ R3 道路改良工事伐採作業本格化



川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」

【⑨林道橋「コンクリート打設完了」】



川内沢ダム建設事業全体平面図

現在: 15工区 10業者 施工中!

(R3)7号橋上部工工事
東日本コンクリート(株)
R3.11.11~R4.7.29
【進捗率3%】 ⑭

(R3)農道橋下部工工事
(株)石井土木
R3.7.30~R4.3.31
【進捗率42%】 ⑧

(R3)6号橋下部工工事
(株)深松組
R3.6.30~R4.3.31
【進捗率39%】 ④



道路改良工事

(R3)道路改良工事
星造園土木(株)
R3.7.13~R4.3.31
【進捗率42%】 ⑦

(R2)7号橋下部工工事
グリーン企画建設(株)
R3.6.16~R4.1.31
【進捗率58%】 ⑤

(R3)8号橋上部工工事
ライブディック(株)
R3.11.11~R4.9.30
【進捗率2%】 ⑮

(R2)8号橋下部工工事
(株)環境施設
R3.6.17~R4.1.31
【進捗率55%】 ⑥

(R3)道路改良工事(その3)
(株)深松組
R3.10.5~R5.3.24
【進捗率8%】 ⑪

【⑩R3 道路改良工事「伐採作業本格化」】



(R3)ダム仮設工外工事
奥田建設(株)
R3.11.5~R5.2.28
【進捗率2%】 ⑬

(R2)道路改良工事(その2)
(株)橋本店
R3.3.9~R4.3.31
【進捗率60%】 ①

(R3)舗装工事
(株)佐藤渡辺東北支店
R3.10.12~R5.1.31
【令和4年1月6日着手】 ⑫


(R3)林道橋工事
(株)石井土木
R3.7.13~R4.1.31
【進捗率93%】 ⑨

(R2)3号橋上部工工事
東日本コンクリート(株)
R3.5.19~R4.2.28
【進捗率55%】 ③


(R3)道路改良工事(その2)
グリーン企画建設(株)
R3.10.8~R5.1.31
【進捗率5%】 ⑩

(R2)函渠工工事
グリーン企画建設(株)
R3.2.18~R4.2.28
【進捗率86%】 ②

【①R2 道路改良工事(その2)「1~2号橋区間完成」】

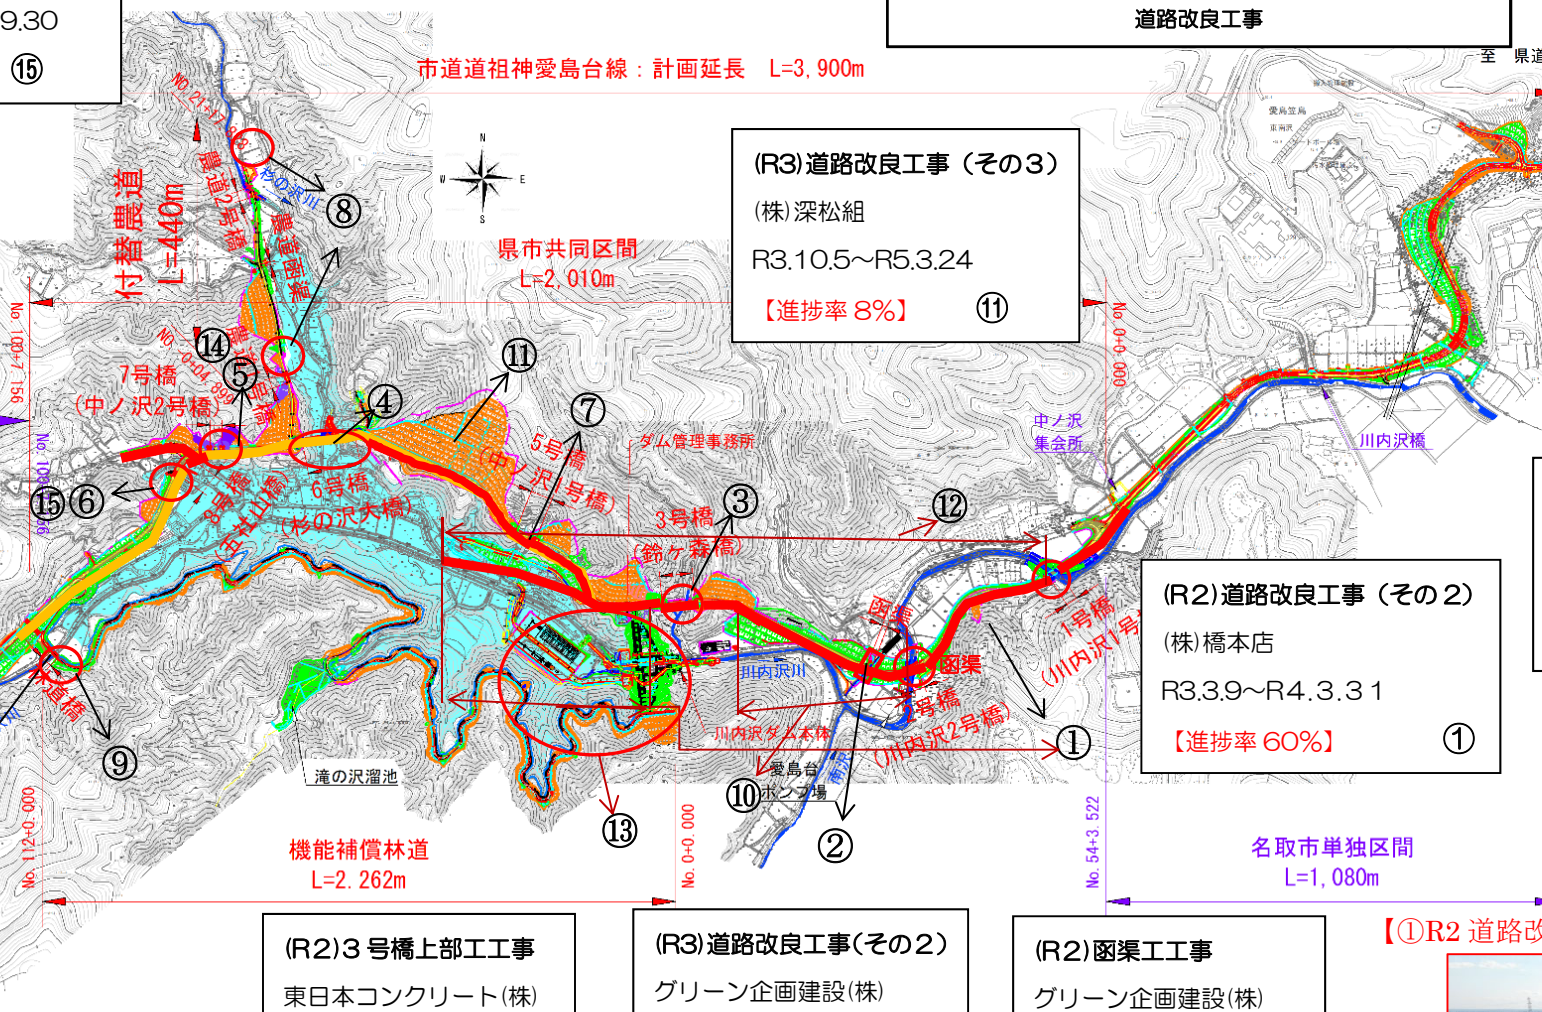

橋梁下部工工事(7号橋,8号橋)

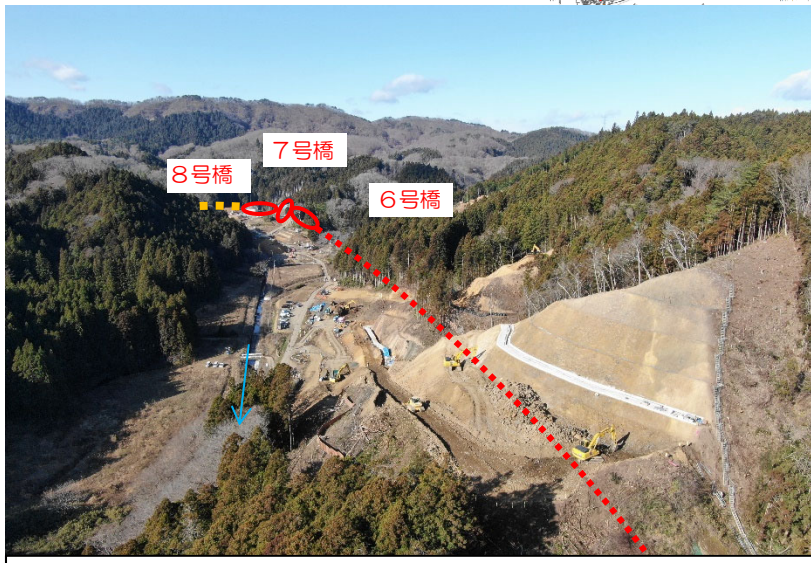

付替道路全景(ダム建設位置~8号橋)



ダム建設位置



函渠工工事

- 付替市道 L=2,010m
- 【施工中】道路改良工事
- 橋梁工事
- 函渠工工事
