

# 川内沢ダム建設事業全体平面図

現在：11工区7業者施工中！  
完成：1工区1業者


【①道路改良工事（その2）完成目前！】



【⑤道路改良工事（その4）完成！】



【⑫付替市道道路改良工事の本格化！】

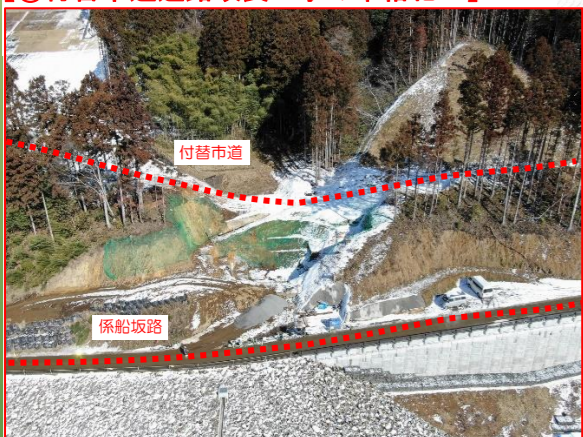

- (R3補) 道路改良工事(その4)**  
奥田建設(株)  
R4.4.11~R5.3.31  
【R5.1.16完成!】 ⑤
- 川内沢ダム本体工事**  
西松・奥田・グリーン企画特定JV  
R4.10.20~R8.3.25  
【現地調査中】 ⑩
- (R3補) 農道改良外工事**  
(株)深松組  
R4.4.1~R5.3.31  
【進捗率54%】 ⑦
- (R3) 舗装工事**  
(株)佐藤渡辺東北支店  
R3.10.12~R5.3.31  
【進捗率75%】 ③

- (R3補) 林道改良外工事**  
グリーン企画建設(株)  
R4.4.1~R5.3.31  
【進捗率83%】 ⑨

- (R3) 道路改良工事(その3)**  
(株)深松組  
R3.10.5~R5.3.24  
【進捗率91%】 ②

- (R3) ダム仮設外工事**  
奥田建設(株)  
R3.11.5~R5.2.28  
【進捗率62%】 ④

- (R3) 道路改良工事(その2)**  
グリーン企画建設(株)  
R3.10.8~R5.3.31  
【進捗率96%】 ①



- (R3補) 道路改良工事(その5)**  
(有)渋谷組  
R4.4.1~R5.3.31  
【進捗率78%】 ⑥

- (R4) 付替市道6号橋上部工工事**  
ライブディック(株)  
R4.10.27~R5.12.28  
【進捗率11%】 ⑪

- (R4) 付替市道道路改良工事**  
グリーン企画建設(株)  
R4.10.18~R5.3.31  
【進捗率22%】 ⑫

- (R3補) 農道2号橋上部工工事**  
ライブディック(株)  
R4.3.25~R5.3.31  
【進捗率38%】 ⑧


【①道路改良工事（その2）完成目前！】

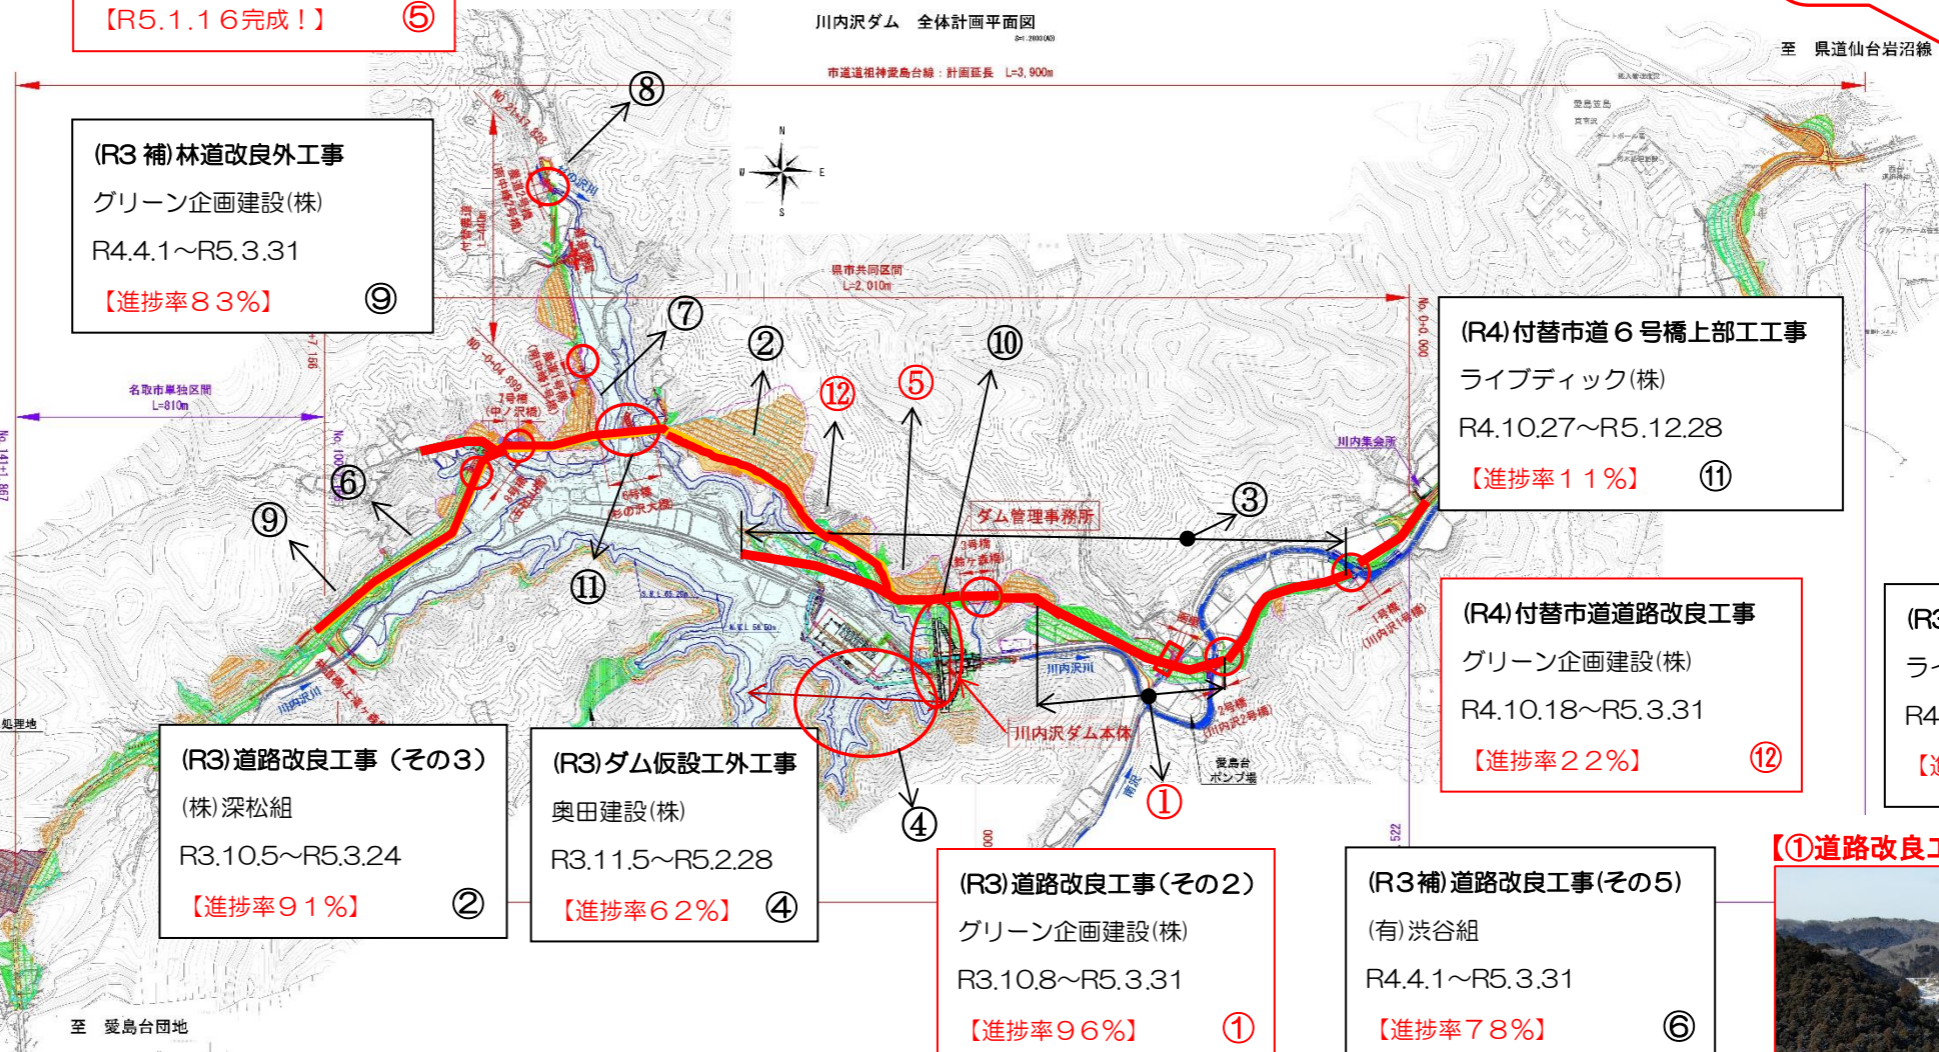


川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」



付替道路全景(ダム建設位置~8号橋)

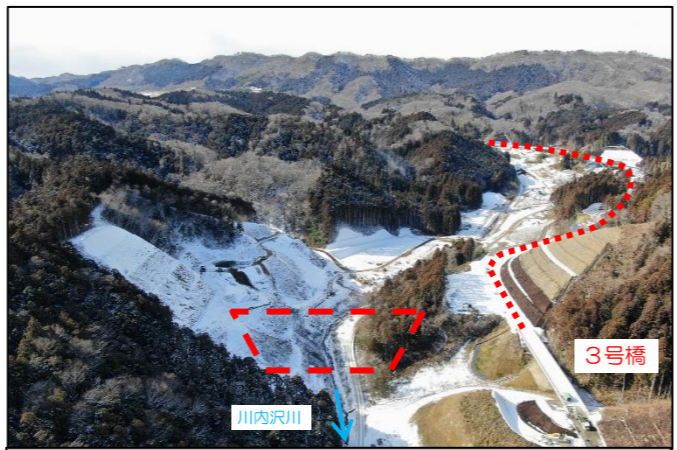

ダム建設位置

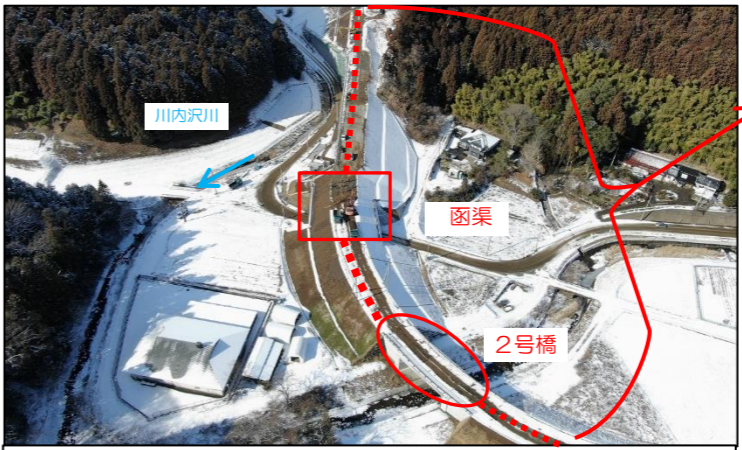

付替道路全景(2号橋~函渠~3号橋手前)
