

【5月末の見所】

- ⑤ (R3) 舗装工事の起点側排水工着手!
- ⑨ (R3 補) 道路改良工事(その4) 工事の掘削開始!
- ⑩ (R3 補) 道路改良工事(その5) 工事の伐採開始!



川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」

【⑩(R3 補)道路改良工事(その5)工事の伐採開始!】




伐採施工中




橋梁下部工工事(7号橋, 8号橋)



付替道路全景(ダム建設位置~8号橋)

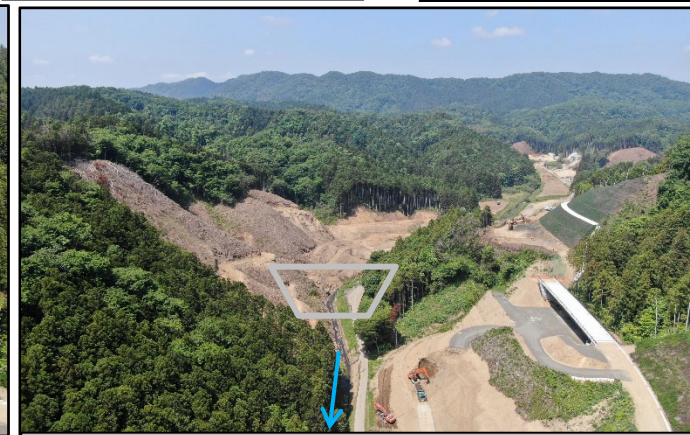

ダム建設位置

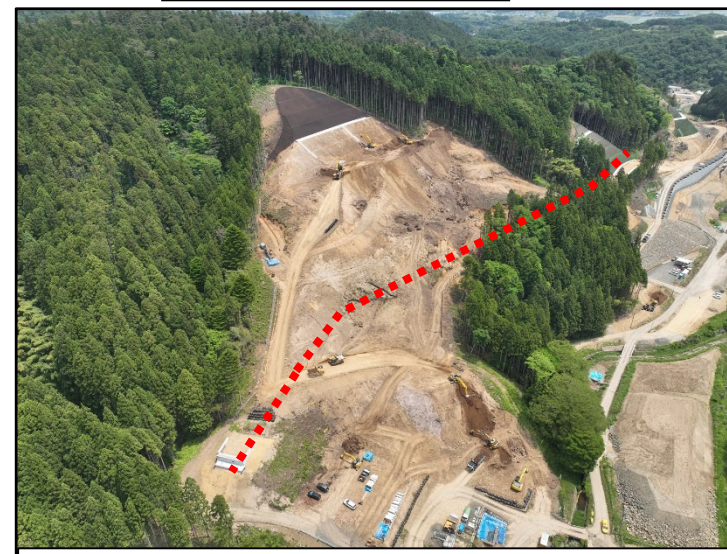


④(R3)道路改良工事(その3)



排水工施工中

川内沢ダム建設事業全体平面図

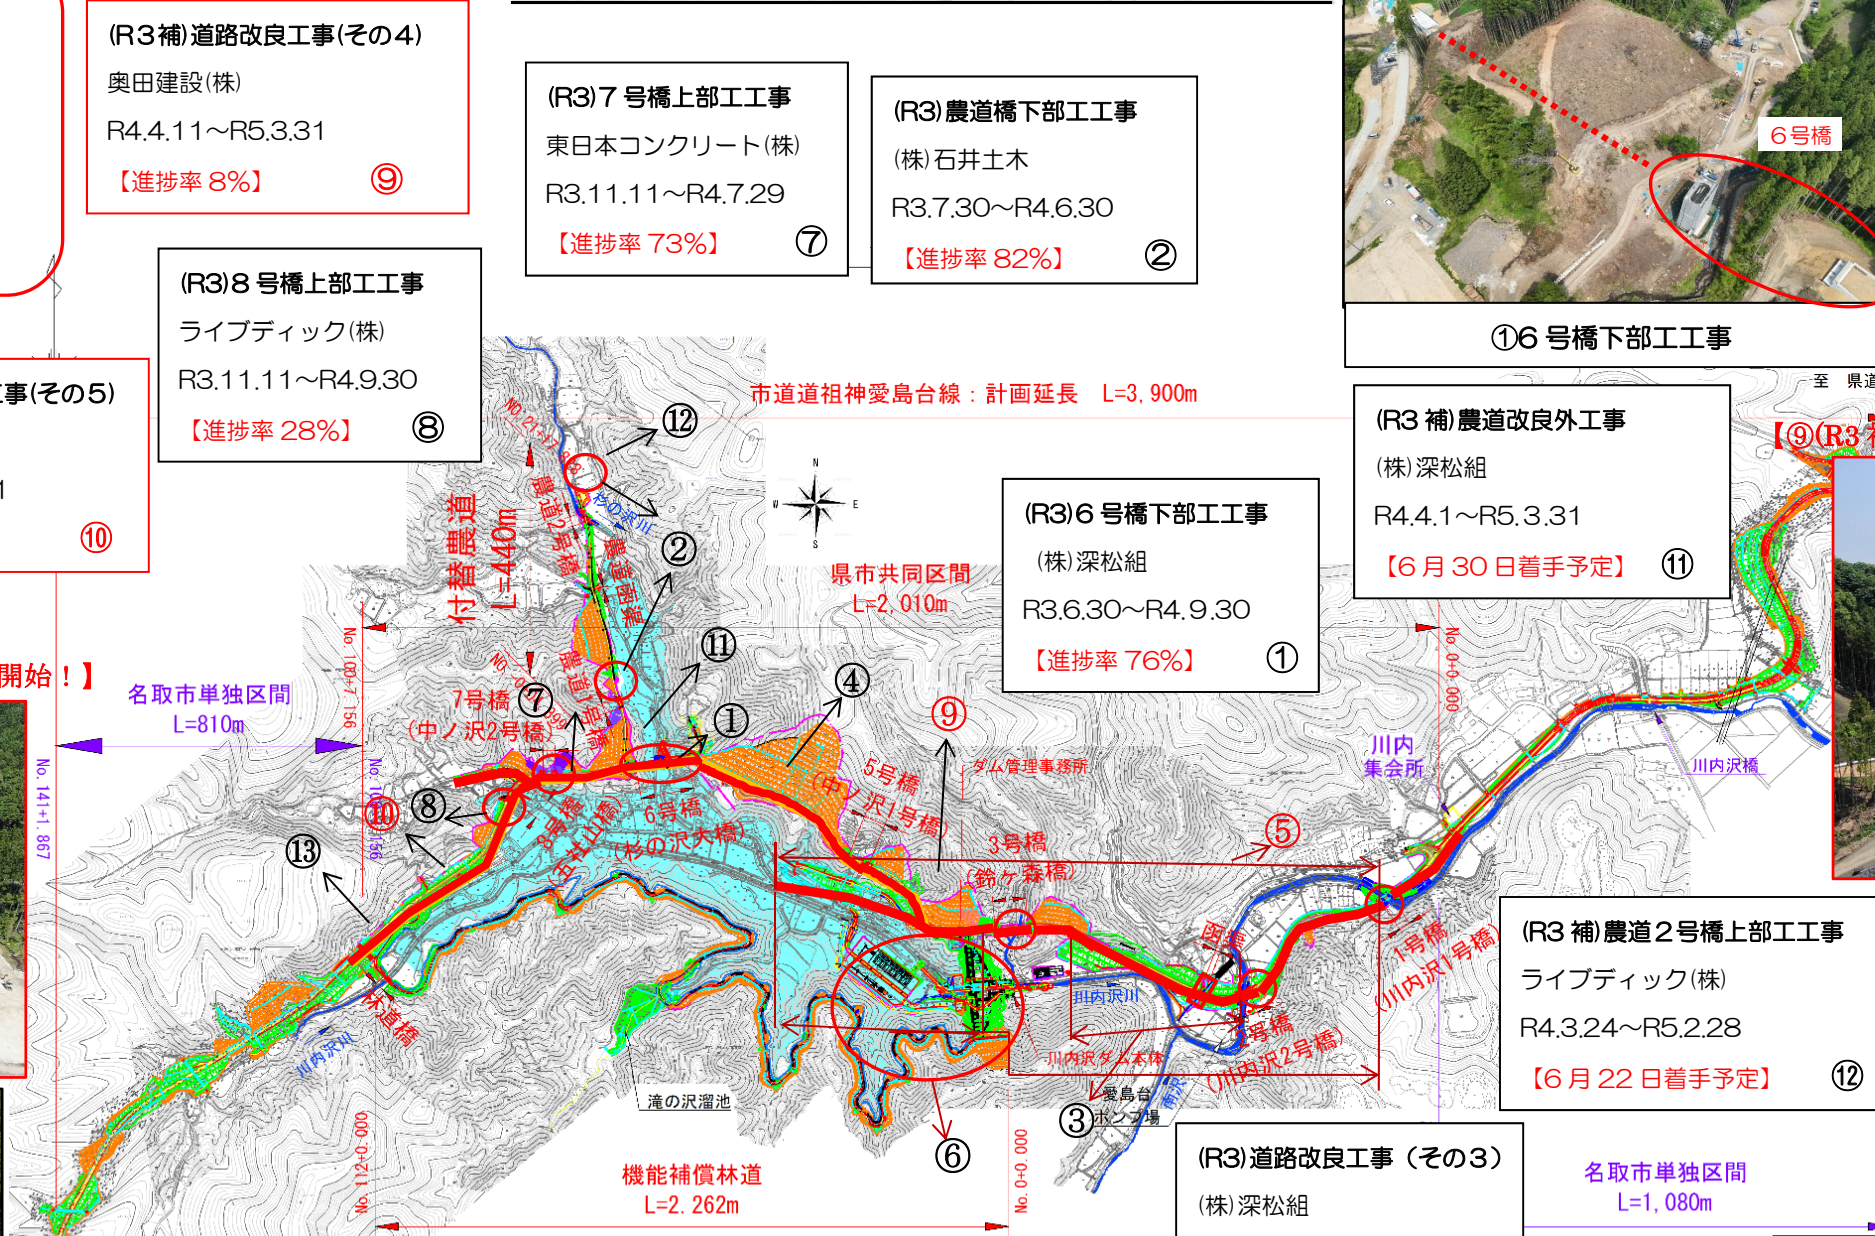

(R3補)道路改良工事(その4)
奥田建設(株)
R4.4.11~R5.3.31
【進捗率 8%】 ⑨

(R3)7号橋上部工工事
東日本コンクリート(株)
R3.11.11~R4.7.29
【進捗率 73%】 ⑦

(R3)農道橋下部工工事
(株)石井土木
R3.7.30~R4.6.30
【進捗率 82%】 ②

(R3)8号橋上部工工事
ライブディック(株)
R3.11.11~R4.9.30
【進捗率 28%】 ⑧

(R3補)道路改良工事(その5)
(有)渋谷組
R4.4.1~R5.3.31
【進捗率 7%】 ⑩

(R3)6号橋下部工工事
(株)深松組
R3.6.30~R4.9.30
【進捗率 76%】 ①

(R3 補)農道改良外工事
(株)深松組
R4.4.1~R5.3.31
【6月30日着手予定】 ⑪

(R3 補)農道2号橋上部工工事
ライブディック(株)
R4.3.24~R5.2.28
【6月22日着手予定】 ⑫

(R3 補)林道改良外工事
グリーン企画建設(株)
R4.4.1~R5.3.31
【進捗率 4%】 ⑬

(R3)ダム仮設工外工事
奥田建設(株)
R3.11.5~R5.2.28
【進捗率 18%】 ⑥

(R3)道路改良工事(その3)
(株)深松組
R3.10.5~R5.3.24
【進捗率 29%】 ④

(R3)舗装工事
(株)佐藤渡辺東北支店
R3.10.12~R5.1.31
【進捗率 12%】 ⑤



①6号橋下部工工事



【⑨(R3 補)道路改良工事(その4)工事の掘削開始!】

掘削中

現在: 13工区8業者施工中!

- 付替市道 L=2,010m
- 【施工中】 道路改良工事
- 橋梁工事
- 函渠工工事
