

北部土木事務所だより

令和7年度 第1号 令和7年12月12日 発行

宮城県北部土木事務所の令和7年度における取組状況をお知らせします。

1 令和6年7月の大雨による被災箇所の復旧状況について

令和6年7月の大雨により被災した当事務所が管理する施設（道路4箇所、河川1箇所）の復旧について、道路4箇所の工事が完了しました。

・(国)108号(6災第2102号) 大崎市鳴子温泉鬼首字石湊地内

着工前（R6年9月）



完成（R7年7月）



・(一)沼倉鳴子線(6災第2104号) 大崎市鳴子温泉鬼首地内

着工前（R6年9月）



完成（R7年9月）



2 令和7年災害の被災箇所の復旧状況について

令和7年3月の融雪により被災した(国)108号大崎市鳴子温泉鬼首字軍沢岳地内の復旧については、現在、本復旧工事を進めております。

・(国)108号(7災第2001号) 大崎市鳴子温泉鬼首字軍沢岳地内

着工前 (R7年4月)



工事中 (R7年11月)



令和7年6月の大雨により被災した施設（河川7箇所）の復旧については、現在、全ての箇所で復旧工事に着手しております。

・吉野川(7災第2004号) 大崎市岩出山字上真山八幡地内

被災時 (R7年6月)



・田尻川(7災第2005号) 大崎市古川雨生沢地内

被災時 (R7年6月)





3 渋井川水門・排水機場整備事業の進捗状況について

○事業概要

鳴瀬川水系渋井川は、鳴瀬川本川の背水の影響を受けやすく、平成27年関東・東北豪雨や令和元年東日本台風では、渋井川堤防が決壊するなど、甚大な被害が発生しています。

再度災害防止を図るため、被災箇所の災害復旧を進めるとともに、渋井川と多田川の合流部においては、背水による逆流（バックウォーター現象）を防止するため、令和元年度から水門整備に着手し、令和4年度からは排水機場の整備を進めているところです。

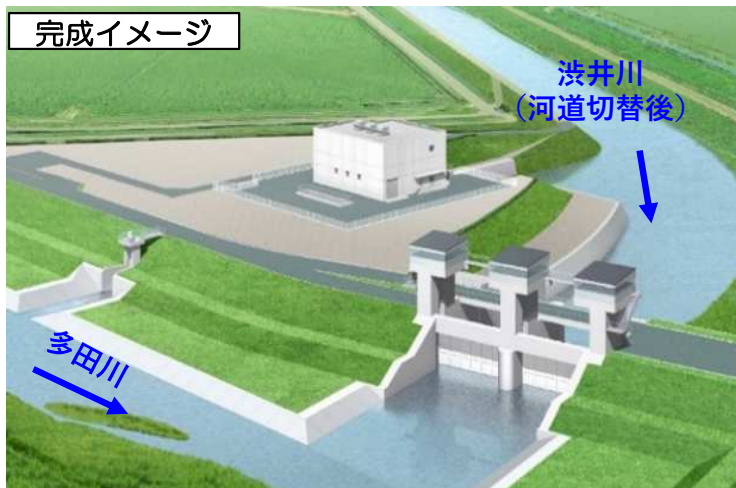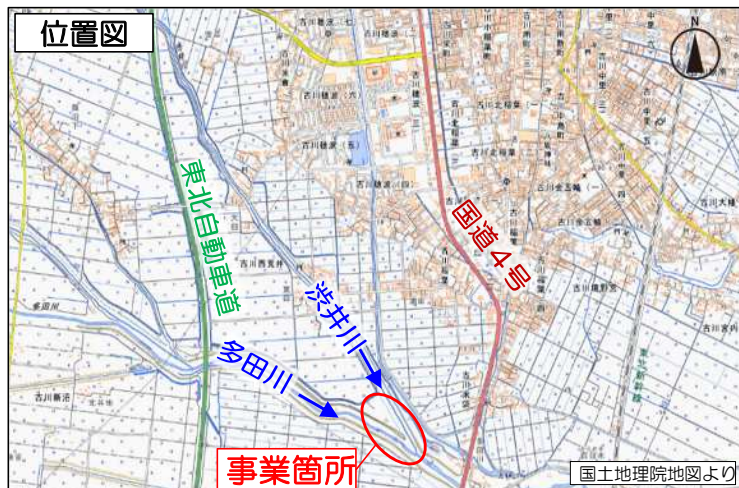

<水門>

事業概要: 水門本体(W=43.0m,H=20.5m)

プレートガーダ構造ローゲート N=2門

事業費: 28億円

事業期間: 令和元年度～令和7年度

<排水機場>

事業概要: ポンプ形式 立軸斜流ポンプ (2.0m³/s×3台)

樋門形式 柔構造樋門(1.7m×1.7m)

事業費: 40億円

事業期間: 令和4年度～令和7年度(令和8年度に変更)

工事の進捗状況について

<水門>

令和6年度までに水門本体が完成し、その後進めてきた河道の切替が完了したことから、9月より水門の供用を開始しています。

工事着手前 (令和2年8月)



杭基礎工事 (令和4年6月)



本体工事 (令和5年7月)



設備工事 (令和6年4月)



護岸工事 (令和7年6月)



水門供用 (現在) (令和7年11月)




4 名蓋川河川災害復旧助成事業の進捗状況について


・名蓋川河川災害復旧助成事業（大崎市古川矢目地内～加美郡加美町下狼塚田中地内）

一級河川鳴瀬川水系名蓋川については、被災した箇所を元に戻す原形復旧のみならず、再度災害防止を図るため、被災していない箇所も含めて改良復旧を行う「災害復旧助成事業」を活用し、多田川合流点から国道347号までの4.1キロメートル区間を、令和4年7月の大雨と同程度の洪水に対応できるよう、河道拡幅や堤防嵩上げを行うこととしております。

<位置図>

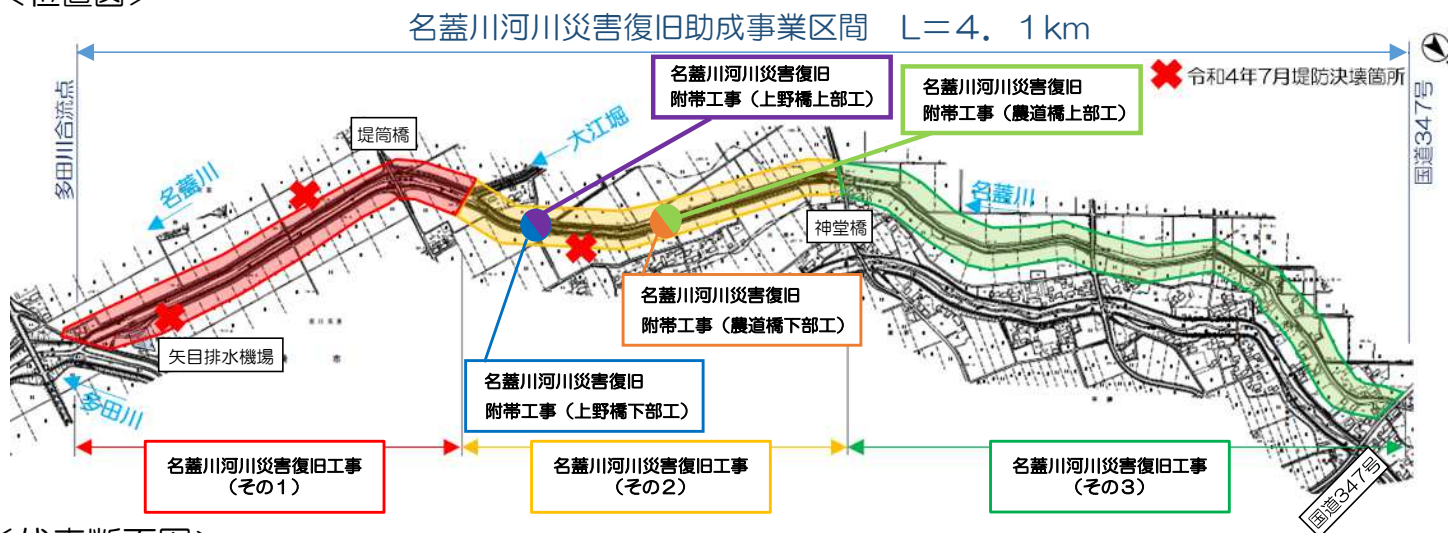

<代表断面図>

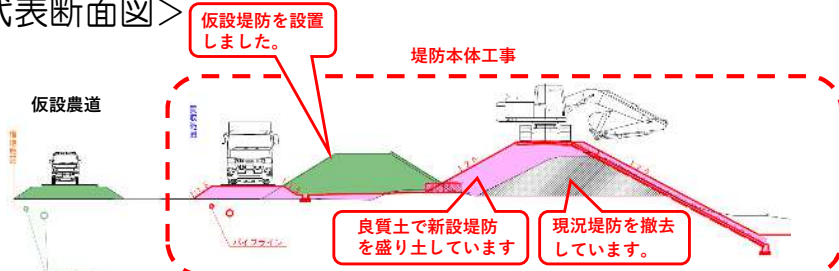

令和6年5月より堤防本体工事に着手し、現在、良質土による新設堤防の盛土工事及び上野橋及び農道橋の工事を行っております。今後、農業施設の整備工事を発注する予定です。

名蓋川河川災害復旧工事（その1）

R7年11月現在

名蓋川河川災害復旧工事（その3）



名蓋川河川災害復旧工事（その2）

R7年11月現在

名蓋川河川災害復旧附帯工事（上野橋下部工）



5 令和7年度の主な事業箇所の進捗状況について（1／5）

・(都)稲葉小泉線 竹ノ内街路整備事業 大崎市古川竹ノ内地内

着工前（R6年3月）



工事中（R7年11月）



・(国)457号 矢木道路改良事業 大崎市岩出山池月地内

着工前（R6年3月）



工事中（R7年11月）



・(主)鹿島台高清水線 牛飼道路改良事業 大崎市美里町牛飼地内

着工前（R6年4月）



工事中（R7年11月）



5 令和7年度の主な事業箇所の進捗状況について (2/5)

・(主)石巻鹿島台色麻線 小島交通安全施設整備事業 遠田郡美里町小島地内

着工前 (R6年6月)



完成 (R7年11月)



・(主)鹿島台高清水線 平渡交通安全施設整備事業 大崎市鹿島台平渡地内

着工前 (R5年11月)



完成 (R7年5月)



・(国)347号 災害防除(鍋越) 加美郡加美町字漆沢森下地内

着工前 (R7年4月)



完成 (R7年10月) 雪崩防護柵設置



5 令和7年度の主な事業箇所の進捗状況について (3/5)

・(一)沼倉鳴子線 災害防除(鬼首(その1)工区) 大崎市鳴子温泉鬼首字高剥地内

着工前 (R7年4月)



完成 (R7年9月) 落石防護柵設置



・(一)涌谷三本木線 橋梁補修(上出来川側道橋) 遠田郡涌谷町渋江地内

着工前 (R6年10月)



完成 (R7年7月) 塗装塗替



・(国)347号 道路情報板付替(門沢地区) 加美郡加美町字門沢宿地内

着工前 (R7年2月)



完成 (R7年10月)



5 令和7年度の主な事業箇所の進捗状況について (4/5)

・(一)鳴子池月線 舗装補修 大崎市鳴子温泉字沢目木地内

着工前 (R7年3月)



完成 (R7年9月)



・田川 ツキノワグマ総合緊急対策(ヤブ刈払い) 加美郡加美町米泉地内

着工前 (R7年11月)



完成 (R7年11月)



・大江川 護岸修繕工事 大崎市古川北稲葉地内

着工前 (R6年10月)



完成 (R7年6月)



5 令和7年度の主な事業箇所の進捗状況について (5/5)

・江合川 支障木伐採業務委託 大崎市岩出山下野目地内

着工前 (R7年3月)



完成 (R7年9月)



・蛭沢川 河道掘削工事 大崎市岩出山下野目字川原地内

着工前 (R7年3月)



完成 (R7年8月)



本掲載内容等について、お気づきの点やご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ願います。



明日につなぐ×ミヤギの未来
宮城県土木部

宮城県北部土木事務所 企画担当チーム

〒989-6117 大崎市古川旭四丁目1-1

電話: 0229-91-0735 FAX: 0229-22-5260

<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-dbk/>
