

荒川改修・県道改良 事業通信

①護岸工事

②橋梁工事

現在、左岸（伊豆沼側）の橋台等を施工中です。完成次第、右岸（県道側）の橋台等を施工していきます。

③仮堤防の撤去工事

②橋梁工事における左岸（伊豆沼側）の橋台等の工事
 事完成後に、仮堤防の撤去を施工していきます。

※裏面に空撮写真を掲載しています。



nh-khdbkd@pref.miyagi.lg.jp (道路建設班)

[illegible]

東北新幹線

護岸完成済み

①護岸工事


②橋梁工事

③仮堤防の撤去工事


4

「地理院タイルに施工箇所を追記して記載」

現在の状況写真（令和7年9月6日 撮影）

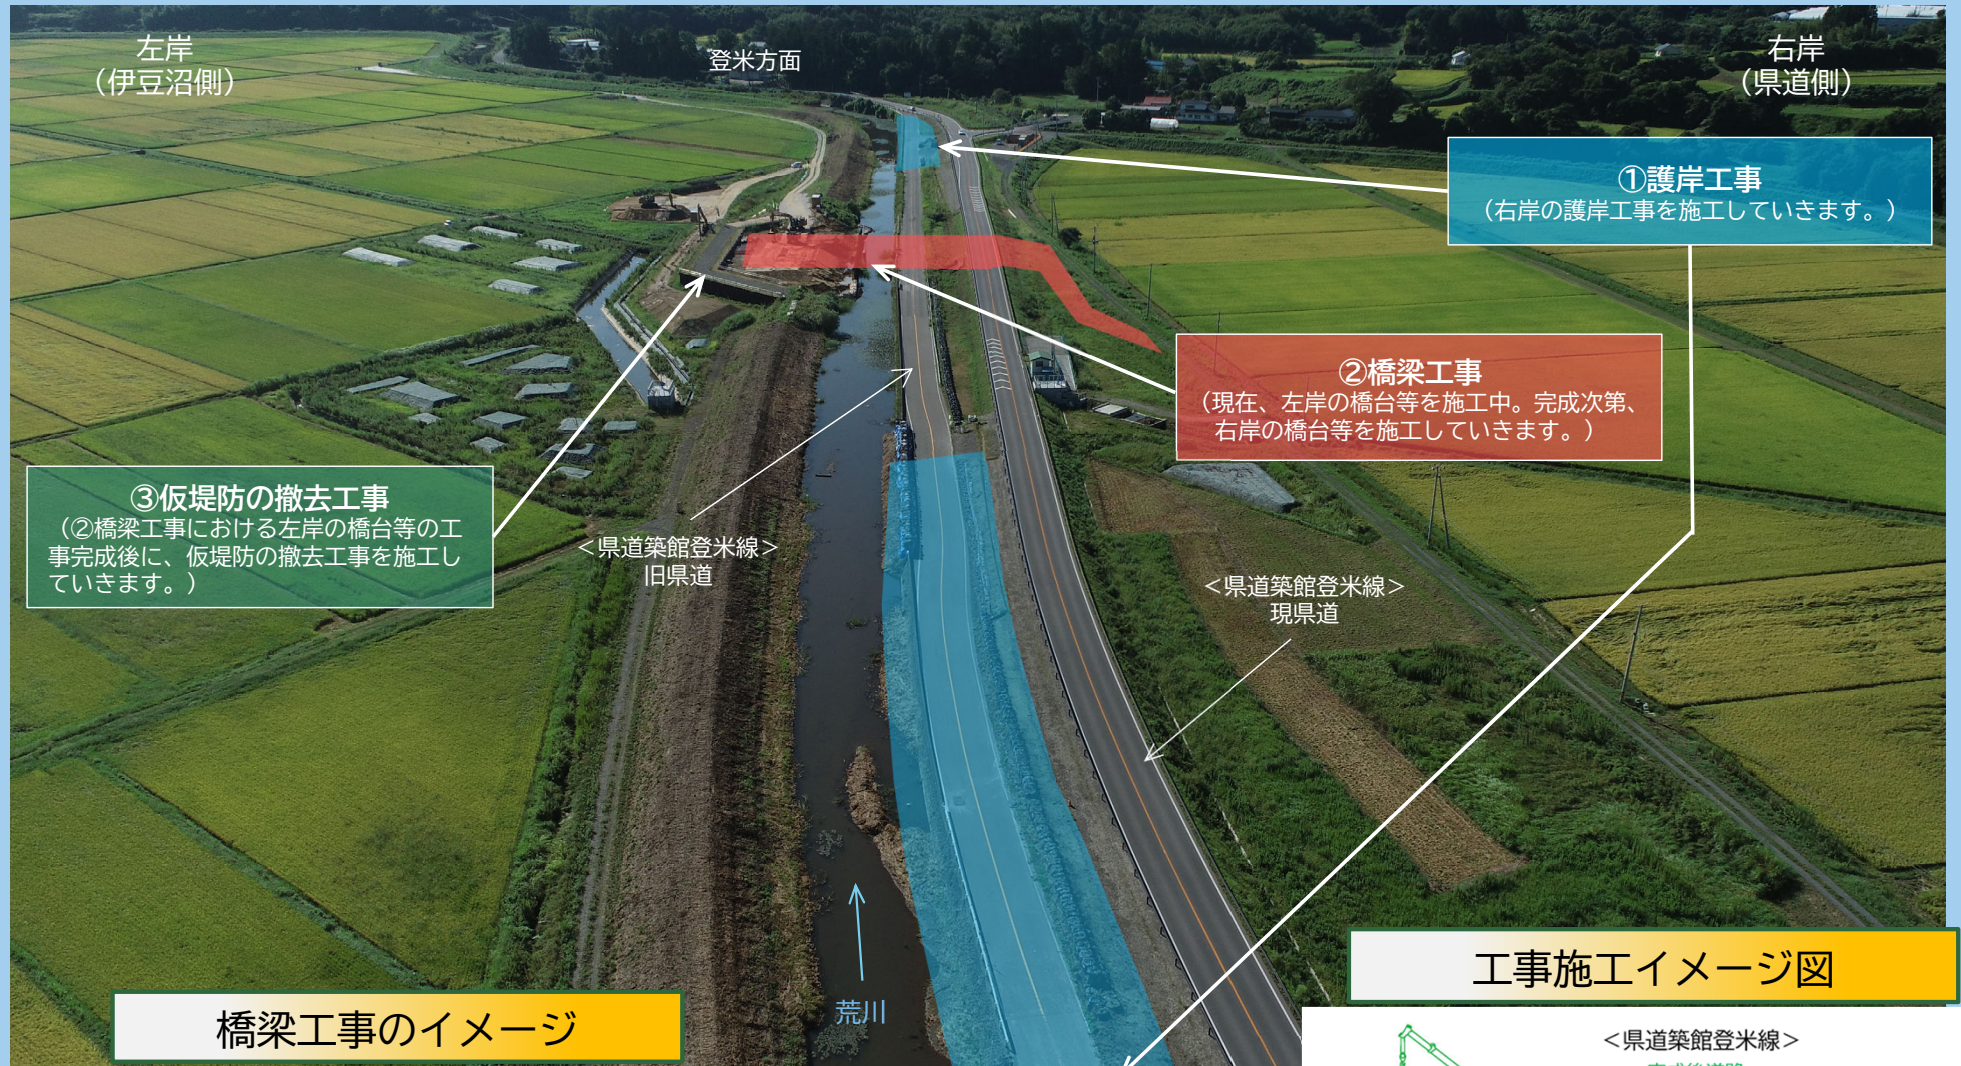

※「橋台（左岸）→ 橋台（右岸）→ 上部工」の順番で施工する予定です。



工事施工イメージ図

