

# 大河原土木事務所


## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

【令和3年9月末現在】

※朱書は前月との比較

**公共土木施設** 着手率 100% 完成率 50% (+3pt)

(道路,河川,砂防, 受託)



復旧・復興事業の概要  
期間 R1~R4年度  
工事費 約151億円

事業箇所数: 320箇所

項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)
<b>道路 災害復旧工事</b>  期間 R1~R3 工事費 約40億円  <small>※ 丸森霊山線・丸森梁川線の 一部は関連工事との調整により R4完成見込</small>	50% 100% 着手率 93箇所 完成率 56箇所 (+1箇所)  着手率 100% 完成率 60% (+1pt) 事業箇所数: 93箇所	<b>災害関連 緊急砂防工事</b>  期間 R1~R4 工事費 約52億円	50% 100% 着手率 15箇所 完成率 0%  着手率 100% 完成率 0% 事業箇所数: 15箇所	<b>受託工事 (町道古田峠線)</b>  期間 R1~R3 工事費 約2億円	50% 100% 着手率 7箇所 完成率 2箇所  着手率 100% 完成率 29% 事業箇所数: 7箇所
<b>河川 災害復旧工事</b>  期間 R1~R3 工事費 約50億円	50% 100% 着手率 193箇所 完成率 103箇所 (+10箇所)  着手率 100% 完成率 53% (+5pt) 事業箇所数: 193箇所	<b>災害関連工事 (丸森梁川線)</b>  期間 R1~R4 工事費 約4億円	50% 100% 着手率 1箇所 完成率 0%  着手率 100% 完成率 0% 事業箇所数: 1箇所	<b>土砂災害 対策道路事業 (丸森霊山線)</b>  期間 R3~R4 工事費 約3億円	50% 100% 着手率 11箇所 完成率 0%  着手率 100% 完成率 0% 事業箇所数: 11箇所

# 大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

## 災害復旧事業

市町名	道路災害復旧工事		河川災害復旧工事	
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）
白石市	18 【3億円】	18 100% 17 94%	43 【13億円】	43 100% 9 21%
角田市	15 【3億円】	15 100% 6 40%	38 【11億円】	38 100% 23 61%
蔵王町	1 【0.2億円】	1 100% 0 0%	19 【4億円】	19 100% 12 63%
七ヶ宿町	0		18 【2億円】	18 100% 13 72%
村田町	4 【0.3億円】	4 100% 1 25%	17 【3億円】	17 100% 9 53%
川崎町	7 【2億円】	7 100% 4 57%	25 【5億円】	25 100% 17 68%
丸森町	48 【31億円】	48 100% 28 58%	33 【12億円】	33 100% 20 61%
<b>合計</b>	<b>93</b> 【40億円】	<b>93 100%</b> <b>56 60%</b>	<b>193</b> 【50億円】	<b>193 100%</b> <b>103 53%</b>

## 関連事業


市町名	災害関連緊急砂防工事	
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）
丸森町	15 【52億円】	15 100% 0 0%
<b>災害関連工事（丸森梁川線）</b>		
丸森町	1 【4億円】	1 100% 0 0%
<b>受託工事（町道 古田峠線）</b>		
丸森町	7 【2億円】	7 100% 2 29%
<b>土砂災害対策道路事業（丸森霊山線）</b>		
丸森町	11 【3億円】	11 100% 0 0%
<b>合計</b>	<b>34</b> 【61億円】	<b>34 100%</b> <b>2 6%</b>

※ 大河原町及び柴田町については、道路及び河川災害復旧工事が無いため、一覧表から除いている。

# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

### 丸森町 (一)越河角田線 640号

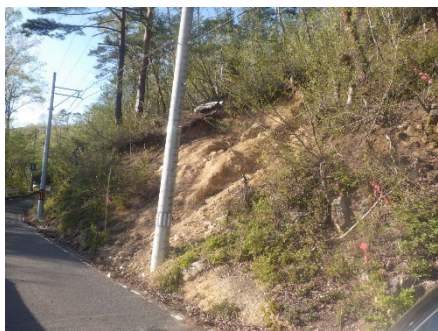

### 丸森町 雉子尾川 116号



### 角田市 尾袋川 72号



### 角田市 高倉川 83号



着手前

施工中

完成

# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

村田町 荒川 131号




七ヶ宿町 白石川 34号



七ヶ宿町 白石川 42号



川崎町 前川 8号

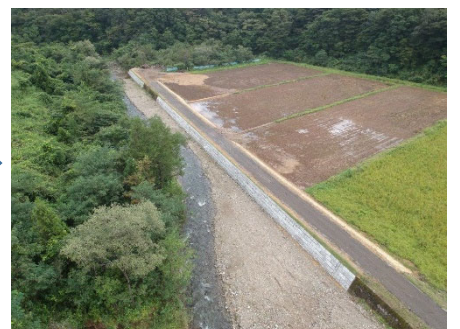

着手前

施工中

完成


# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

川崎町 前川 11号



川崎町 前川 16号

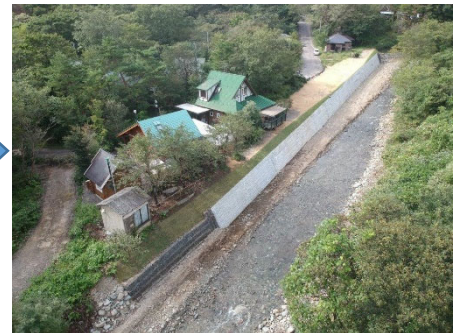

川崎町 碁石川 65号



着手前

施工中

完成
