


# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

【令和3年12月末現在】

※朱書は前月との比較

**公共土木施設** 着手率 100% 完成率 68% (+5pt)  
 (道路,河川,砂防,受託)



復旧・復興事業の概要  
 期間 R1～R4年度  
 工事費 約151億円

事業箇所数:  
 320箇所

項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)
<b>道路 災害復旧工事</b>  期間 R1～R3 工事費 約40億円  <small>※ 丸森霊山線・丸森梁川線の 一部は関連工事との調整により R4完成見込</small>	50% 100% 着手率 93箇所 完成率 69箇所 (+3箇所)  着手率 100% 完成率 74% (+3pt) 事業箇所数: 93箇所	<b>災害関連 緊急砂防工事</b>  期間 R1～R4 工事費 約52億円	50% 100% 着手率 15箇所 完成率  着手率 100% 完成率 0% 事業箇所数: 15箇所	<b>受託工事 (町道古田峠線)</b>  期間 R1～R3 工事費 約2億円	50% 100% 着手率 7箇所 完成率 3箇所 (+1箇所)  着手率 100% 完成率 43% (+14pt) 事業箇所数: 7箇所
<b>河川 災害復旧工事</b>  期間 R1～R3 工事費 約50億円	50% 100% 着手率 193箇所 完成率 144箇所 (+10箇所)  着手率 100% 完成率 75% (+6pt) 事業箇所数: 193箇所	<b>災害関連工事 (丸森梁川線)</b>  期間 R1～R4 工事費 約4億円	50% 100% 着手率 1箇所 完成率  着手率 100% 完成率 0% 事業箇所数: 1箇所	<b>土砂災害 対策道路事業 (丸森霊山線)</b>  期間 R3～R4 工事費 約3億円	50% 100% 着手率 11箇所 完成率  着手率 100% 完成率 0% 事業箇所数: 11箇所

# 大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

## 災害復旧事業

市町名	道路災害復旧工事		河川災害復旧工事	
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）
白石市	18 【3億円】	18 100% 18 100%	43 【13億円】	43 100% 20 47%
角田市	15 【3億円】	15 100% 8 53%	38 【11億円】	38 100% 29 76%
蔵王町	1 【0.2億円】	1 100% 1 100%	19 【4億円】	19 100% 16 84%
七ヶ宿町	0		18 【2億円】	18 100% 17 94%
村田町	4 【0.3億円】	4 100% 4 100%	17 【3億円】	17 100% 13 76%
川崎町	7 【2億円】	7 100% 7 100%	25 【5億円】	25 100% 21 84%
丸森町	48 【31億円】	48 100% 31 65%	33 【12億円】	33 100% 28 85%
<b>合計</b>	<b>93</b> 【40億円】	<b>93 100%</b> <b>69 74%</b>	<b>193</b> 【50億円】	<b>193 100%</b> <b>144 75%</b>

## 関連事業

市町名	災害関連緊急砂防工事	
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）
丸森町	15 【52億円】	15 100% 0 0%
	<b>災害関連工事（丸森梁川線）</b>	
丸森町	1 【4億円】	1 100% 0 0%
	<b>受託工事（町道 古田峠線）</b>	
丸森町	7 【2億円】	7 100% 3 43%
	<b>土砂災害対策道路事業（丸森霊山線）</b>	
丸森町	11 【3億円】	11 100% 0 0%
<b>合計</b>	<b>34</b> 【61億円】	<b>34 100%</b> <b>3 9%</b>

※ 大河原町及び柴田町については、道路及び河川災害復旧工事が無いため、一覧表から除いている。

# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

川崎町 前川 2号




七ヶ宿町 白石川 44号



七ヶ宿町 白石川 46号



蔵王町 藪川 49号

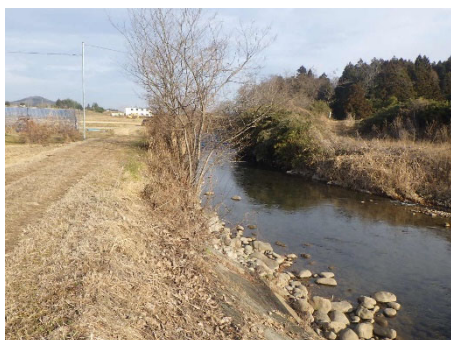

着手前

施工中

完成

# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

蔵王町 藪川 55号



角田市 尾袋川 75号



丸森町 小田川 159号



白石市 高田川 202号



着手前


施工中

完成

# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

白石市 高田川 208号

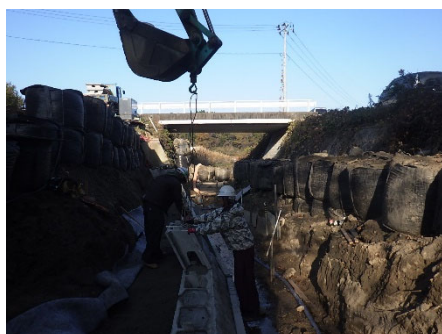

村田町 (主) 亘理大河原川崎線 542号



角田市 (一) 越河角田線 648号



角田市 (一) 越河角田線 649号



着手前

施工中

完成

# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

丸森町 町道古田峠線 18339号



着手前



施工中



完成
