

閑上漁港施設の災害復旧状況と防潮堤整備に関する説明会

日時：平成27年12月17日(木)

18時30分から

場所：名取市役所6階東側会議室

次 第

1 開 会

2 挨 拶

3 出席者紹介


4 説 明

(1) 閑上漁港災害復旧状況について

(2) 閑上漁港防潮堤整備計画について

5 質 疑 応 答

6 閉 会



震災復旧・復興の『いま』 そして『これから』について

1. 閑上漁港災害復旧状況について
2. 閑上漁港防潮堤整備計画について

宮城県仙台地方振興事務所 水産漁港部

1

閑上漁港災害復旧事業

1. 閑上漁港災害
復旧状況について

2


1. 【関上漁港】 災害復旧進捗率

管内漁港の着手状況について (H27.11現在)

漁港名	着手率		完了率
	漁港+海岸 (百万円)	うち漁港施設 (百万円)	漁港+海岸 (百万円)
塩釜漁港	51% (3,735 / 7,321)	51% (3,735 / 7,321)	25% (1,809 / 7,321)
桂島漁港	98% (894 / 908)	98% (894 / 908)	41% (370 / 908)
磯崎漁港	49% (831 / 1,693)	78% (831 / 1,067)	22% (372 / 1,693)
関上漁港	83% (2,894 / 3,472)	83% (2,894 / 3,472)	26% (887 / 3,472)
荒浜漁港	68% (4,361 / 6,423)	83% (4,361 / 5,272)	54% (3,450 / 6,423)
5漁港計	64% (12,715 / 19,817)	70% (12,715 / 18,040)	35% (6,888 / 19,817)

※災害復旧のみの着手率となっております。

2. 全体平面図

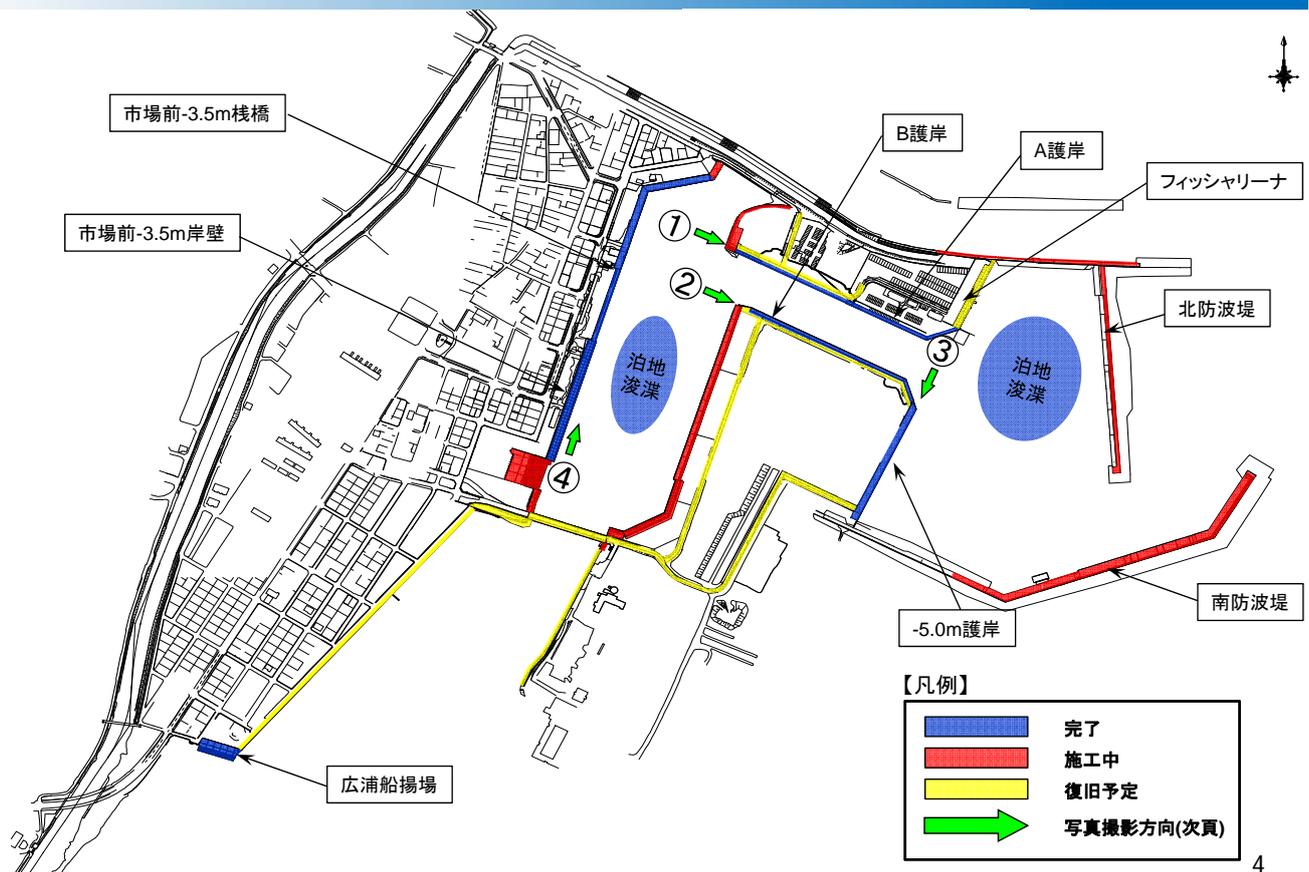

3. 復旧状況



4. 復旧状況 その2



閑上漁港海岸整備事業

2. 閑上漁港防潮堤 整備計画について

9

1. 防潮堤整備計画案（防潮堤高さ等）




■ 計画法線は変更となる場合があります。

10

2. TP+7.2m 施工状況写真・平面図


【工事概要】

1. 工事名： 関上漁港防潮堤工事
2. 工事場所： 宮城県名取市関上地先
3. 工期： 自 平成27年3月19日
至 平成28年3月28日
4. 施工内容： 施工延長L=594m
5. 進捗率： 52% (11月末時点)

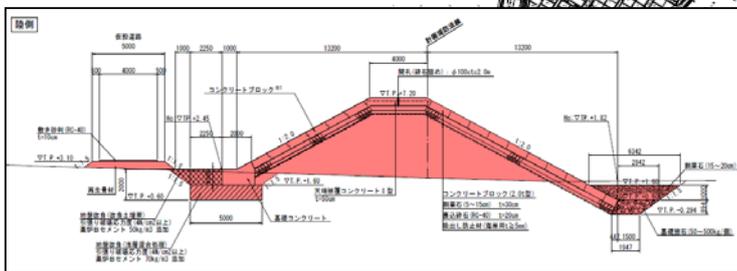

11

3. TP+7.2m防潮堤 状況写真

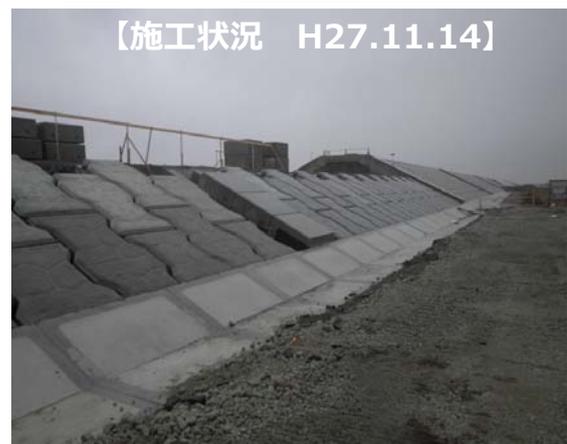

12


4. TP+3.7m防潮堤計画 平面図



13

5. 朝市前区間防潮堤 標準断面図(1)

朝市前区間

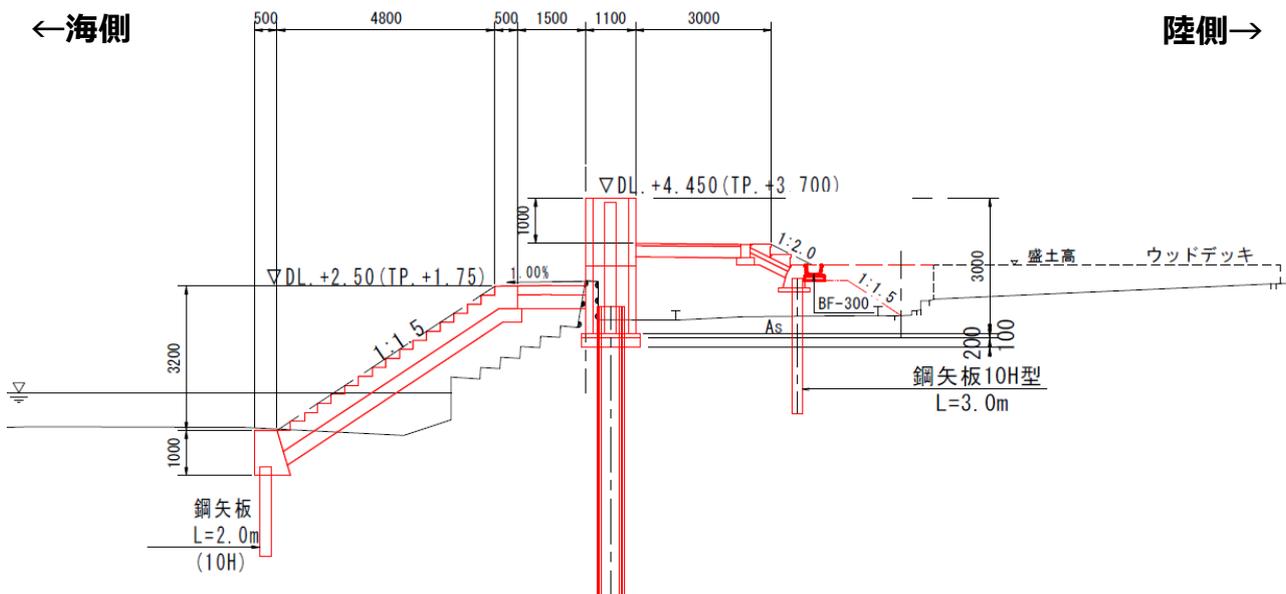


※計画断面は確定断面ではありません。

14

6. 市場区間防潮堤 標準断面図(2)

市場区間

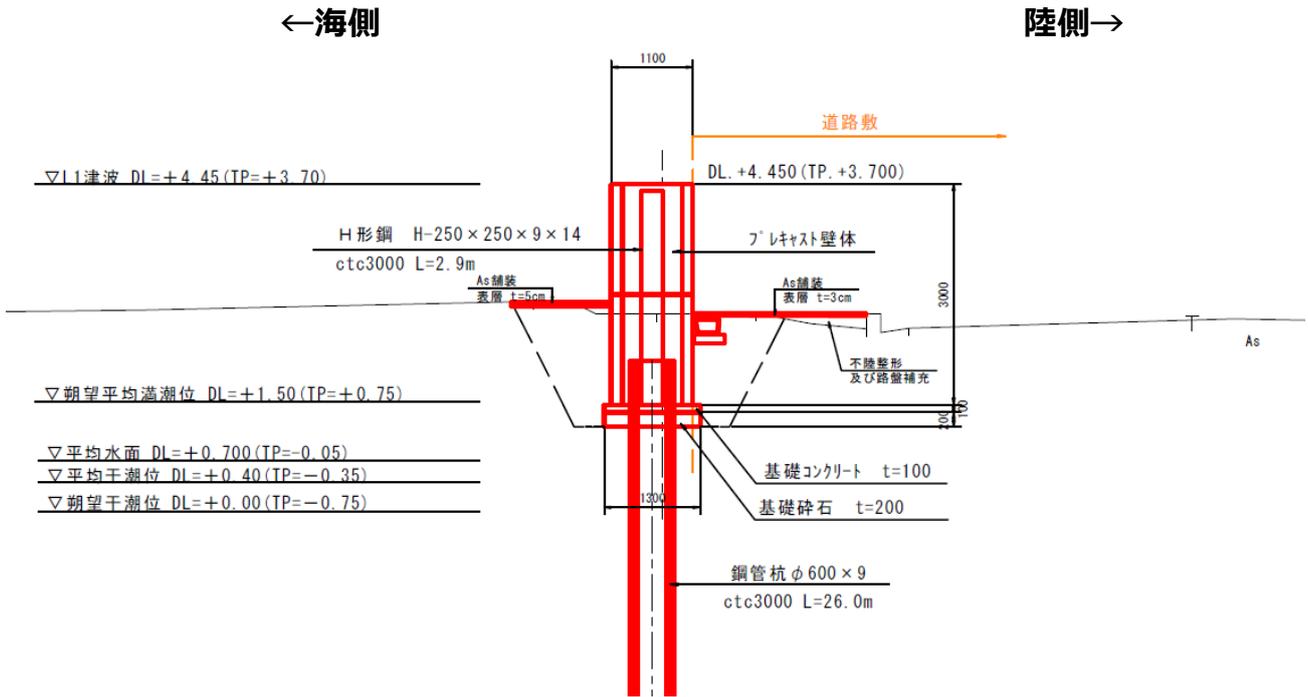

※計画断面は確定断面ではありません。

7. 防潮堤整備スケジュール

トピック	工程	平成27年度				平成28年度				平成29年度			
		第1四半期 4月-6月	第2四半期 7月-9月	第3四半期 10月-12月	第4四半期 1月-3月	第1四半期 4月-6月	第2四半期 7月-9月	第3四半期 10月-12月	第4四半期 1月-3月	第1四半期 4月-6月	第2四半期 7月-9月	第3四半期 10月-12月	第4四半期 1月-3月
TP+7.2m 防潮堤	【工事】 関上海岸												
TP+4.8m 防潮堤	詳細設計												
	工事												
TP+3.7m 防潮堤	詳細設計												
	【工事】 広浦橋～朝市側												
	【工事】 広浦橋～ 名取川右岸堤防												

8. 朝市前区間イメージ図



17

9. 朝市前以外計画イメージ図




18

10. 関上地区 再生目標イメージ図



19

ご清聴ありがとうございました。



20
