

検討方針(案)

【平成28年度 第1回 石巻南浜津波復興祈念公園有識者委員会 資料】

平成28年9月7日

目次

1. 検討体制(案)	1
2. 検討スケジュール(案)	5
3. 主な検討項目(案)	6
4. 整備スケジュール(案)	7
5. 周辺事業の進捗状況	8
・新門脇地区土地区画整理事業等	9
・防災マリーナ	10
・河川堤防・旧北上川かわまちづくり	11

石巻南浜津波復興祈念公園有識者委員会

■石巻南浜津波復興祈念公園(以下、公園)の計画・設計の検討
(空間デザイン検討委員会における検討状況の報告・オーソライズ)

【開催】:年2回程度

【事務局】:◎宮城県、国土交通省、石巻市

委員会の議事・内容を宮城県のHPに公開

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tosikei/hukkoukinenkouen.html>

石巻南浜津波復興祈念公園 空間デザイン検討委員会

■公園における空間デザイン(実施設計)の検討(国営施設、県整備区域等)

【開催】:年3回程度

【事務局】:◎国土交通省東北国営公園事務所、宮城県、石巻市

参加型 維持管理運営検討協議会

※昨年度の計画検討協議会を発展的に継続

■市民や各種団体、NPO等の参画による維持管理運営方法の検討を予定
※伝承委員会との連携を予定

【事務局】:◎石巻市、国土交通省、宮城県

1. 検討体制(案) 2/4 【有識者委員会】

石巻南浜津波復興祈念公園 有識者委員会

目的:石巻南浜津波復興祈念公園の計画・設計の検討を行う

(空間デザイン検討委員会における検討状況の報告・オーソライズ)

委員名簿

(敬称略)

	氏名	役職
委員長	涌井 史郎	東京都市大学環境学部 教授
副委員長	森山 雅幸	宮城大学 特任教授
委員	牛尾 陽子	公益財団法人東北活性化研究センターフェロー
//	岸井 隆幸	日本大学理工学部教授
//	中 静 透	東北大学大学院生命科学研究科教授
//	舟引 敏明	宮城大学事業構想学部教授
//	亀山 紘	石巻市長
//	遠藤 信哉	宮城県土木部長

1. 検討体制(案) 3/4 【空間デザイン検討委員会】

石巻南浜津波復興祈念公園 空間デザイン検討委員会

目的:石巻南浜津波復興祈念公園における**空間デザイン(実施設計)**の検討を行う

委員名簿

(敬称略)

	氏名	役職
委員長	佐々木 葉	早稲田大学 創造理工学部 社会環境工学科 教授
委員	阿部 聡史	環境デザイナー
〃	小野田 泰明	東北大学大学院 工学研究科 教授
〃	濱野 周泰	東京農業大学 造園科学科 教授
〃	渡部 桂	東北芸術工科大学 建築・環境デザイン学科 准教授
顧問	涌井 史郎	東京都市大学環境学部 教授
〃	森山 雅幸	宮城大学 特任教授
〃	舟引 敏明	宮城大学事業構想学部 教授

1. 検討体制(案) 4/4 【参加型維持管理運営検討協議会】

石巻南浜津波復興祈念公園 参加型維持管理運営検討協議会

目的:市民等の参加による、**新たな維持管理運営手法**および**維持管理運営課題**を検討する。

(参加者は募集要領に基づき登録された団体の代表をもって組織する)

(※ 昨年度の計画検討協議会に代わり新たに立ち上げるものである)

協議内容(案)


開催回・時期	協議内容(案)
第1回 平成28年10月開催 予定	<ul style="list-style-type: none">○石巻南浜津波復興祈念公園基本設計の説明○検討協議会における協議範囲について検討(杜づくりや伝承等)○公園の利活用のあり方について検討 (どのような活動をどのような手法で実施したいのか?)
第2回以降 ※適宜開催予定	<ul style="list-style-type: none">○空間デザイン検討委員会の結果報告○具体的な参加型管理運営の手法および課題についての検討○アクションプログラムの検討○参加型管理運営のプロセスについて検討(2020年開園までの準備と開園以降)○活動内容と役割分担について検討○活動スケジュールの検討○次年度以降の協議会のあり方について検討

2. 検討スケジュール(案)

有識者委員会【県】

空間デザイン検討委員会【国】

参加型維持管理
運営検討協議会【市】

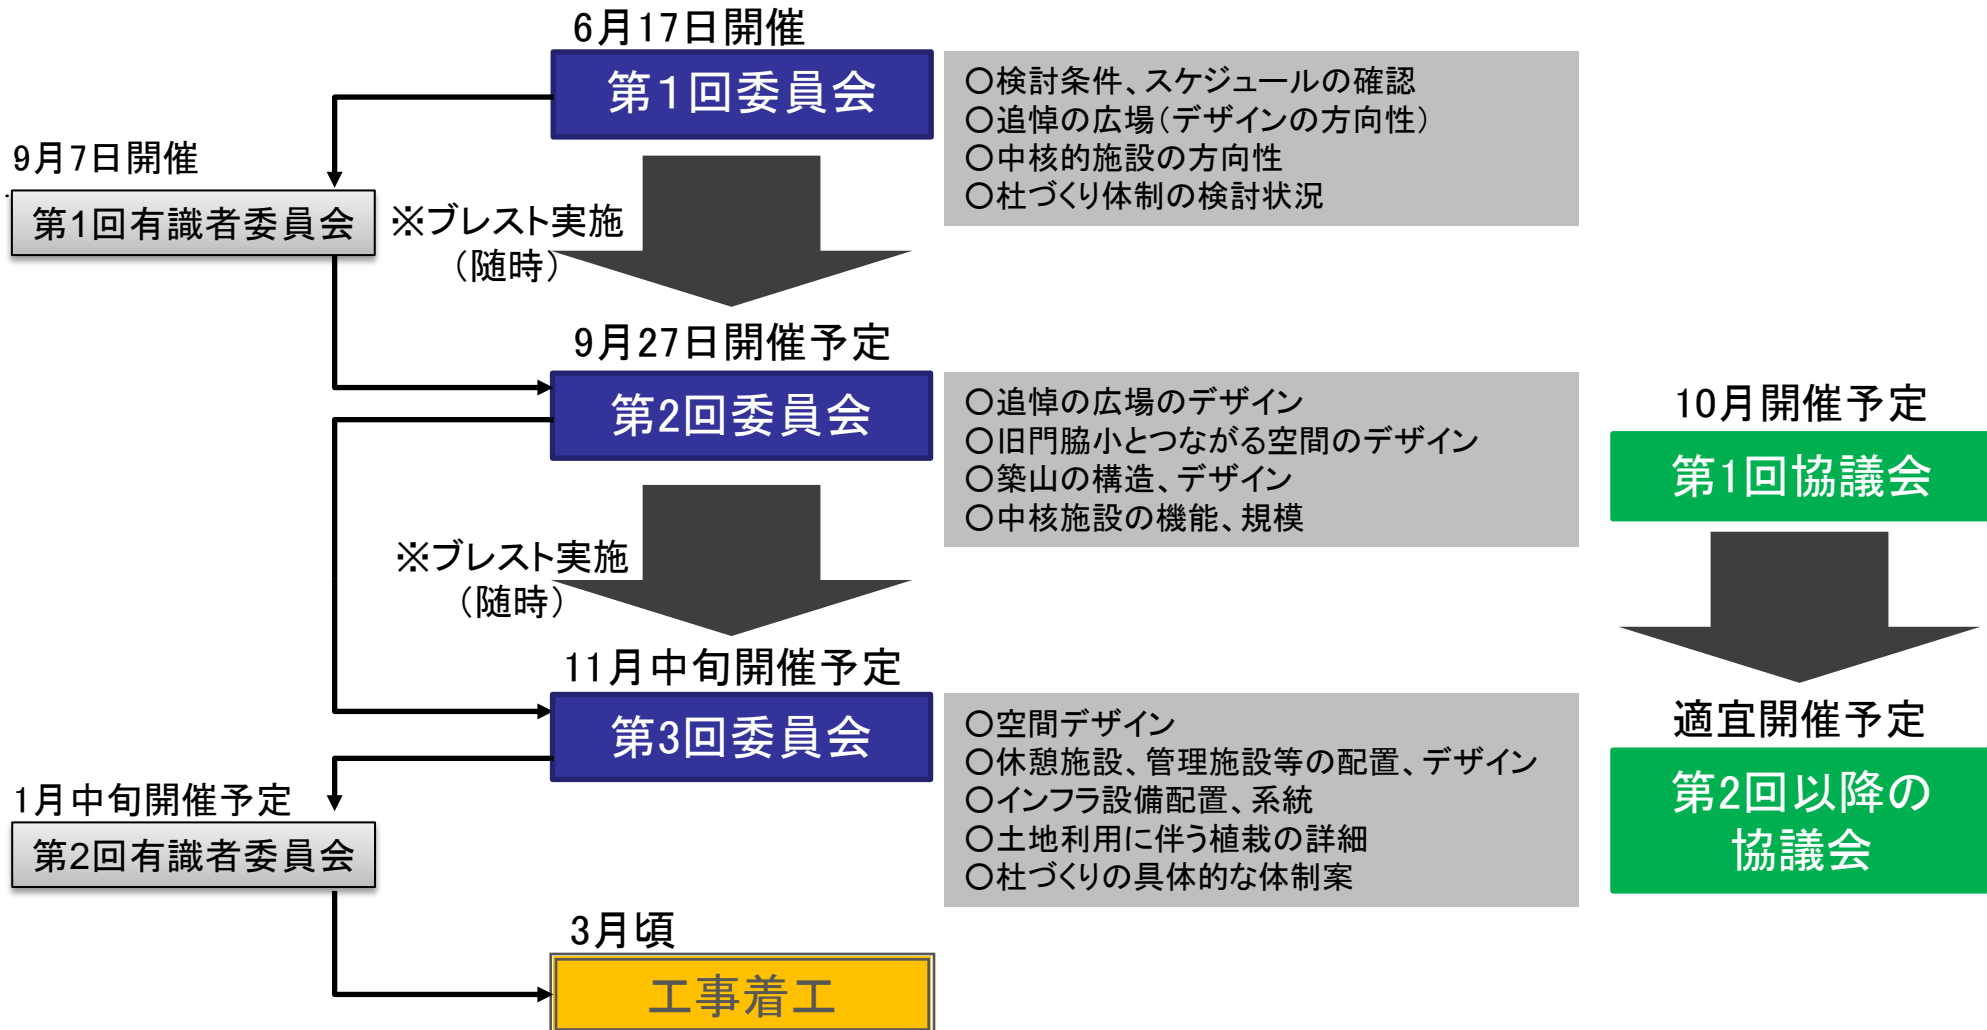

3. 主な検討項目(案)

- ① 公園の骨格的構造(旧門脇小学校や日和山との関係性等)のデザインを検討する
- ② 祈りの対象のあり方を含め追悼の広場の空間デザインを検討する
- ③ 公園の利用形態を考慮したエントランス広場空間のしつらえを検討する
- ④ 公園の利活用と連携した中核的施設の規模や内容を検討する
- ⑤ 護岸構造や植生などの水辺のデザインを検討する

4. 整備スケジュール(案)

整備の概要と要点		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33～42年度	H43～52年度
国	震災経過年・催事等	5年目●	着工式●				東京五輪● 10年目●	20年目○	30年目○
	園地計画・設計	基本設計・実施設計							
	市民活動拠点機能移設	交渉・検討	暫定移設				本移		
	追悼の広場整備				整備工事				
	東側エントランス整備				整備工事				
	アプローチ道路整備				整備工事				
	駐車場整備				整備工事				
	聖人堀、池護岸整備				整備工事				
	その他園地整備				整備工事				
	植栽工事					整備工事			
	中核的施設計画・設計		基本設計・実施設計						
	中核的施設整備				整備工事				
	その他建築施設整備					整備工事			
	運営管理							運営管理(施設・植物)	
県	都市計画審議会		●10月25日						
	都市計画決定告示		●11月1日						
	園地計画・設計	基本設計・実施設計							
	避難築山造成			整備工事					
	湿地・水景造成			整備工事					
	松原造成・植栽		材料調達・苗木生産・基盤整備			植栽工事			
	その他園地整備				整備工事				
	植栽工事					植栽工事			
	建築施設					整備工事			
	運営管理				運営組織検討・準備			運営管理(施設・植物)	
用地買収			買収						
市	園地計画・設計	基本設計・実施設計							
	多目的広場整備				整備工事				
	駐車場整備					整備工事			
	湿地・水景造成			整備工事					
	その他園地整備				整備工事				
	植栽工事					植栽工事			
	建築施設					整備工事			
	運営管理						協働組織と連携した運営管理		
	協働組織づくり	協議		協働組織による試行・改善・組織化準備					
	用地買収			買収					

5. 周辺事業の進捗状況 1/4



※年度は現時点の工事予定期間 ※マリーナ付近の堤防法線は検討中

5. 周辺事業の進捗状況 2/4 【新門脇地区土地地区画整理事業等】

- 新門脇地区は、平成30年度の完成に向けて造成工事が進められている
- 新門脇地区内の復興公営住宅は、平成29年1月頃から入居開始予定
- 都市計画道路のうち、門脇稲井線は平成28年度(新門脇地区内)、南光湊線は平成28年度完成予定



①整備が進む南光湊線(高盛道路)と復興公営住宅



②日光山から見た宅地や復興公営住宅の整備状況

5. 周辺事業の進捗状況 3/4 【防災マリーナ】

○平成26年度より計画検討を開始し、今年度調査設計を実施

○河川堤防、周辺整備及び施設の管理運営について検討・調整し、平成31年4月の供用開始を目指す

事業スケジュール(予定)

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
施設整備	計画検討	調査設計		基盤整備 施設整備		◎ H31年4月 供用開始
管理運営 指定管理者制度等			管理運営 方法の 調査検討	指定管理 者制度設 計	指定管理 者選定手 続き	◎ H31年4月 指定管理 開始
					指定管理 条例策定	

5. 周辺事業の進捗状況 4/4 【河川堤防・旧北上川かわまちづくり】


- 平成24年から堤防工事の前段となる護岸工事に着手しており、堤防整備事業は、平成32年度完了予定
- 堤防整備と合わせ、「旧北上川かわまちづくり」として、市民の集いの場、憩いの場となる水辺空間の整備を進めている



▲工事進捗状況



▲整備イメージ

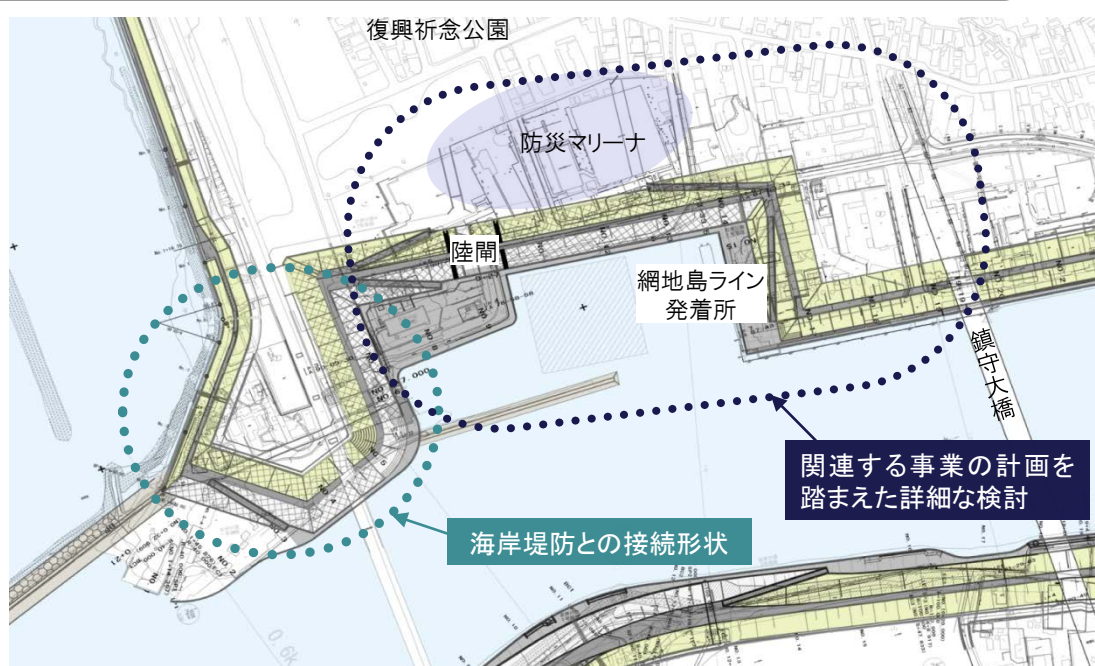

▲かわまちづくりの検討課題

【かわまちづくりの検討状況－南浜地区の課題－】

- ◎関連する事業(復興祈念公園、防災マリーナ、網地島ライン、鎮守大橋等)の計画を踏まえ、それらとの関係性、利便性等を考慮した形状や施設配置等の詳細な検討を行う。
- ◎海岸堤防との接続部分のあり方について関係機関と調整を図りながら、堤防法線の検討を行う。
