

出島架橋事業だより


Vol.2
令和5年2月

日頃より、町道女川出島線の出島架橋事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。


出島架橋工事は、女川町の依頼を受け宮城県が進めております。

石浜で組立を行う出島架橋の上部工部材の第1便が令和5年1月22日、第2便が1月30日に到着したのでお知らせいたします。2月中に石浜で組立を行う全部材の到着を予定しています。

工事場所

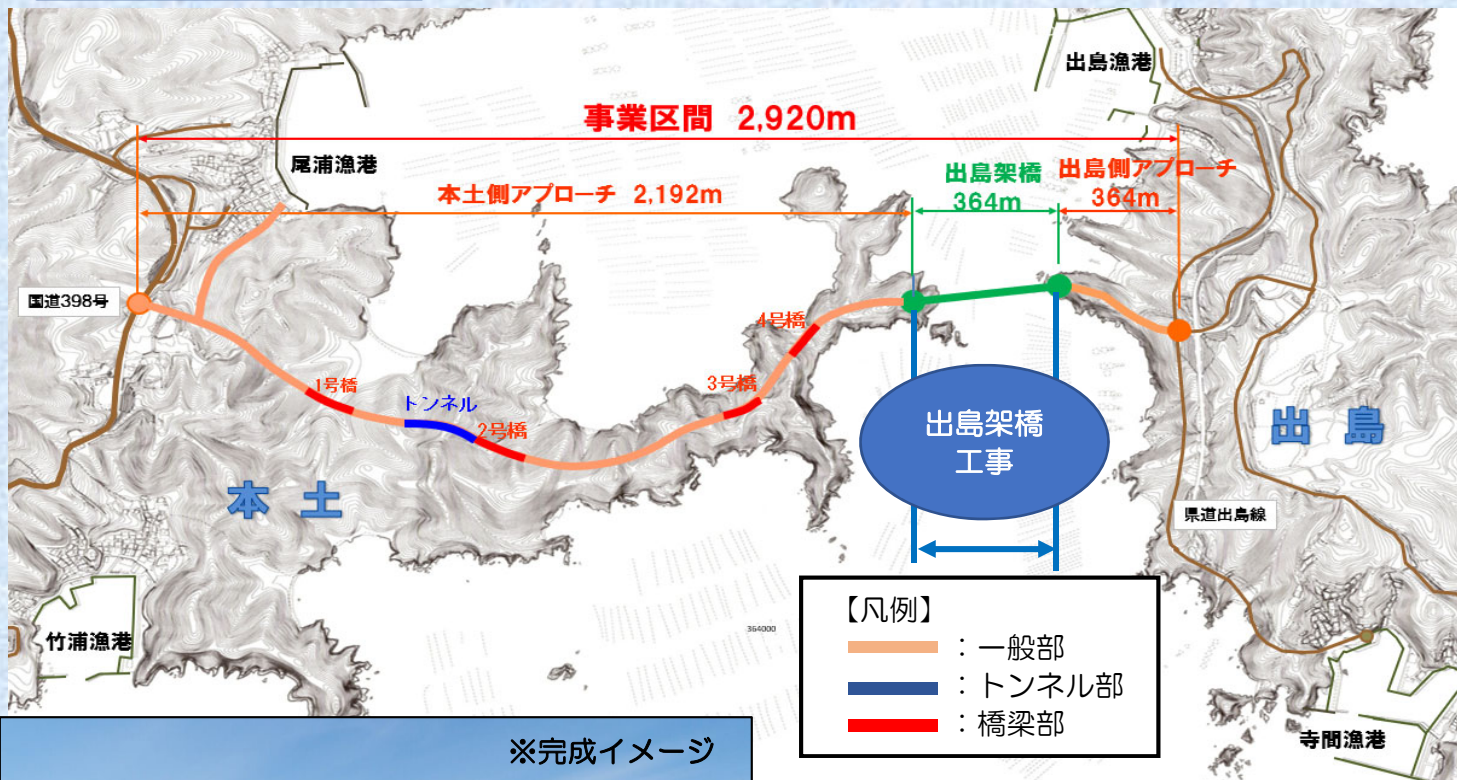

※完成イメージ

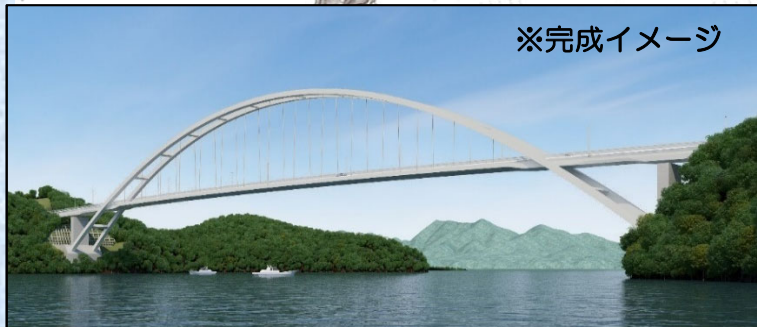

※完成イメージ



橋梁諸元

橋長	364.0m	鋼材重量	約4,100t
有効幅員	6.50m	橋梁形式	鋼中路式
7-7支間	306.0m		アーチ橋

お問い合わせはこちらまで

★出島架橋本体工事に関して★

宮城県 東部土木事務所

〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話：0225-98-3157

★事業全体に関して★

女川町 建設課 土木係

〒986-2265 牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1

電話：0225-54-3131

裏面には

「進捗状況と今後の予定」
の記載があります。

上部工部材 第1便・第2便 到着状況

海上輸送状況



三重県津から女川港まで約800km
7000t積台船で輸送しました。

撮影：R5.1.22


上部工部材



1つのブロックで130t
以上ある部材もあります。

今回は5ブロック
合計615tを輸送

撮影：R5.1.22

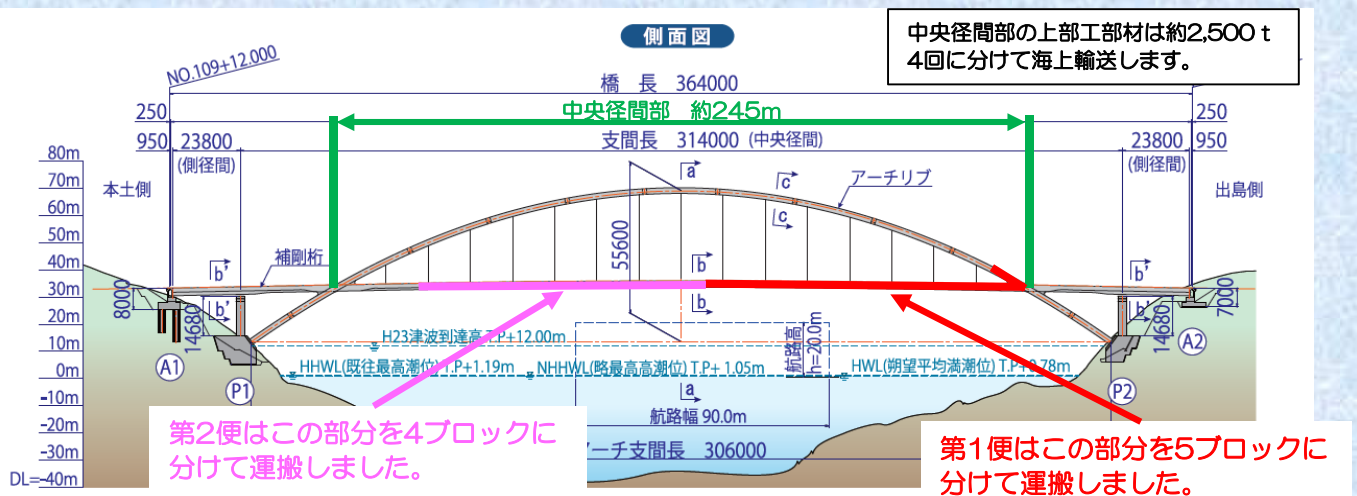

女川港石浜ヤードの状況



今後の予定

進捗率：全体 47% 上部工：工場製作 79%、現地工事 7%
(R5.1月末現在) 下部工：現地工事 67%

●上部工●

引き続き女川港石浜ヤードへの海上輸送を行い、運ばれてきた上部工部材の組立を行います。また、令和5年4月より架設位置周辺にて海上ベント（橋桁をささえる仮の受台）の設置準備を行う予定です。

●下部工●

P1橋脚、P2橋脚の完成を令和4年度末を目標に施工を進めており、その後本土側並びに出島側の、橋台を施工する予定です。
