


出島架橋事業だより

日頃より、町道女川出島線の出島架橋事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。当事業のうち、「出島架橋本体工事」は、女川町から依頼を受け、宮城県が施工を進めています。架橋地点では、橋台の杭工事が完了し、現在は鉄筋組立やコンクリート打設などを行っています。また、女川港石浜ヤードでは、組立が完了したアーチ部において現場溶接・現場塗装をしています。

工事場所

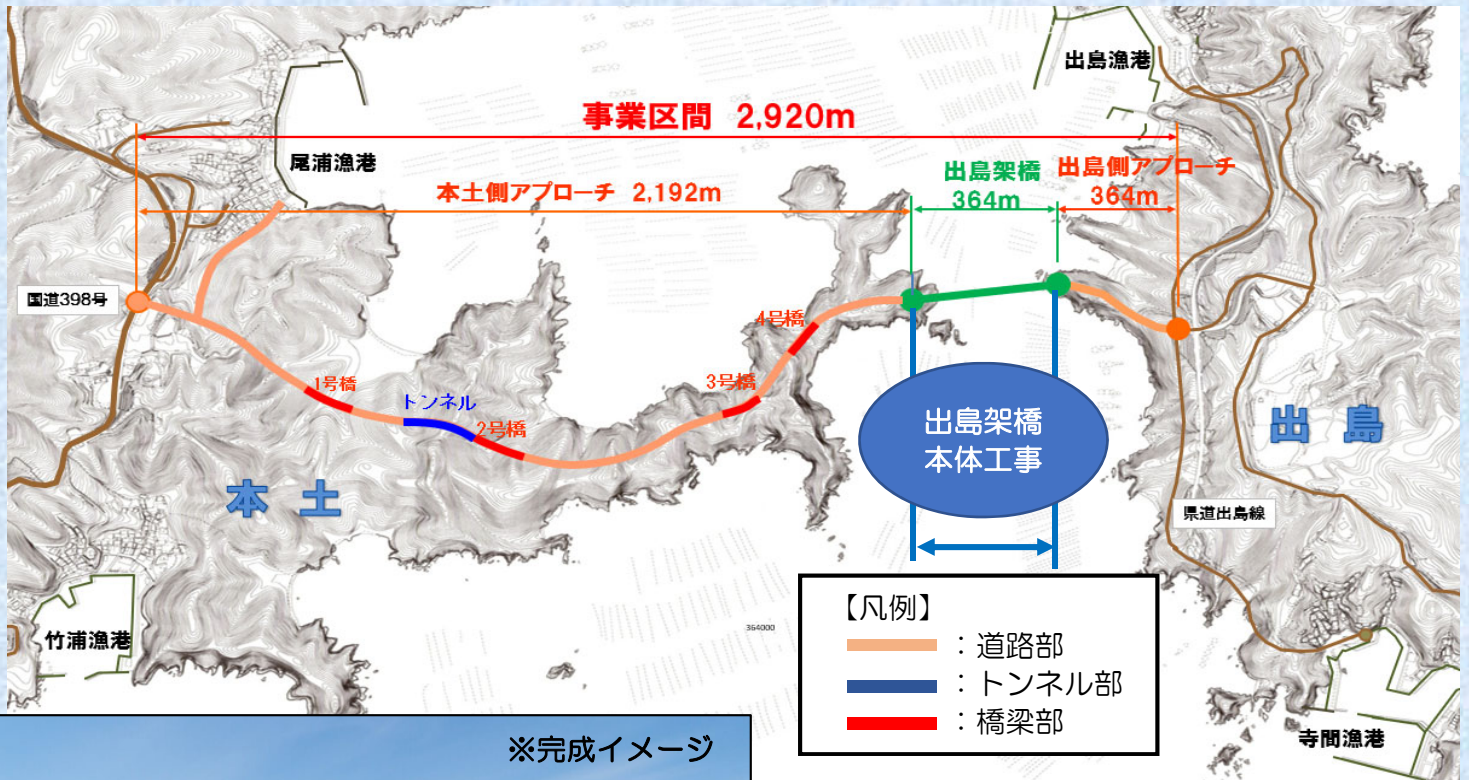

※完成イメージ



※完成イメージ



橋梁諸元

橋長	364.0m	鋼材重量	約4,100t
有効幅員	6.50m	橋梁形式	鋼中路式
アーチ支間	306.0m		アーチ橋

お問い合わせはこちらまで

★出島架橋本体工事に関して★

宮城県 東部土木事務所
〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目7番地
電話：0225-98-3145

★事業全体に関して★

女川町 建設課 土木係
〒986-2265 牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
電話：0225-54-3131

裏面には
「進捗状況と今後の予定」
の記載があります。

工事の進捗状況

現場溶接



鋼材同士を継ぐ箇所は溶接をしています。

A1橋台 深礎杭工



杭工事が完了しました。

現場塗装



鋼材が錆びないように塗装（金属溶射）をしています。

金属を溶かして吹き付けます


A1橋台 躯体工



鉄筋組立・コンクリート打設をしています。

※A2橋台も同じ状況です

女川港石浜ヤードの状況

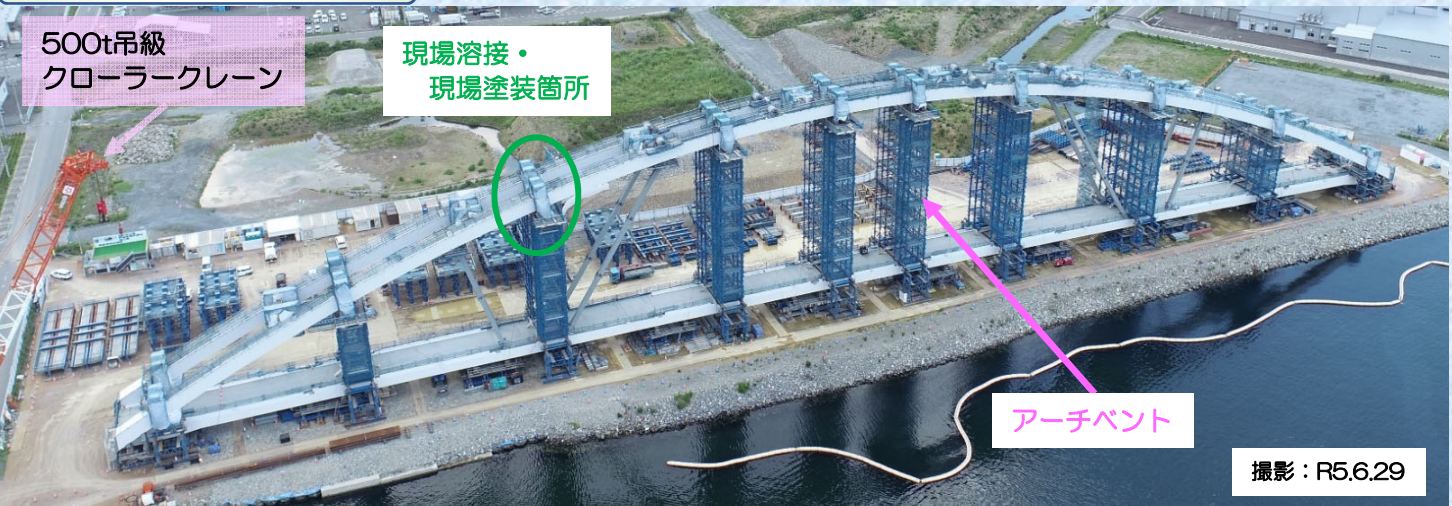

500t吊級
クローラークレーン

現場溶接・
現場塗装箇所

アーチベント

撮影：R5.6.29

今後の予定

進捗率：全体 63%
(R5.6月末現在)

上部工：工場製作 95%、現地工事 30%
下部工：現地工事 88%

●上部工●

女川港石浜ヤードでは、現場溶接・現場塗装と並行して、組立時にアーチ部を支えていたアーチベントの解体に着手します。また、架橋地点では、架設時に橋体を支える海上ベント設備の設置作業等を進めます。

●下部工●

架橋地点において、引き続き、本土側及び出島側の橋台の施工を進めます。なお、橋台の完成は、令和5年7月末を予定しています。
