

東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況

(平成29年7月末現在)


公共土木施設の災害復旧事業の進捗状況及び土木部最重点項目の「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」を推進するための津波対策，復興まちづくり事業，災害公営住宅の整備について，平成29年7月末現在の状況を以下のとおり取りまとめた。

1 公共土木施設の災害復旧事業（県事業）

- 公共土木施設全体 2,303箇所のうち，**2,285箇所**（全体の約99%）に着手しており，そのうち**2,030箇所**（全体の約88%）が完成している。金額ベースでは，全体事業費7,279億円に対して，完成率が約21%となっている。
- また，受注者からの工事履行報告書に基づく，工事の進捗状況については，平成29年3月末時点で約6割となっている。
- なお，現時点における金額ベースの完成見通しは，平成29年度末約7割，平成30年度末約9割を予定している（※現時点の予定であり，今後変更する場合もある）。

<内陸・沿岸部別>

- 内陸部では，808箇所**全てにおいて着手**しており，そのうち**807箇所**（全体の約99%）が完成している。
- 沿岸部では，1,495箇所のうち，**1,477箇所**（全体の約99%）に着手しており，そのうち**1,223箇所**（全体の約82%）が完成している。

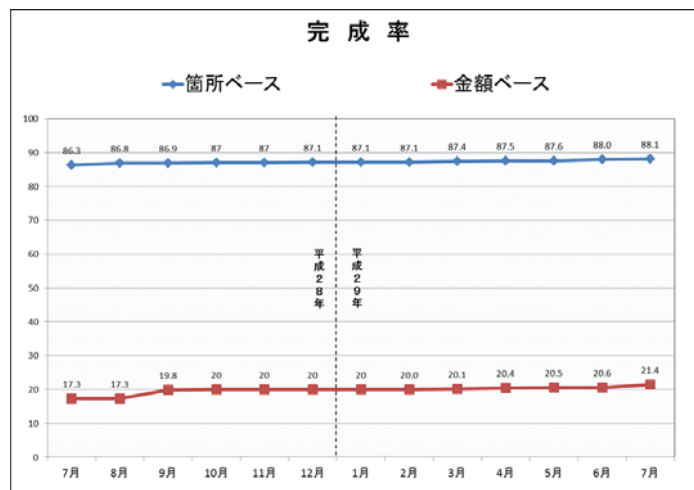

公共土木施設の災害復旧工事全体（県事業）の完成率（%）の推移

現場の状況（写真）



浜市橋
(東松島市)



東名地先海岸
(東松島市)

2 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築

(1) 津波対策※

<河川施設>

- 全体42箇所**全てにおいて本格工事に着手**している。

<海岸（建設・港湾）施設>

- 全体99地区海岸のうち、92地区（全体の約93%）において、本格工事に着手している。
（※津波対策の対象施設は、災害復旧事業により実施する海岸や河川堤防のほか、復興事業により新設する堤防も含む）

(2) 復興まちづくり事業

<防災集団移転促進事業>

- 12市町195地区で計画されており、**全地区で造成工事等に着手***している。

（※造成工事着手等とは、工事請負契約の締結が完了した状態のことを示す）

- 住宅等建築工事可能※地区数は、県全体で12市町**193地区**（全体の約99%）となっている。（※住宅等建築工事可能とは、造成工事が完了する等、建築工事の準備が整った状態のことを示す）



雄勝中心部B地区（伊勢畑）
（石巻市）

<土地区画整理事業>

- 11市町34地区で計画されており、**全地区で事業認可・工事着工**となっている。

- 住宅等建築工事可能（使用収益開始）地区数は、10市町**24地区**（全体の約71%）となっており、換地処分地区数は、東松島市で1地区増加し、**5地区**で換地処分が完了している。



野蒜北部丘陵地区（東松島市）

<津波復興拠点整備事業>

- 8市町12地区で計画されており、**全地区で事業認可・工事着工**となっている。

- 住宅等建築工事可能（供用開始）地区数は、8市町**11地区**（全体の約92%）となっており、事業完了地区数は県全体で**3地区**となっている。

(3) 災害公営住宅の整備事業

- 現時点の整備計画戸数16,093戸のうち、
- 21市町310地区、15,399戸の工事に着手している。
- 工事完了戸数は、21市町287地区、14,529戸となっている。



佐須地区
（石巻市）



閑上地区鍵引渡し式
（名取市）

公共土木施設の復旧工事の進捗状況

(公共土木施設災害復旧事業：県事業)

【平成29年7月末現在】

○「次世代に豊かさを引き継ぐことのできる持続可能なみやぎの県土づくり」の理念のもと、県民の命と生活を守り、震災を乗り越え、更なる発展につなげる県土づくりを目指して取り組んでいます。

項目 (最大被害等)	(着手・完成) / (復旧箇所・復旧費)	進捗率	項目 (最大被害等)	(着手・完成) / (復旧箇所・復旧費)	進捗率
道路・橋梁施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～32年度 復旧費 約862億円	被災箇所数: 道路 1,411箇所 橋梁 123箇所	箇所ベース 着手率 約99% 完成率 約97% 金額ベース 着手率 約99% 完成率 約49%	下水道施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～25年度 復旧費 約351億円	被災箇所数: 121箇所	箇所ベース 着手率 100% 完成率 100% 金額ベース 着手率 100% 完成率 100%
河川施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～32年度 復旧費 約3,822億円	被災箇所数: 273箇所	箇所ベース 着手率 約99% 完成率 約83% 金額ベース 着手率 約99% 完成率 約6%	港湾施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～30年度 復旧費 約1,035億円	被災箇所数: 287箇所	箇所ベース 着手率 約96% 完成率 約55% 金額ベース 着手率 約98% 完成率 約32%
海岸保全施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～30年度 復旧費 約1,184億円	被災箇所数: 73施設	箇所ベース 着手率 約99% 完成率 約37% 金額ベース 着手率 約99% 完成率 約16%	公共土木施設 (道路橋梁、河川、海岸、砂防、下水道、港湾、公園) 復旧事業の概要 期間 H23～32年度 復旧費 約7,279億円	被災箇所数: 2,303箇所	箇所ベース 着手率 約99% 完成率 約88% 金額ベース 着手率 約99% 完成率 約21%
砂防・地滑・急傾斜施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～24年度 復旧費 約8億円	被災箇所数: 8施設	箇所ベース 着手率 100% 完成率 100% 金額ベース 着手率 100% 完成率 100%	沿岸部 箇所ベース 着手率 約99% 金額ベース 約99% 箇所ベース 完成率 約82% 金額ベース 約19%	内陸部 箇所ベース 着手率 100% 金額ベース 100% 箇所ベース 完成率 約99% 金額ベース 約98%	凡例 着手 (浅緑) 完成 (深緑)

(空白)

土木部最重点項目

災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の推進

平成29年7月末現在

市町名	津波対策※1				復興まちづくり事業				災害公営住宅の整備			
	土木部所管 河川		土木部所管 海岸(建設・港湾)		防災集団移転促進事業		土地区画整理事業		災害公営住宅		災害公営住宅	
	箇所数	上段：済・率(応急工事を含む工事着手) 下段：済・率(本格工事着手)	箇所数	上段：済・率(応急工事を含む工事着手) 下段：済・率(本格工事着手)	計画地区数	上段：済・率(造成工事着手等) 下段：済・率(住宅等建築工事可能)	計画地区数	上段：済・率(工事着手) 下段：済・率(住宅等建築工事可能)(使用開始開始)	計画戸数	上段：済・率(工事着手) 下段：済・率(工事完了)	計画戸数	上段：済・率(工事着手) 下段：済・率(工事完了)
気仙沼市	7	7 100.0% 7 100.0%	24	23 95.8% 23 95.8%	51	51 100.0% 50 98.0%	3	3 100.0% 3 100.0%	2,087	2,087 100.0% 2,087 100.0%	2,087	2,087 100.0% 2,087 100.0%
南三陸町	10	10 100.0% 10 100.0%	7	7 100.0% 7 100.0%	26	26 100.0% 26 100.0%	1	1 100.0% 1 100.0%	738	738 100.0% 738 100.0%	738	738 100.0% 738 100.0%
石巻市	8	8 100.0% 8 100.0%	26	24 92.3% 24 92.3%	56	56 100.0% 56 100.0%	15	15 100.0% 10 66.7%	4,700	4,253 90.5% 3,787 80.6%	4,700	4,253 90.5% 3,787 80.6%
女川町	1	1 100.0% 1 100.0%	9	9 100.0% 9 100.0%	22	22 100.0% 21 95.5%	1※2	1 100.0% 1 100.0%	859	859 100.0% 621 72.3%	859	859 100.0% 621 72.3%
東松島市	4	4 100.0% 4 100.0%	8	8 100.0% 8 100.0%	7	7 100.0% 7 100.0%	3	3 100.0% 3 100.0%	1,122	1,001 89.2% 913 81.4%	1,122	1,001 89.2% 913 81.4%
松島町	1	1 100.0% 1 100.0%	2	2 100.0% 2 100.0%					52	52 100.0% 52 100.0%	52	52 100.0% 52 100.0%
利府町									25	25 100.0% 25 100.0%	25	25 100.0% 25 100.0%
塩竈市			12	8 66.7% 8 66.7%	2	2 100.0% 2 100.0%	2	2 100.0% 2 100.0%	390	390 100.0% 390 100.0%	390	390 100.0% 390 100.0%
七ヶ浜町			8	8 100.0% 8 100.0%	5	5 100.0% 5 100.0%	4	4 100.0% 0 0.0%	212	212 100.0% 212 100.0%	212	212 100.0% 212 100.0%
多賀城市	1	1 100.0% 1 100.0%					1	1 100.0% 1 100.0%	532	532 100.0% 532 100.0%	532	532 100.0% 532 100.0%
仙台市	2	2 100.0% 2 100.0%	3	3 100.0% 3 100.0%	14	14 100.0% 14 100.0%	1	1 100.0% 1 100.0%	3,179	3,179 100.0% 3,179 100.0%	3,179	3,179 100.0% 3,179 100.0%
名取市	3	3 100.0% 3 100.0%			2	2 100.0% 2 100.0%	2	2 100.0% 1 50.0%	660	534 80.9% 456 69.1%	660	534 80.9% 456 69.1%
岩沼市	3	3 100.0% 3 100.0%			2	2 100.0% 2 100.0%	1	1 100.0% 1 100.0%	210	210 100.0% 210 100.0%	210	210 100.0% 210 100.0%
亶理町					5	5 100.0% 5 100.0%			477	477 100.0% 477 100.0%	477	477 100.0% 477 100.0%
山元町	2	2 100.0% 2 100.0%			3	3 100.0% 3 100.0%			490	490 100.0% 490 100.0%	490	490 100.0% 490 100.0%
その他6市町									360	360 100.0% 360 100.0%	360	360 100.0% 360 100.0%
合計	42	42 100.0% 42 100.0%	99	92 92.9% 92 92.9%	195	195 100.0% 193 99.0%	34	34 100.0% 24 70.6%	16,093	15,399 95.7% 14,529 90.3%	16,093	15,399 95.7% 14,529 90.3%

※1：復興事業による新設工事も含む

事業計画の国交省大臣同意は全地区で得ている。
●津波復興拠点整備事業は、6市町12地区が計画で、全地区で事業認可・工事着手となり、11地区で住宅等建築認可(使用開始)、3地区において事業が完了している。
※2 女川町は事業認可を申請取得しているが、1地区として計上している。
かつや年の■は先月に対する増加分を示す

※1：登米市、栗原市、大崎市、大畑町、涌谷町、美里町

(空白)

災害公営住宅の整備状況について

(平成29年7月31日現在)

- 災害公営住宅については、平成29年7月末時点で21市町、310地区、15,564戸(前月末比±0戸)において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、21市町、310地区、15,399戸(前月末比+42戸)について着工し、21市町、287地区、14,529戸(前月末比+262戸)については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を住宅課のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/juutaku/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		うち、工事着手戸数		うち、工事完了戸数	
			進捗率		進捗率		進捗率
01 仙台市	3,179戸	3,179戸	100.0%	3,179戸	100.0%	3,179戸	100.0%
02 石巻市	4,700戸	4,292戸	91.3%	4,253戸	90.5%	<u>3,787戸</u>	<u>80.6%</u>
03 塩竈市	390戸	390戸	100.0%	390戸	100.0%	390戸	100.0%
04 気仙沼市	2,087戸	2,087戸	100.0%	2,087戸	100.0%	2,087戸	100.0%
05 名取市	660戸	660戸	100.0%	<u>534戸</u>	<u>80.9%</u>	<u>456戸</u>	<u>69.1%</u>
06 多賀城市	532戸	532戸	100.0%	532戸	100.0%	532戸	100.0%
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	210戸	100.0%	210戸	100.0%
08 登米市	84戸	84戸	100.0%	84戸	100.0%	84戸	100.0%
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,122戸	1,001戸	89.2%	1,001戸	89.2%	913戸	81.4%
11 大崎市	170戸	170戸	100.0%	170戸	100.0%	170戸	100.0%
12 亶理町	477戸	477戸	100.0%	477戸	100.0%	477戸	100.0%
13 山元町	490戸	490戸	100.0%	490戸	100.0%	490戸	100.0%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	52戸	100.0%	52戸	100.0%
15 七ヶ浜町	212戸	212戸	100.0%	212戸	100.0%	212戸	100.0%
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	25戸	100.0%
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	3戸	100.0%
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	48戸	100.0%	48戸	100.0%
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	859戸	859戸	100.0%	<u>859戸</u>	<u>100.0%</u>	<u>621戸</u>	<u>72.3%</u>
21 南三陸町	738戸	738戸	100.0%	738戸	100.0%	738戸	100.0%
計	16,093戸	15,564戸	96.7%	<u>15,399戸</u>	<u>95.7%</u>	<u>14,529戸</u>	<u>90.3%</u>

※計画戸数は各市町の供給計画の見直しにより変更になることがあります。

※前月末から変更になった戸数等には下線が引いてあります。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ
市町数	9市町	8市町	15市町	10市町	1市
地区数	27地区	41地区	58地区	191地区	8地区
戸数	2,229戸	3,926戸	2,756戸	6,447戸	206戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。
