

## 宮城県広域防災拠点整備事業の進捗状況について

宮城県土木部都市計画課

## 1 これまでの主な経過


| 時期                           | 宮城野原地区関係  | 岩切地区関係（貨物ターミナル駅）     |
|------------------------------|---|----------------------|
| 平成 28 年 6 月                  | 県－JR 貨物との基本合意書締結式（宮城野原の土地取得と JR 貨物による岩切地区への貨物ターミナル駅の移転について合意） |                      |
| 平成 28 年 10                   | 宮城野原地区（現駅）の土地取得に係る契約締結  |                      |
| 平成 28 年 10 月<br>～平成 29 年 1 月 | ボーリング調査   |                      |
| 平成 29 年 5 月                  |   | 岩切地区用地説明会            |
| 平成 29 年 11 月                 |   | 環境アセスメント（事業着手前）手続き終了 |
| 平成 30 年 1 月<br>～4 月          |   | 岩切地区一部工事（畦畔・仮設通路設置）  |
| 平成 30 年 2 月<br>～5 月          | 測量業務着手  |                      |
| 平成 30 年 10 月                 |   | 岩切地区用地契約完了           |
| 平成 31 年 1 月～                 | 土質調査着手<br>公園詳細設計（上下水等施設検討）                                    |                      |

## 2 今後の主なスケジュール

JR 貨物との補償契約締結の遅延等により、広域防災拠点の一部供用開始の時期を平成 32 年度から平成 35 年度以降に延期する。

| 時期         | 宮城野原地区関係 | 岩切地区関係（貨物ターミナル駅） |
|------------|----------|------------------|
| 平成 31 年度～  | 公園施設詳細設計 | 補償契約締結，貨物駅移転工事着手 |
| 平成 34 年度   |          | 貨物駅移転完了          |
| 平成 35 年度以降 | 供用開始     |                  |

# 広域防災拠点施設配置方針（ゾーニング）

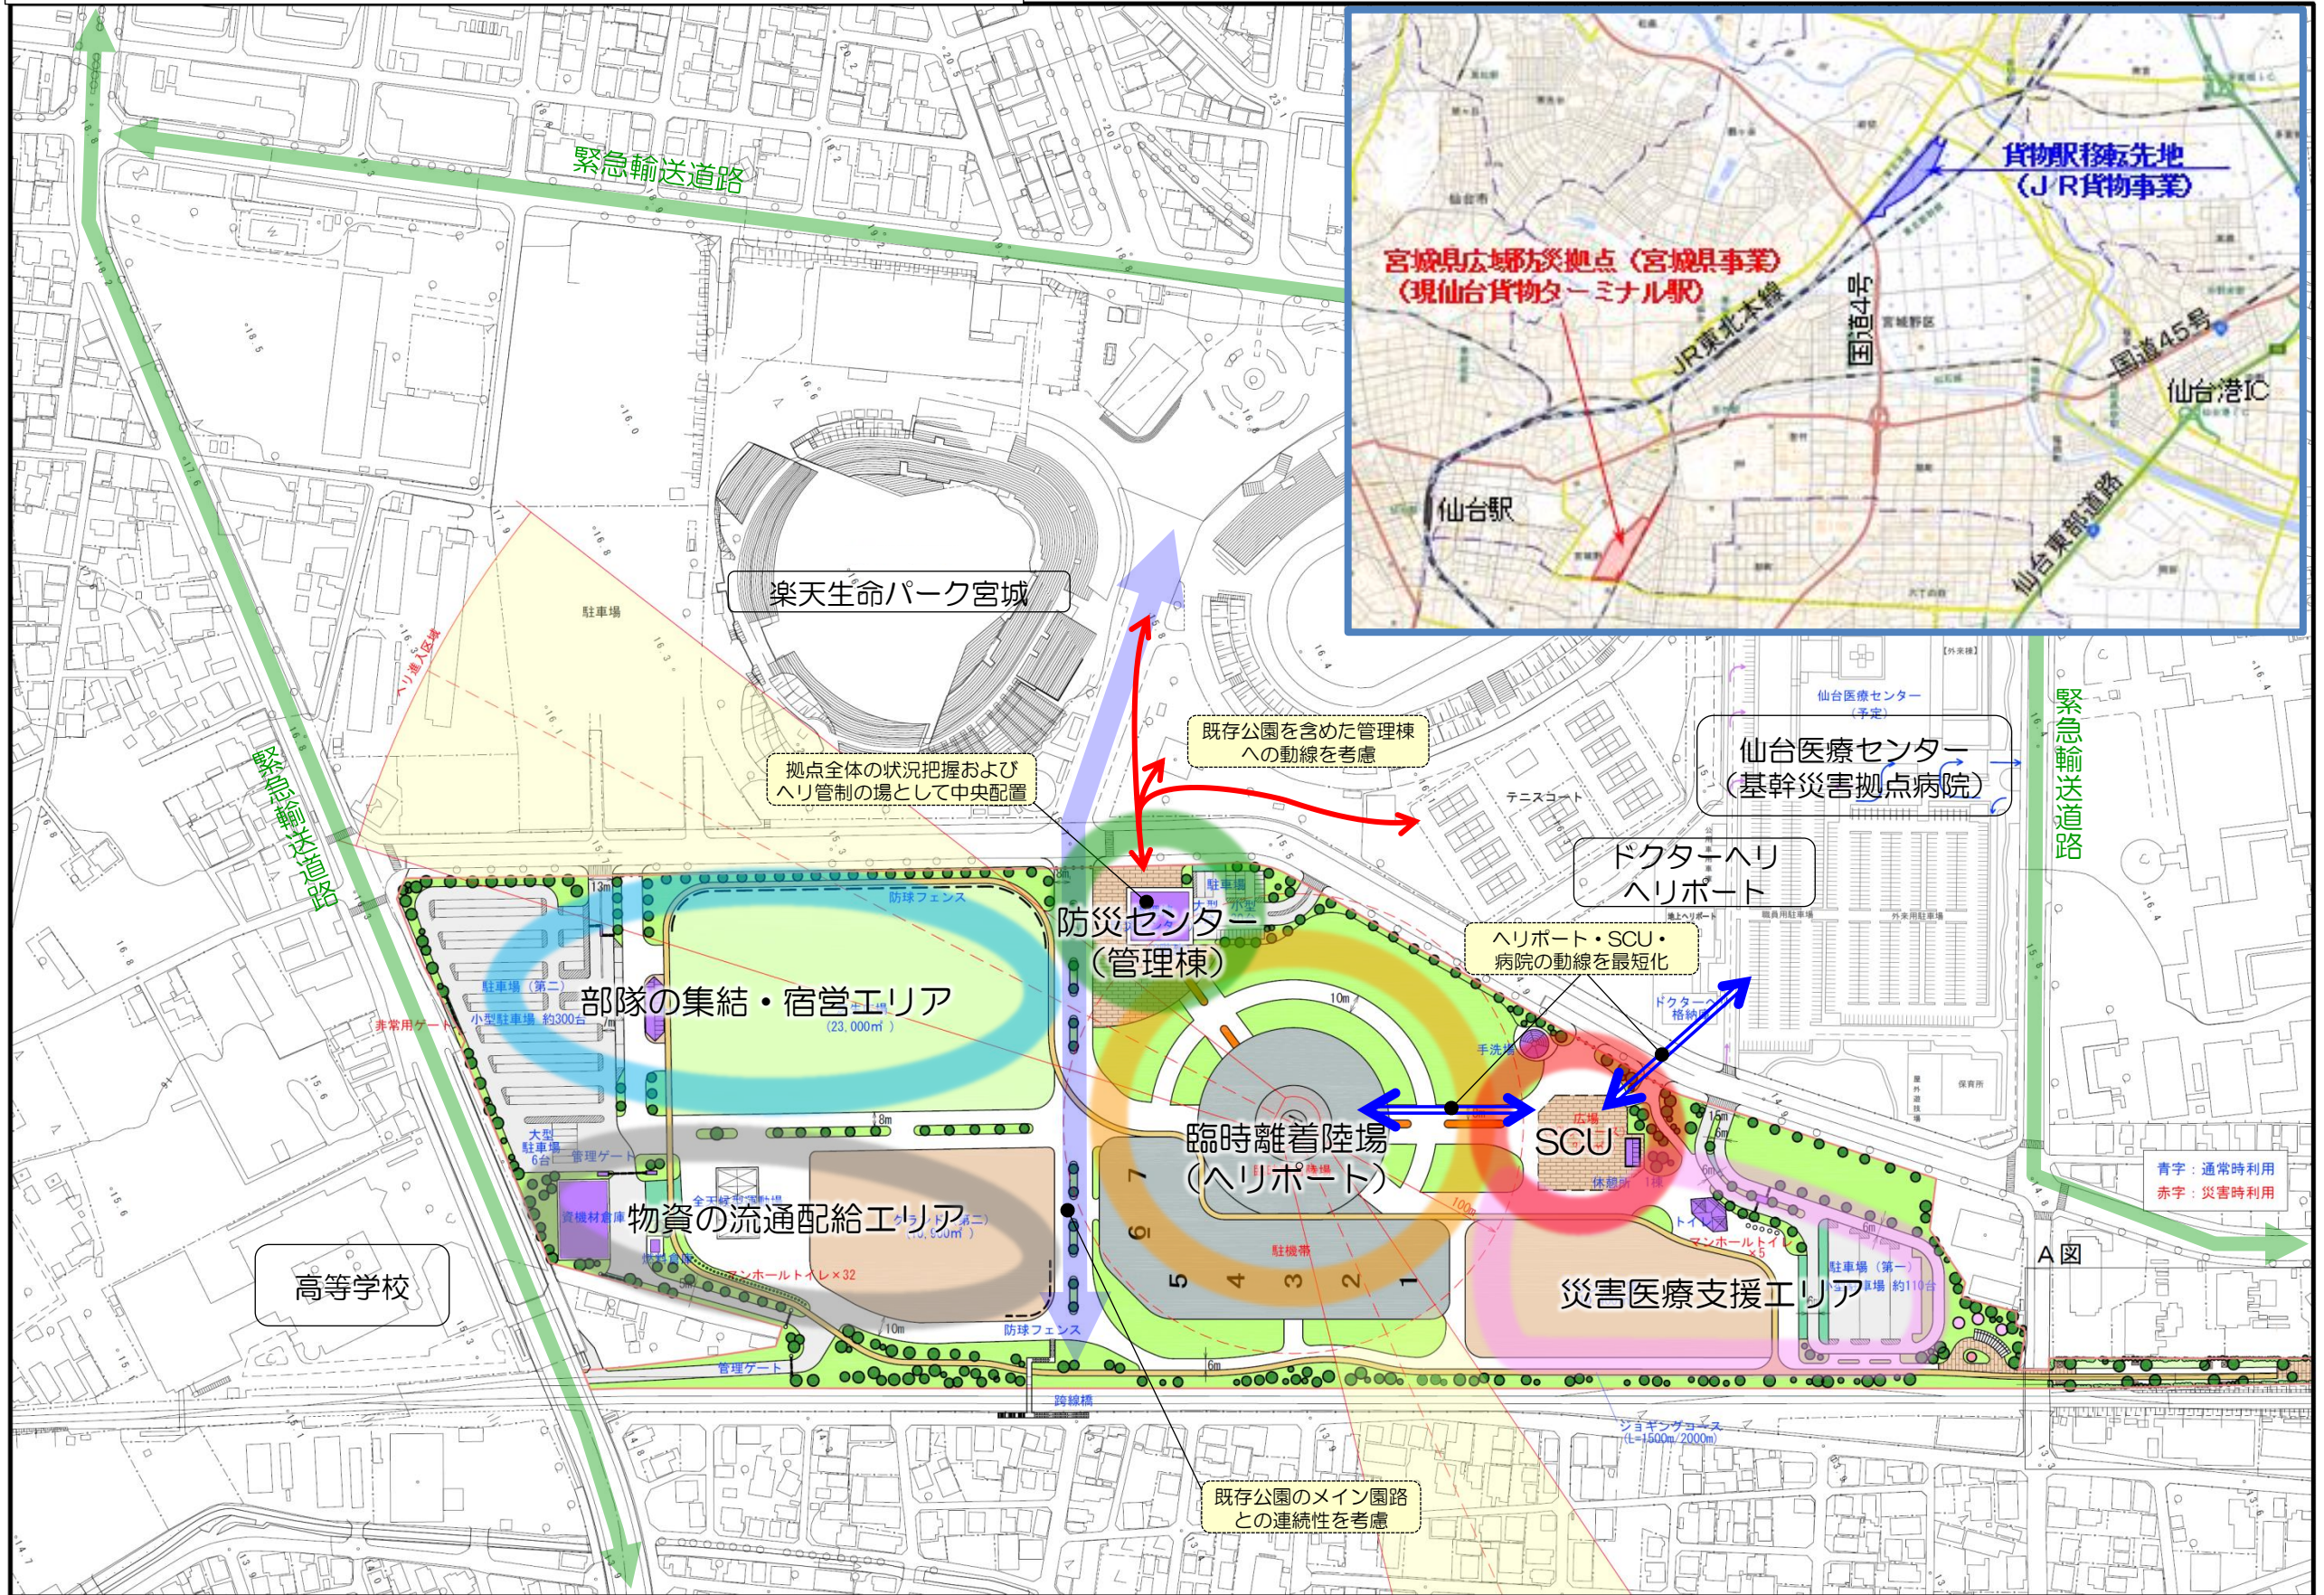

0 10 20 30 40 50 100 150 200m

S=1:1,500 (A1)  
S=1:3,000 (A3)
