

工事概要

- (1) 工事件名 平成28年度県債311地震債6204-A01号
田の浜地先海岸災害復旧外工事
- (2) 工事場所 唐桑海岸(田の浜地区海岸)気仙沼市唐桑町上鮎立地内
- (3) 請負金額 ¥345,101,040- (税込み)
- (4) 工期 平成28年8月5日から平成30年3月26日まで
- (5) 発注者 宮城県気仙沼土木事務所
河川砂防第3班
総括監督員 鈴木 知洋
主任監督員 技術次長 佐藤 和博
監督員 技師 佐々木 龍大
- (6) 請負者 株式会社 アスリード
土木部
現場代理人 野崎 孝二
監理技術者 松岡 義則
連絡先 アスリード気仙沼本店
☎ 0226-22-6220
☎ 0226-22-6221

(7) 施工内容

防潮堤復旧 L=59.9m
築堤盛土工 V=4850m³
中層混合処理工 V=11150m³
コンクリート被覆ブロック工 A=1265m²
排水工 一式

道路 L=59.9m・W=10.0m(5.5m)
路体盛土工 V=1130m³
中層混合処理工 V=1450m³


既設堤防復旧
L=62.0m

予定工程


	平成29年				平成30年											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
既設構造物撤去	■															
中層混合処理工	■	■	■													
防潮堤・道路工							■	■	■	■	■	■				
既設堤防復旧																
市道盛土													■	■	■	

位置図


防潮堤復旧工(平面図)

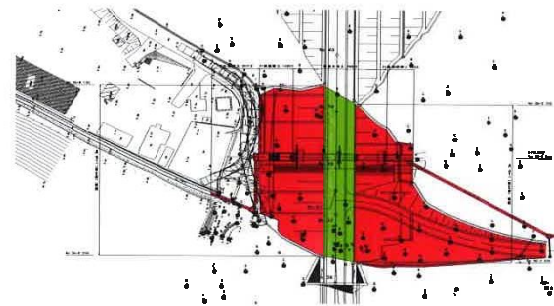


防潮堤復旧工(断面図)



道路平面図

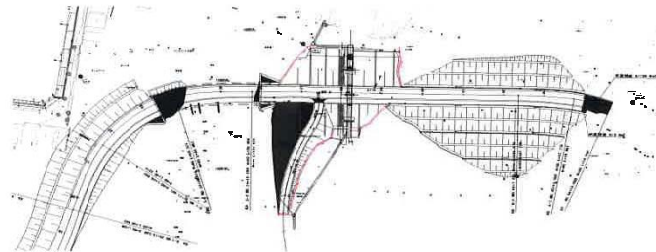

既設堤防復旧工平面図

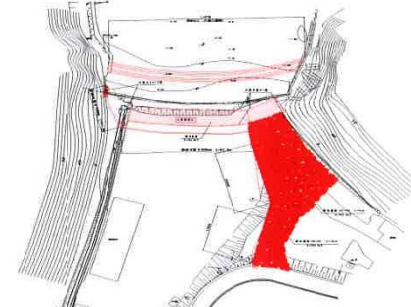


田の浜地先海岸災害復旧工事

施工状況ごとの道路通行ステップ図


ステップ①

現状道路使用状況

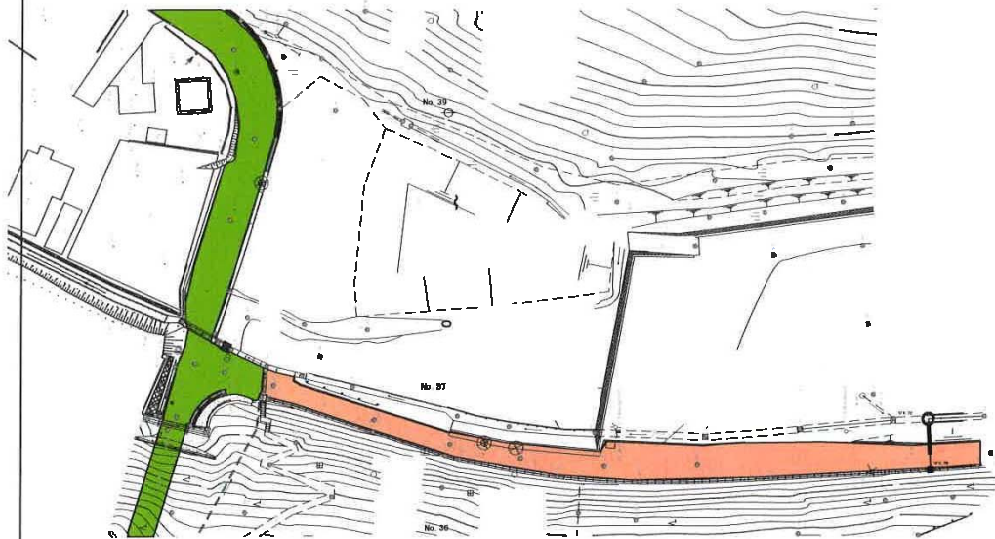


ステップ②

L1堤防 地盤改良工・道路盛土工・樋管工・護岸ブロック積工
道路工施工時 平成29年2月～平成29年6月下旬

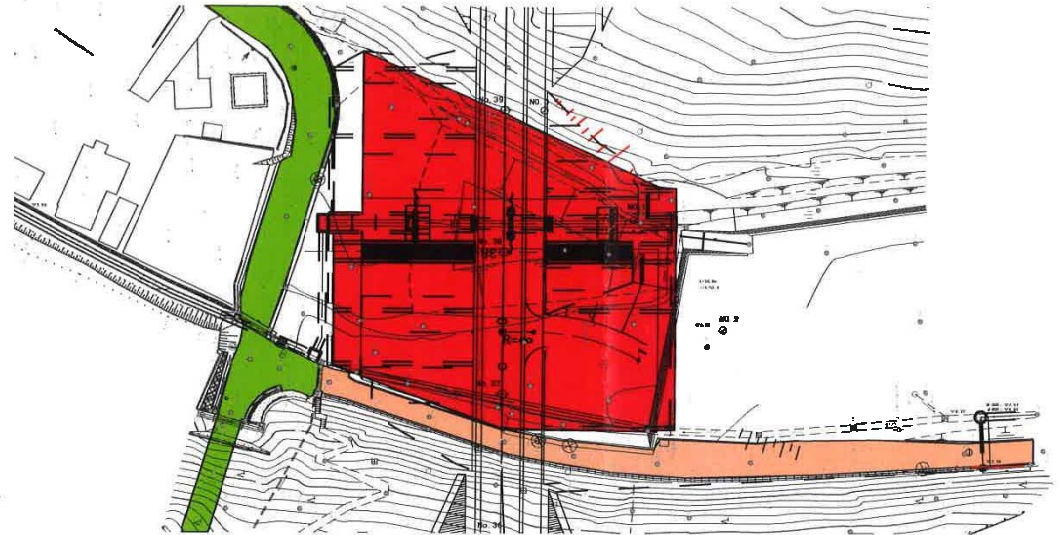


ステップ③

L1堤防残 地盤改良工・道路盛土工・樋管工・護岸ブロック積工
道路工施工時 平成29年10月上旬～平成29年11月上旬

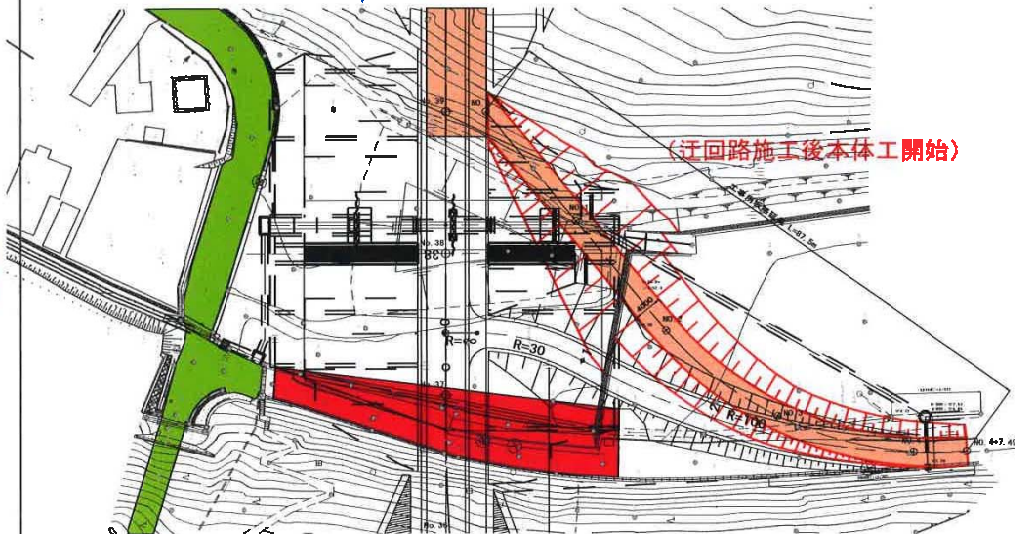

ステップ④

取り付け道路施工 土工・法面工・舗装工
(始点側施工時は規制あり) 平成29年11月上旬～平成30年1月下旬

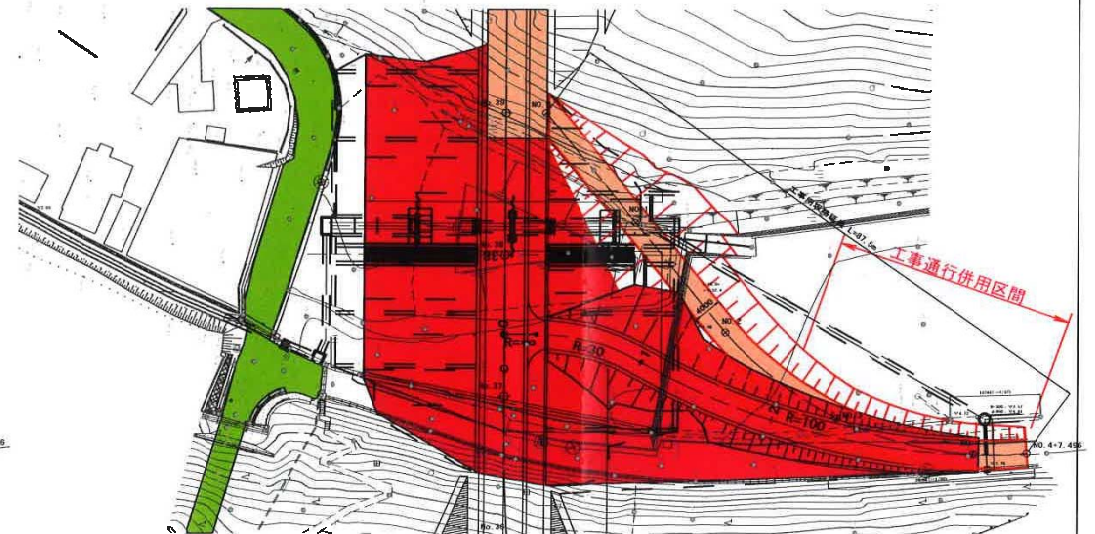

既設道路



迂回路



施工箇所
