


# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

【令和4年7月末現在】

※朱書は前月との比較

**公共土木施設** 着手率 100% 完成率 88% (+2pt)  
 (道路,河川,砂防, 受託)



復旧・復興事業の概要  
 期間 R1~R4年度  
 工事費 約151億円

事業箇所数:  
 323箇所

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)
<b>道路 災害復旧工事</b>  期間 R1~R3 工事費 約40億円  <small>※ 丸森霊山線・丸森梁川線の 一部は関連工事との調整により R4完成見込</small>	50% 100% 着手率 93箇所 完成率 76箇所  着手率 100% 完成率 82% 事業箇所数: 93箇所	<b>災害関連 緊急砂防工事</b>  期間 R1~R4 工事費 約52億円	50% 100% 着手率 15箇所 完成率 1箇所  着手率 100% 完成率 7% 事業箇所数: 15箇所	<b>受託工事 (町道古田峠線)</b>  期間 R1~R3 工事費 約2億円	50% 100% 着手率 7箇所 完成率 7箇所 (+3箇所)  着手率 100% 完成率 100% (+43pt) 事業箇所数: 7箇所
<b>河川 災害復旧工事</b>  期間 R1~R3 工事費 約50億円	50% 100% 着手率 193箇所 完成率 193箇所  着手率 100% 完成率 100% 事業箇所数: 193箇所	<b>災害関連工事 (丸森梁川線)</b>  期間 R1~R4 工事費 約4億円	50% 100% 着手率 1箇所 完成率 0箇所  着手率 100% 完成率 0% 事業箇所数: 1箇所	<b>土砂災害 対策道路事業 (丸森霊山線)</b>  期間 R3~R4 工事費 約3億円	50% 100% 着手率 14箇所 完成率 8箇所 (+3箇所)  着手率 100% 完成率 57% (+21pt) 事業箇所数: 14箇所

【令和4年7月末現在】

# 大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

災害復旧事業						
市町名	道路災害復旧工事			河川災害復旧工事		
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	進捗率	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	進捗率
白石市	18 【3億円】	18 100% 18 100%	100%	43 【13億円】	43 100% 43 100%	100%
角田市	15 【3億円】	15 100% 15 100%	100%	38 【11億円】	38 100% 38 100%	100%
藤王町	1 【0.2億円】	1 100% 1 100%	100%	19 【4億円】	19 100% 19 100%	100%
七ヶ宿町	0			18 【2億円】	18 100% 18 100%	100%
村田町	4 【0.3億円】	4 100% 4 100%	100%	17 【3億円】	17 100% 17 100%	100%
川崎町	7 【2億円】	7 100% 7 100%	100%	25 【5億円】	25 100% 25 100%	100%
丸森町	48 【31億円】	48 100% 31 65%	65%	33 【12億円】	33 100% 33 100%	100%
<b>合計</b>	<b>93</b> 【40億円】	<b>93 100%</b> <b>76 82%</b>	<b>82%</b>	<b>193</b> 【50億円】	<b>193 100%</b> <b>193 100%</b>	<b>100%</b>

関連事業		
市町名	災害関連緊急砂防工事	
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）
丸森町	15 【52億円】	15 100% 1 7%
	<b>災害関連工事（丸森梁川線）</b>	
	1 【4億円】	1 100% 0 0%
	<b>受託工事（町道 古田峠線）</b>	
7 【2億円】	7 100% 7 100%	
<b>土砂災害対策道路事業（丸森雲山線）</b>		
14 【3億円】	14 100% 8 57%	
<b>合計</b>	<b>37</b> 【61億円】	<b>37 100%</b> <b>16 43%</b>

※ 大河原町及び柴田町については、道路及び河川災害復旧工事が無いため、一覧表から除いている。

# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

丸森町 古田峠線 18340号



丸森町 古田峠線 18344号



丸森町 古田峠線 18345号



着手前

施工中

完成



# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真


### 丸森町 丸森霊山線 土砂災害対策道路事業(その6)



### 丸森町 丸森霊山線 土砂災害対策道路事業(その12)



### 丸森町 丸森霊山線 土砂災害対策道路事業(その13)

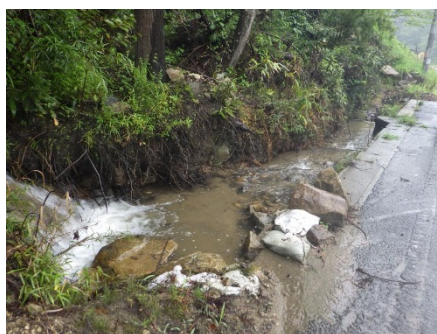

着手前

施工中

完成
