

現在：8工区7業者施工中！

【3月末の見所】

- ① (R2) 道路改良工事(その2)の完成！
- ② 3号橋上部工工事の完成！
- ④ 7号橋下部工工事の完成！
- ⑤ 8号橋下部工工事の完成！
- ⑥ (R3) 道路改良工事の完成！



川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」

(R2)7号橋下部工工事  
グリーン企画建設(株)  
R3.6.16~R4.3.31  
【完成】 ④

(R3)7号橋上部工工事  
東日本コンクリート(株)  
R3.11.11~R4.7.29  
【進捗率 34%】 ⑫

(R3)農道橋下部工工事  
(株)石井土木  
R3.7.30~R4.6.30  
【進捗率 46%】 ⑦



◎(R3)道路改良工事(その3)

(R3)道路改良工事  
星造園土木(株)  
R3.7.13~R4.3.31  
【完成】 ⑥

(R2)8号橋下部工工事  
(株)環境施設  
R3.6.17~R4.3.31  
【完成】 ⑤

(R3)8号橋上部工工事  
ライブディック(株)  
R3.11.11~R4.9.30  
【進捗率 7%】 ⑬

(R3)6号橋下部工工事  
(株)深松組  
R3.6.30~R4.9.30  
【進捗率 63%】 ③

(R2)3号橋上部工工事  
東日本コンクリート(株)  
R3.5.19~R4.3.31  
【完成】 ②

至 県道仙台岩沼線【①R2道路改良工事(その2)の完成！】

【⑥R3道路改良工事の完成！】



③6号橋下部工工事

【④⑤7・8号橋下部工工事の完成！】



付替道路全景(ダム建設位置~8号橋)

(R3)道路改良工事(その2)  
グリーン企画建設(株)  
R3.10.8~R5.1.31  
【進捗率 18%】 ⑧

(R3)ダム仮設工外工事  
奥田建設(株)  
R3.11.5~R5.2.28  
【進捗率 10%】 ⑪



ダム建設位置

(R3)道路改良工事(その3)  
(株)深松組  
R3.10.5~R5.3.24  
【進捗率 17%】 ⑨




付替道路全景(2号橋~3号橋)

(R2)道路改良工事(その2)  
(株)橋本店  
R3.3.9~R4.3.31  
【完成】 ①

(R3)舗装工事  
(株)佐藤渡辺東北支店  
R3.10.12~R5.1.31  
【進捗率 4%】 ⑩

【②3号橋上部工工事の完成！】

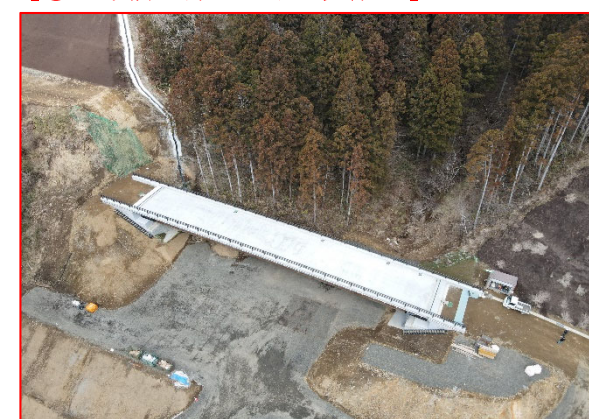

- 付替市道 L=2,010m
- 【施工中】 道路改良工事
- 橋梁工事
- 函渠工工事

川内沢ダム建設事業全体平面図

