
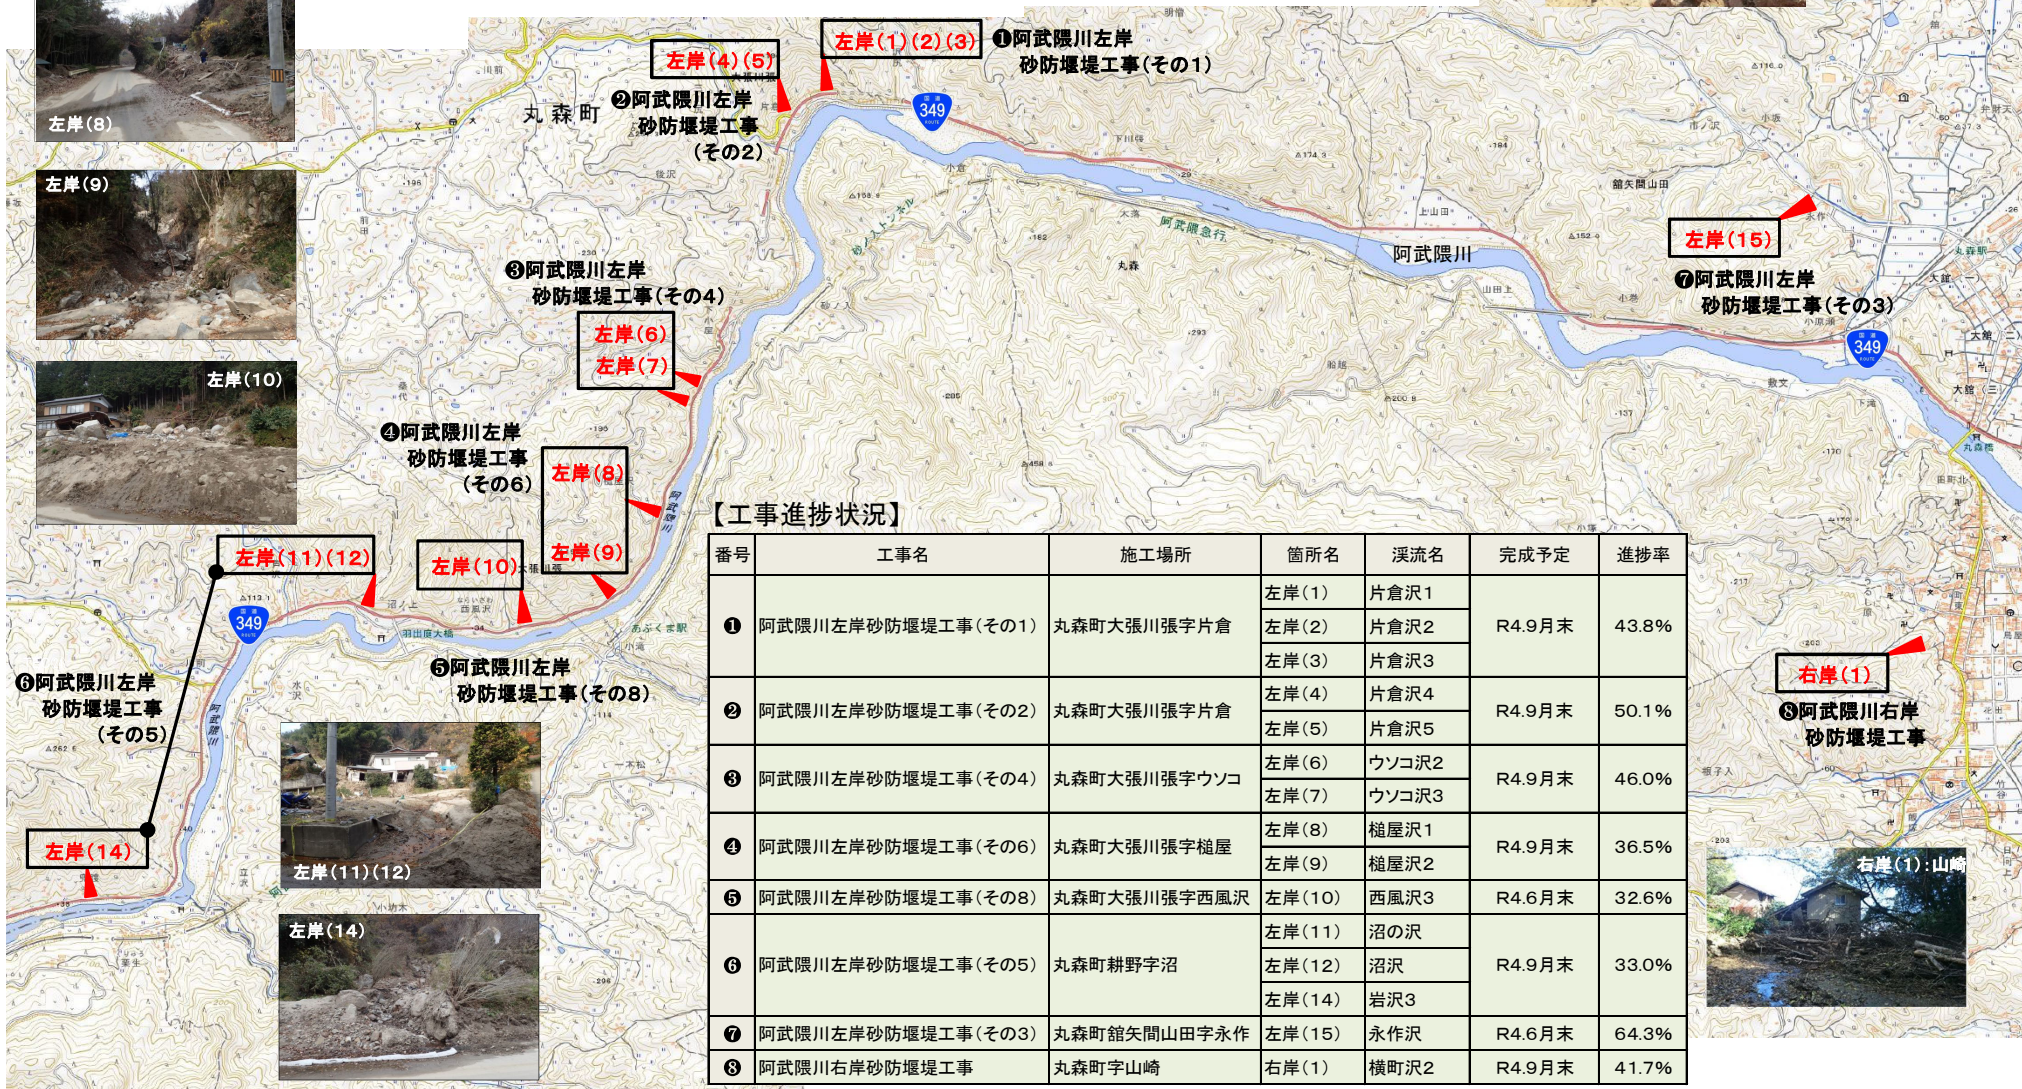


阿武隈川流域 災害関連緊急砂防事業の進捗状況について (1/2)

大河原土木事務所


宮城県実施箇所位置図：15箇所

(令和3年12月末)



【工事進捗状況】

番号	工事名	施工場所	箇所名	溪流名	完成予定	進捗率
①	阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その1)	丸森町大張川張字片倉	左岸(1)	片倉沢1	R4.9月末	43.8%
			左岸(2)	片倉沢2		
			左岸(3)	片倉沢3		
②	阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その2)	丸森町大張川張字片倉	左岸(4)	片倉沢4	R4.9月末	50.1%
			左岸(5)	片倉沢5		
③	阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その4)	丸森町大張川張字ウソコ	左岸(6)	ウソコ沢2	R4.9月末	46.0%
			左岸(7)	ウソコ沢3		
④	阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その6)	丸森町大張川張字榎屋	左岸(8)	榎屋沢1	R4.9月末	36.5%
			左岸(9)	榎屋沢2		
⑤	阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その8)	丸森町大張川張字西風沢	左岸(10)	西風沢3	R4.6月末	32.6%
⑥	阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その5)	丸森町耕野字沼	左岸(11)	沼の沢	R4.9月末	33.0%
			左岸(12)	沼沢		
			左岸(14)	岩沢3		
⑦	阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その3)	丸森町館矢間山田字永作	左岸(15)	永作沢	R4.6月末	64.3%
⑧	阿武隈川右岸砂防堰堤工事	丸森町字山崎	右岸(1)	横町沢2	R4.9月末	41.7%



【令和3年12月の現地状況】

(令和3年12月末)

① 阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その1)



砂防堰堤工 (型枠・コンクリート)

② 阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その2)



砂防堰堤工 (型枠・コンクリート)

③ 阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その4)



砂防堰堤工 (型枠・コンクリート)

④ 阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その6)



砂防堰堤工 (型枠・コンクリート)

⑤ 阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その8)



砂防堰堤工 (型枠・コンクリート)

⑥ 阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その5)



山腹工 (法面整形)

⑦ 阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その3)



砂防堰堤工 (型枠・コンクリート)

⑧ 阿武隈川右岸砂防堰堤工事



砂防堰堤工 (型枠・コンクリート)



砂防堰堤工 (型枠・コンクリート)
