

東部土木復旧・復興だより

第18号

平成28年3月31日発行
宮城県東部土木事務所



1. 災害復旧事業の進捗状況(平成28年3月末現在)

当事務所管内の災害復旧事業の着手率は、道路及び河川関係を合わせて箇所ベースで約97%、金額ベースで約96%となっています。また、完成率は箇所ベースで約86%、金額ベースで約54%となっています。

工種	事業箇所数			着手率	完了率	工種	事業費(億円)			着手率	完了率
	全体	事業中	うち完了				全体	事業中	うち完了		
道路関係	569	549	520	96.5%	91.4%	道路関係	469	315	241	67.2%	51.3%
河川関係	56	55	19	98.2%	33.9%	河川関係	1,268	1,358	688	107.1%	54.3%
合計	625	604	539	96.6%	86.2%	合計	1,737	1,672	929	96.3%	53.5%

2. 事務所復旧・復興トピックス

○釜閘門の現場見学会を開催しました。

平成28年2月5日に北北上運河の釜閘門の現場見学会を開催しました。

釜閘門は、明治・大正期に作られた歴史ある閘門ですが、東日本大震災に伴う津波により甚大な被害を受けました。

この度、本体工事のための仮締め切りにより、川底まで露わになり、確認できる状況になったことから、現場見学会を開催し、地域の皆さまと学識経験者の方々、27名にご参加いただきました。

釜閘門の歴史、被災状況、復旧方針等について説明を行うとともに、間近で見ただけのことから、災害復旧事業についての御理解を深めていただけたと思います。



現場見学の状況



現場見学の状況



川底が露わになった釜閘門の被災状況

○ 安倍総理大臣が石巻市と女川町を視察に訪れました。

平成28年2月21日に安倍総理大臣が管内を視察に訪れ、石巻市の新蛇田地区災害公営住宅や防災集団移転宅地、女川町の女川中心部被災市街地土地区画整理事業などを視察されました。



新蛇田地区災害公営住宅の視察状況



女川中心部被災市街地土地区画整理事業の視察状況

3. 道路・橋梁災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理道路・橋梁の災害箇所569箇所について、これまでに549箇所に着手し、520箇所が完成しました。

○橋梁災害復旧事業の工事状況



【(国)398号新北上大橋 石巻市北上町橋浦地内】



【(主)石巻鮎川線万石橋 石巻市渡波地内】

4. 河川・海岸災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理河川・海岸の災害箇所56箇所について、これまでに55箇所に着手し、19箇所で完成しました。

○河川・海岸災害復旧事業の工事状況



■ 稲井石による護岸整備

【東名運河 東松島市野蒜地内】



【清水田海岸 石巻市清水田浜地内】

5. 復興道路事業関係

当事務所管内の復興道路事業10路線25箇所について、これまでに14箇所です工事に着手しています。

復興交付金事業	路線数	箇所数	事業中箇所数	着手率 (箇所ベース)	全体事業費 (百万円)	着手済事業費 (百万円)	着手率 (金額ベース)
道路整備事業	7	20	11	55.0%	45,484	14,046	30.9%
街路整備事業	3	5	3	60.0%	27,660	6,353	23.0%
合計	10	25	14	56.0%	73,144	20,399	27.9%

○(国)398号 相川復興道路工事の安全祈願祭を行いました。

(国)398号相川復興道路(石巻市北上町十三浜)は相川中地区防災集団移転団地に繋がる、トンネル(延長約222m)や3つの橋梁を含む全長約1.9kmの復興道路事業です。

今回、工事に本格着手するにあたり、平成28年3月7日に、道路改良工事、橋梁下部工工事の3つの工事関係者が合同で安全祈願祭を開催し、工事の安全を祈願しました。



○(主)女川牡鹿線(仮)高白トンネル工事で安全祈願祭を開催しました。



(主)女川牡鹿線の高白道路改良事業(女川町高白地内)において、(仮)高白トンネルの本体掘削に着手するにあたり、平成28年3月24日に安全祈願祭を開催し、関係者約50人が参加して工事の安全を祈願しました。


(仮)高白トンネルは延長約349mで、平成29年度の完成を目指しています。トンネル整備により、車両の安全通行と女川町中心部への時間短縮を図ることを目的としています。

○(主)石巻鮎川線小網倉浜復興道路の道路改良工事に着手しました。

(主)石巻鮎川線小網倉浜復興道路(全体計画延長1,820m)の道路改良工事に着手しました。

本事業により防災集団移転団地へのアクセス道路としての役割をはじめ、災害時の避難路や緊急輸送路として機能するばかりではなく、安全かつ円滑な物流交通、日常生活交通を確保し、地域経済の活性化を図ることを目的に整備を進めるものです。

●位置図

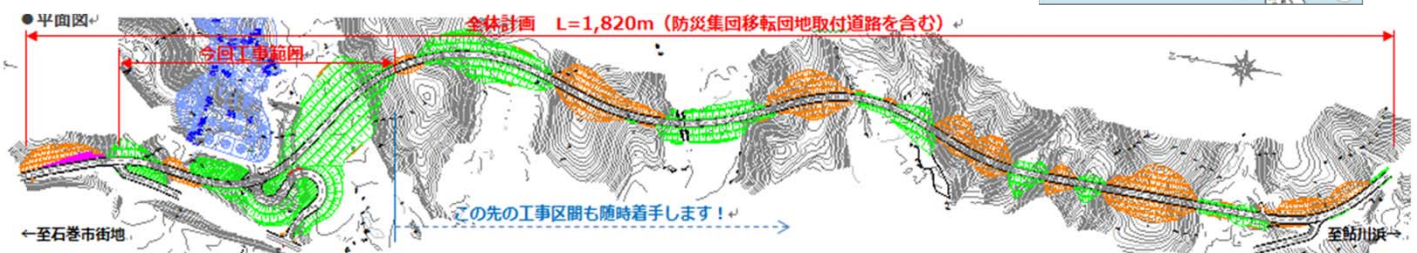

○復興道路工事の施工状況



【(都)大街道石巻港線
施工状況】



【(都)矢本門脇線
(仮)新定川大橋施工状況】



【(主)石巻雄勝線 十八成浜工区
淀川橋施工状況】



【(国)398号 御前浜工区
施工状況】

6. 事業説明会等の開催状況

○平成27年度中に35回の説明会を開催しました。

東部土木事務所では、平成27年度中に計35回の事業や工事、用地補償等に関する説明会を開催するとともに、管内の各市町の主催する住民懇談会などに計20回出席し、事業等の説明を積極的に行ってまいりました。

説明会では、大勢の皆様にご参加いただき、貴重なご意見をいただいております。

これからも、積極的な情報発信に努めるとともに、地域の皆様の声を直接伺える機会である説明会を積極的に開催してまいりますので、忌憚のないご意見をお寄せください。

よろしくお願いいたします。

飯子浜復興道路用地事説明会(H28.2.5)



名振地区事業説明会(H28.3.23)



7. 他県からの応援職員

当事務所には、北海道、秋田県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、石川県、奈良県、鳥取県、高知県、佐賀県、熊本県から27名の応援をいただいていたのですが、3月末の任期を終えて、18名の方が帰県されます。

宮城県への復旧・復興のためにご尽力いただき、本当にありがとうございました。

ご恩に報いるためにも、職員一丸となって、一日も早い復旧・復興を、そして、さらなる「創造的復興」を目指して、頑張っています。



○問い合わせ先 宮城県東部土木事務所 企画担当チーム TEL:0225-95-1151
<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-dbk/> E-mail: et-dbk@pref.miyagi.jp
