

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号	◆D-21-1-1																									
事業名	下水道事業（污水）関連管渠整備事業																									
事業費	総額 45,390 千円（うち国費 36,312 千円） （内訳：工事費 45,390 千円）																									
事業期間	平成 27 年度～令和元年度																									
事業目的	東日本大震災により壊滅的な被害を受けた町中心部において、市街地の再編整備に欠かすことができない污水排水施設の整備を行う。 基幹事業（D-21-1）の対象とならない関連管渠の整備を基幹事業と一体で行うことにより、下水道事業（污水）の効果促進を図る。																									
事業地区	小乗浜地区、石浜地区（別紙に図面添付）																									
事業結果	污水排水施設（管渠）の整備を行った。 整備概要：施工延長 L=557m 小乗浜地区：管渠 L=457m 石浜地区：管渠 L=100m																									
<p>事業の実績に関する評価</p> <p>町中心市街地の復興を目的とした本事業で、基幹事業（D-21-1）及びその他の関連事業と併せて污水排水施設の整備を行うことにより、早期の復興を行うことができた。</p> <p>① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価</p> <p>下水道の定量的な指標である「処理人口普及率」により、事業実施から完了までの推移を記載する。</p> <p>町全体の普及率は順調に伸びており、事業地区（小乗浜地区、石浜地区）においても、H30 年度末には工事が概ね完了し、本事業終了前の段階から下水道の使用が可能となった。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準年月日</th> <th>処理人口普及率 （女川町全体）</th> <th>処理人口普及率 （小乗浜・石浜）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27. 3. 31</td> <td>71.2%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>H28. 3. 31</td> <td>76.6%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>H29. 3. 31</td> <td>78.4%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>H30. 3. 31</td> <td>81.2%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>H31. 3. 31</td> <td>81.7%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>R2. 3. 31</td> <td>87.0%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 処理人口普及率：対象となる人口に対し、下水道が使用できる人口の割合</p> <p>② コストに関する調査・分析・評価</p> <p>本事業の設計・積算は、国や県の積算根拠を用いて実施している。実際に事業に要した事業費 45,390 千円は、当初事業計画 50,000 千円の範囲内であり、当該事業費は妥当であると考える。</p> <table> <tr> <td>事業計画</td> <td>50,000,000 円</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>45,390,000 円</td> </tr> </table>		基準年月日	処理人口普及率 （女川町全体）	処理人口普及率 （小乗浜・石浜）	H27. 3. 31	71.2%	0%	H28. 3. 31	76.6%	0%	H29. 3. 31	78.4%	0%	H30. 3. 31	81.2%	0%	H31. 3. 31	81.7%	100%	R2. 3. 31	87.0%	100%	事業計画	50,000,000 円	事業費	45,390,000 円
基準年月日	処理人口普及率 （女川町全体）	処理人口普及率 （小乗浜・石浜）																								
H27. 3. 31	71.2%	0%																								
H28. 3. 31	76.6%	0%																								
H29. 3. 31	78.4%	0%																								
H30. 3. 31	81.2%	0%																								
H31. 3. 31	81.7%	100%																								
R2. 3. 31	87.0%	100%																								
事業計画	50,000,000 円																									
事業費	45,390,000 円																									

比較増減 △ 4,610,000 円

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

想定した事業期間は平成 29 年 3 月 31 日までの予定であったが、関連する事業の進捗に合わせて施工調整が必要となり、事業期間を令和元年 9 月 30 日に変更して実施した。事業を円滑に進めるためには、やむを得ない延長であったと考える。

<想定した事業期間>

平成 28 年 3 月～平成 29 年 3 月

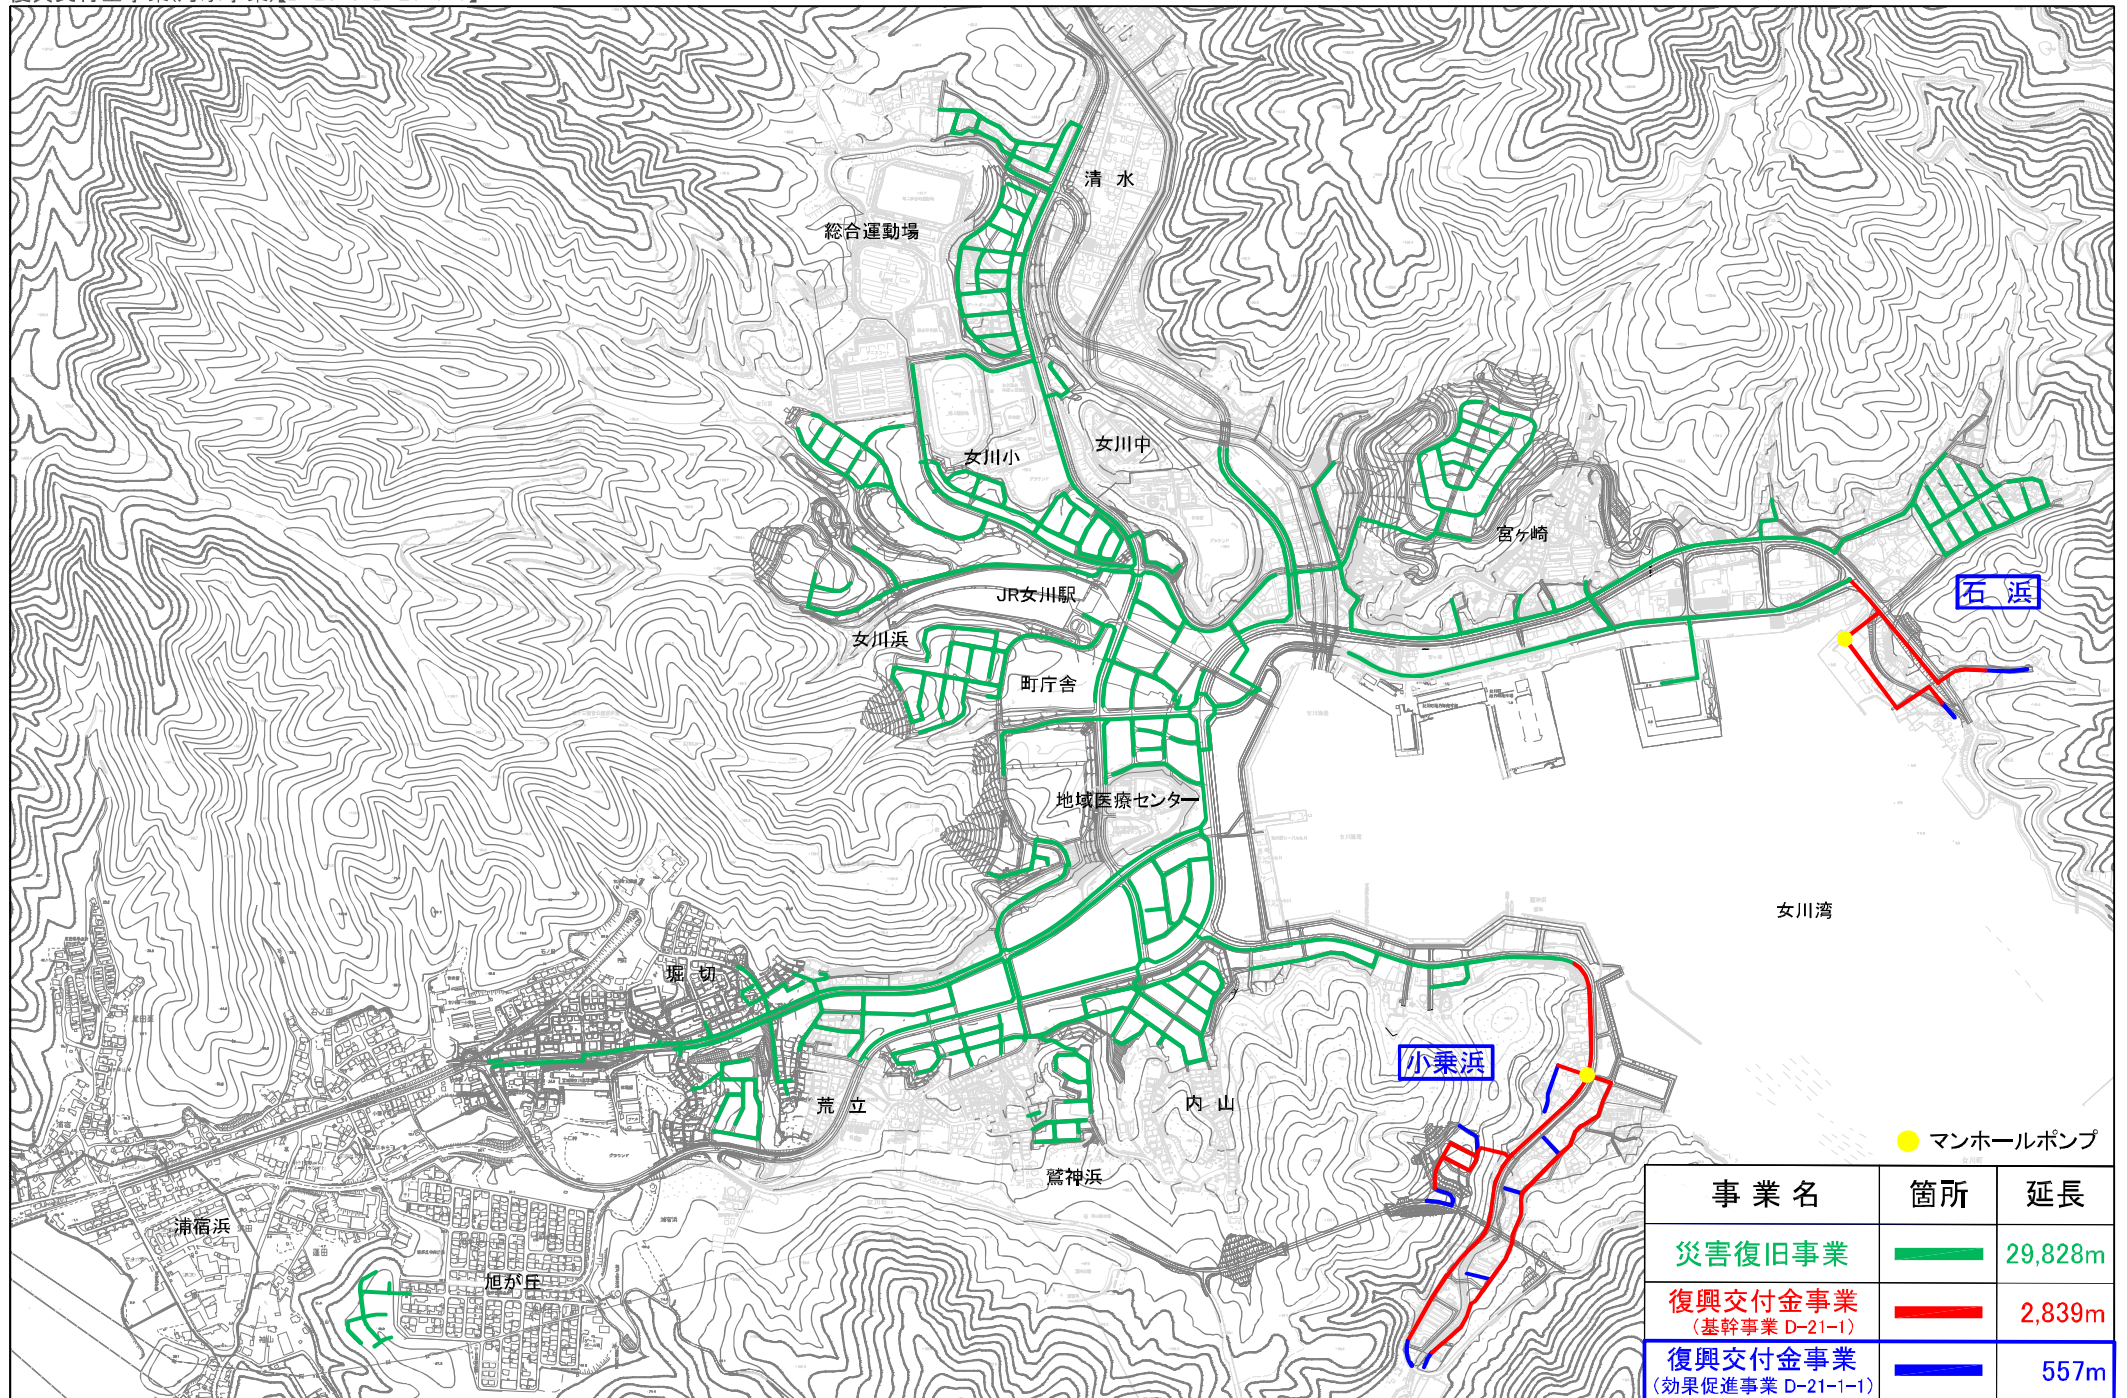
<実際に事業に要した事業期間>

平成 28 年 3 月～令和元年 9 月




事業担当部局

上下水道課 電話番号：0225-54-3131

下水道(汚水)復旧・復興計画平面図



● マンホールポンプ

事業名	箇所	延長
災害復旧事業		29,828m
復興交付金事業 (基幹事業 D-21-1)		2,839m
復興交付金事業 (効果促進事業 D-21-1-1)		557m
