


# V. 地域毎の復旧復興状況



# 1. 地域毎の復旧復興状況

各管内位置図

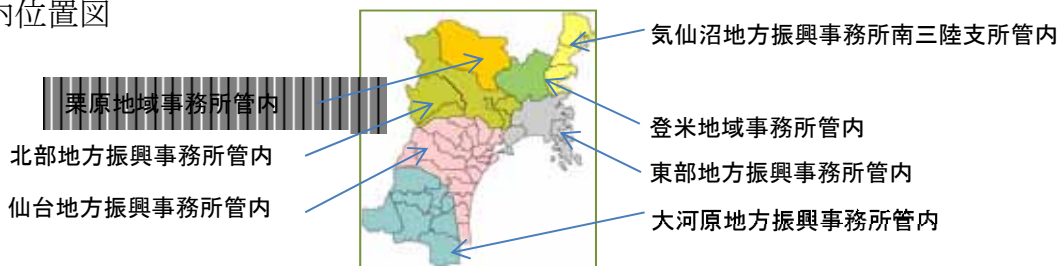

## ■大河原地方振興事務所管内の復旧状況

大河原地方振興事務所管内（以降「大河原管内」とする。）では、地震被害によって農地復旧が 7 地区、農業用施設 94 地区、集落排水施設で 10 地区の災害査定申請があった。いずれの地区も平成 28 年 8 月末現在で全て完了している。



▲写真 県営災害復旧事業 内町下ため池被災前後

なお、大河原管内での国営直轄災害復旧事業の該当はなかった。

## ■仙台地方振興事務所管内の復旧復興状況

仙台地方振興事務所管内（以降「仙台管内」とする。）では、津波被害のあった農用地 8,390ha、うち仙台市の約 2,000ha は直轄農用地災害復旧関連区画整備事業「仙台東地区」で実施し、山元町他 7 地区約 6,130ha は県営や団体営の除塩事業及び農地災害復旧事業を実施している。



▲写真 県営災害復旧事業 花笠第二排水機場復旧前後

また、大郷町でも 1 地区、地震による農地災害復旧事業が実施している。

農業用施設については、606 地区について県営及び団体営により施設災害復旧事業により復旧している。うち、津波被災を受けた 10ha 以上の受益をもつ排水機場については県全体 47 施設うち 20 施設が仙台管内にあり、17 施設で復旧が完了している。

仙台管内の農地海岸については、全長約 17km のうち、亘理・山元町分の 1 地区約 9.5km は、国営直轄災害復旧事業で対応し平成 28 年度をもって完了している。塩釜市と松島町の 54 地区約 7.5km は県で復旧工事を実施している。

集落排水施設については 23 地区で災害査定申請があり、全ての地区が完了している。



▲写真 農地海岸災害復旧事業 本屋敷海岸被災状況  
(左：被災状況 中央・右：復旧完了)

### ■北部地方振興事務所管内の復旧状況

北部地方振興事務所管内（以降「北部管内」とする。）では、地震被害によって農地の被災が7地区、農業用施設111地区、集落排水施設で20地区の災害査定申請があった。平成28年8月末現在で全ての地区が完了している。

北部管内での国営直轄災害復旧事業の該当はなかった。



▲写真 県営災害復旧事業（ため池）烏谷地区  
加美町 被災前後

### ■栗原地域事務所管内の復旧状況

栗原地域事務所管内（以降「栗原管内」とする。）では、地震被害によって農業用施設25地区、国営直轄災害復旧事業が1地区、集落排水施設で4地区の災害査定申請があった。地震による農地の被災について申請は無かった。

平成28年8月末現在で全ての地区が完了している。



▲写真 県営災害復旧事業 秋山頭首工 栗原市  
ゴム堰破損状況

### ■東部地方振興事務所管内の復旧復興状況

東部地方振興事務所管内（以降「東部管内」とする。）では、津波被害のあった農用地3,480ha、120地区は県営や団体営の除塩事業及び農地災害復旧事業を実施している。



▲写真 県営災害復旧事業（農地）奥松島地区 東松島市（左：被災状況 中央：復旧状況 右：復旧後稲刈り）

農業用施設については、災害査定申請した392地区について県営及び団体営により施設災害復旧事業により復旧している。

うち、津波被災を受けた10ha以上の受益をもつ排水機場については県全体47施設うち27施設が東部管内にあり、23施設で復旧が完了している。

東部管内の農地海岸については、全長約3.5km、23地区について県で復旧工事を実施している。



▲写真 県営農地海岸復旧事業 宮戸地区 東松島市（左：被災状況 中央：復旧完了 右：背後地復旧状況）

集落排水施設については9地区で災害査定申請があり、全ての地区が完了している。

### ■登米地域事務所管内の復旧状況

登米地域事務所管内（以降「登米管内」とする。）では、地震被害によって農地復旧が4地区、農業用施設86地区、集落排水施設で18地区の災害査定申請があった。



いずれの地区も平成28年8月末現在で全て完了している。

▲写真 団体営農村生活環境施設復旧事業 砥落地区被災状況 登米市

なお、登米管内での国営直轄災害復旧事業の該当はなかった

### ■気仙沼地方振興事務所南三陸支所管内の復旧復興状況

気仙沼地方振興事務所南三陸支所管内（以降「南三陸管内」とする。）では、津波被害のあった農用地1,130ha、88地区は県営で除塩事業及び農地災害復旧事業を実施している。



▲写真 沖ノ田地区復旧状況 気仙沼市



▲写真 波伝谷地区復旧状況 南三陸町

農業用施設については、災害査定申請した217地区について県営及び団体営により施設災害復旧事業により復旧している。

南三陸管内の農地海岸については、全長約6.7km、26地区について県で復旧工事を実施している。



▲写真 県営農業用施設災害復旧事業 十郎衛門頭首工被災状況 気仙沼市

集落排水施設については1地区で災害査定申請があり、全ての地区が完了している。

なお津波被災農地・農業用施設等の復旧・復興状況については41頁の「農地・農業用施設等の復旧復興のロードマップ」による工程を管理している。このロードマップに基づく平成28年8月末現在の進捗状況は以下のとおりである。なお、市町毎の詳細な状況は118頁を参照。

項目	(復旧面積等) /(復旧対象面積等)	進捗率	項目	(復旧面積等) /(復旧対象面積等)	進捗率
<b>農地 (除塩含む)</b> 復旧対象面積: 約13,000ha ※年度別復旧計画 H23 2,100ha H27 470ha H24 5,200ha H28 180ha H25 3,000ha H29 50ha H26 530ha		<b>約99%</b> 着手面積: 約2,800ha(H23/H26現在) <b>完成</b> <b>約91%</b> 工事完了面積: 約1,800ha(H23/H26現在)	<b>農業用施設 (排水機場)</b> 復旧対象施設: 47施設 ※年度別復旧計画 H23 4施設 H27 - H24 29施設 H27 - H25 11施設 H26 3施設		<b>約94%</b> 着手施設: 44施設(H23/H26現在) <b>完成</b> <b>約92%</b> 工事完了施設: 43施設(H23/H26現在)
<b>津波被災地域における農地整備</b> 復旧復興対象面積: 約4,707ha ※年度別復旧計画 H23 1,771ha H28 401ha H24 1,723ha H29 21ha H27 331ha		<b>約90%</b> 着手面積: 約4,200ha(H23/H26現在) <b>完成</b> <b>約77%</b> 工事完了面積: 約3,820ha(H23/H26現在)	<b>農地海岸</b> 復旧対象海岸: 94箇所 ※年度別復旧計画 H23 4箇所 H27 - H24 34箇所 H28 1箇所 H25 32箇所 H29 16箇所 H26 7箇所		<b>約82%</b> 着手海岸: 79箇所(H23/H26現在) <b>完成</b> <b>約38%</b> 工事完了海岸: 36箇所(H23/H26現在)


## 2. 沿岸地域の復興に関する取組

### (1) 仙台管内

～山元東部地区～

津波により甚大な被害を受けた山元東部地区では、防災集団移転促進事業で町が買い取りした宅地等の移転元地がモザイク状に点在し、有効な土地利用が困難な状況にある。また、その移転元地が放置されると、町で除草作業等の維持管理費がかかってしまう。

こうした問題を解決するため、「土地利用の整序化」に取り組み、公共用地の創設を行うとともに、大区画ほ場整備を通じ競争力のある経営体の育成を行っている。

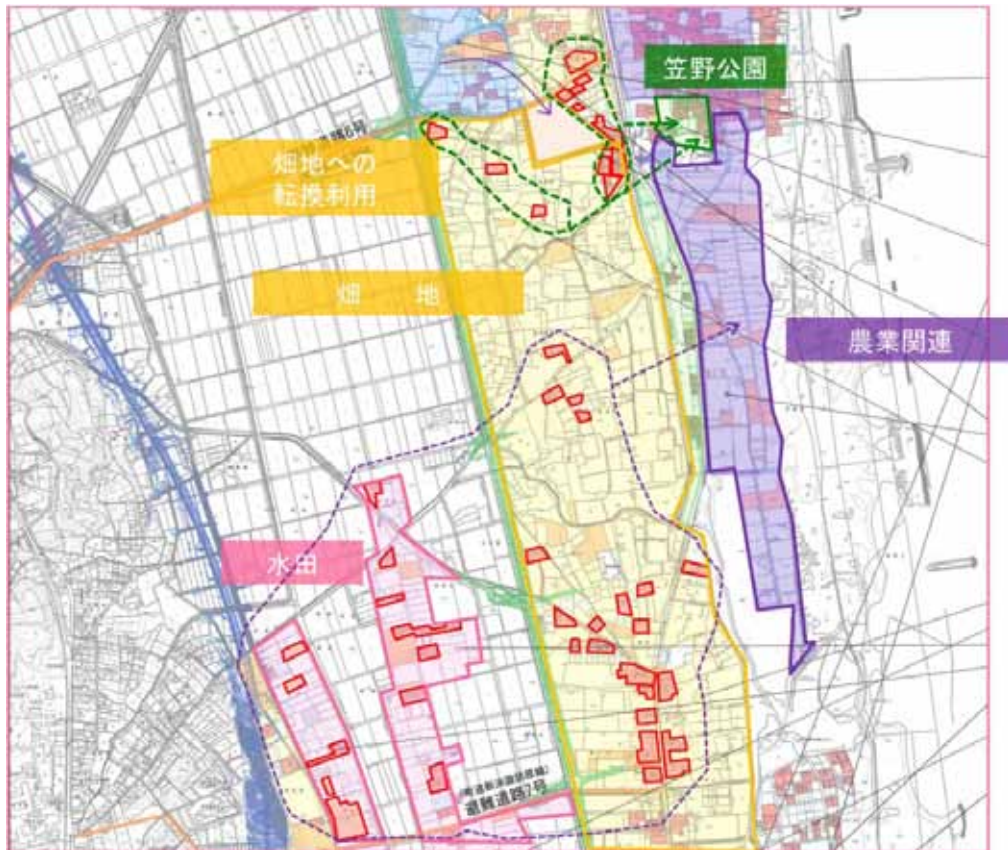

▲図 山元東部地区土地利用計画図(案) (H27 年度時点)



▲写真 山元東部地区 工事着手前(H27 年 9 月)



▲写真 山元東部地区 ジャガイモ収穫の様子(H27 年 7 月)

～七ヶ浜地区～

東北地方太平洋沖地震が発生し、七ヶ浜町においても震度5強を観測した。その後に発生した大津波により七ヶ浜町の全体面積の36.4%が浸水した。

七ヶ浜町においては水田の大部分が被災を受け、農地・農業用施設の災害査定件数は47件で査定額は約12億3千万円に及んだが、宮城県は平成23年度から災害復旧事業に着手し、平成26年度までに約97.9%の復旧工事が完了している。

平成26年度からは復興交付金を活用した農地整備事業により単なる復旧にとどまらない復興事業を進めている。

下田工区の農地（水田）



▲写真 被災状況（H23年6月）



▲写真 工事完了（H27年4月）



▲写真 営農状況（H28年7月）

阿川沼排水機場



▲写真 被災状況（H23年3月）



▲写真 復旧完了（H25年3月）

## (2) 東部管内

### ～大川地区～

大川地区は津波により甚大な被害を受け、県内では最も干陸に時間を要したが、平成27年度までに針岡・長面工区の181haが、平成28年度には長面工区の72haが営農を再開し、また平成31年度までに全域での営農再開を目指している。

このような中、7戸9名の担い手農家有志が立ち上がり、新たに「株式会社宮城リスタ大川」（農業生産法人）を平成25年5月に設立し、210ha規模の農地利用を見込んでおり、農業生産法人を主体として、被災地域農業復興総合支援事業（被災地リース事業）により、石巻市が導入した農業機械・施設を借り受け、土地利用型作物と園芸作物（きく）を組み合わせた複合経営に取り組むなど、新たな地域農業の生産体制構築と雇用の創出につながっている。



▲写真 長面工区一部試験作付け  
(H27年7月)



▲写真 長面工区下流部  
干陸化に向け排水中(H27年7月)



▲写真 株式会社宮城リスタ大川の  
皆様

### ～奥松島地区～

奥松島地区では、東日本大震災の津波により長時間にわたる農地の海没、海水の浸水や洗掘など被害が甚大であったが、被災農地であっても「昔と同じように営農できる」ことを実証し、耕作者の「営農意欲を復活させること」を目的として、平成26年5月に「奥松島地域営農再開実証プロジェクト」を東松島市、JAいしのまき、関係土地改良区、宮城県で立ち上げている。

プロジェクトでは、復旧した農地において、水稻や畑作物の作付けを行い、「目に見えるかたちの復旧・復興」を実証するとともに、地盤沈下により懸念される営農障害の発生原因とメカニズムを探り、農地復旧や区画整理工の対策工法検討の基礎資料とするために、地下水位観測調査を実施している。

奥松島地区では、このプロジェクトの成果を基に、平成28年度に約70haが営農再開を果たし、平成30年度までには全域での営農再開を目指している。

地区内では「農事組合法人奥松島グリーンファーム」や宮戸の農地をイチジク等の果樹園に活用する「奥松島果樹生産組合（宮戸ふるさと水と土保全隊）」の組織が設立されている。



▲写真 奥松島グリーンファームの皆様  
(H27年3月)



▲写真 平成27年度奥松島地域  
営農再開実証プロジェクト報告会



### (3) 南三陸管内

～南三陸地区～

南三陸管内は震災により、農地や農業用機械ばかりでなく農家の生活基盤も失われ、営農再開が円滑に行われるか非常に不安があった。また、管内の多くの地区には土地改良区も存在しないことから、復旧や復興に当たっての推進体制をいかに整備するかが課題であった。

こうした課題に対応するため、土地改良区、JA、宮城県を退職した経験豊富な方々に協力をお願いし、地元調整を担う組織として「事業推進協議会」を設立し、地元をバックアップする体制を整え復旧・復興事業を推進した。

さらに、担い手や将来の営農方向等についても、各工区代表者の方々等と十分に話し合いを重ね新たに「営農組合」及び「農用地利用改善組合」が設立され、復旧復興した農地の営農再開に向けた体制を整えた。



▲写真 西戸川(農用地利用改善組合設立総会)  
(H24年12月)



▲写真 西戸川収穫祭(H27年11月)



▲写真 南三陸地区 ねぎ作付け状況  
(H28年3月)



▲写真 南三陸地区 田植え状況  
(H28年5月)

### 3. 沿岸地域の復興に関する成果

県内の津波被害を受けた6市4町の農業の復旧は、農地については単なる原形復旧ではなく、農地の大区画化などの農業生産基盤の整備や、農地を集積し規模拡大をはかる等、効率的高かつ収益性の高い先進的な農業を目指した復興を進めてきた。

その結果、被災農地13,000haのうち、平成27年度まで92%の11,930haで復旧が完了し稲作を中心とした土地利用型農業が再開されている。震災前は個別経営体が中心で、大豆等の転作は集団で行われていたが、震災後は各地域において担い手が法人を設立し、「東日本大震災復興交付金（被災地域農業復興総合支援事業等）」を活用し、関係市町が整備した大型の施設や農業機械を借り受け、水稻を基幹として施設園芸や転作も組み入れた大規模経営を開始している。

また、イチゴ、キュウリ、トマト等の施設園芸も各地域で大きな被害を受けたが、震災までは個別農家がそれぞれの施設で栽培していたものを、震災後は水稻等と同様に関係市町が整備した大規模な施設園芸団地を借り受け、法人化し生産を再開している。

#### 1) 被災後に法人化された生産組織等

##### ① 亘理普及センター管内 (名取市, 岩沼市, 亘理町, 山元町)

設立年度	経営部門別				計
	水稻	水稻主体	野菜	その他	
H23	0	1	4	1	6
H24	1	3	0	0	4
H25	1	2	0	2	5
H26	1	2	1	0	4
H27	3	0	1	0	4
計	6	8	6	3	23

##### ② 仙台普及センター管内 (仙台市, 七ヶ浜町, 多賀城市, 利府市, 松島町, 塩竈市)

設立年度	経営部門別				計
	水稻	水稻主体	野菜	その他	
H23	1	1	0	0	2
H24	2	1	1	0	4
H25	1	0	1	3	5
H26	4	3	2	4	13
H27	1	0	1	0	2
計	9	5	5	7	26

##### ③ 石巻普及センター管内 (石巻市, 東松島市, 女川町)

設立年度	経営部門別				計
	水稻	水稻主体	野菜	その他	
H23	0	0	2	0	2
H24	2	1	1	3	7
H25	2	6	5	3	16
H26	0	2	2	2	6
H27	0	0	0	2	2
計	4	9	10	10	33

④本吉普及センター管内 (気仙沼市, 南三陸町)

設立年度	経営部門別				計
	水稲	水稲主体	野菜	その他	
H23	0	0	0	3	3
H24	0	0	0	0	0
H25	0	0	0	0	0
H26	0	0	1	0	1
H27	0	0	0	0	0
計	0	0	1	3	4

各管内計

設立年度	経営部門別				計
	水稲	水稲主体	野菜	その他	
H23	1	2	6	4	13
H24	5	5	2	3	15
H25	4	8	6	8	26
H26	5	7	6	6	24
H27	4	0	2	2	8
計	19	22	22	23	86

2) 法人等の活動状況

■ 仙台管内

○農事組合法人「井土生産組合」

仙台東地区において、直轄特定災害復旧事業や直轄災害復旧関連区画整理事業で大区画ほ場整備の完了した約100haの農地で大規模土地利用型農業に取り組んでいる。水稲栽培は直播等の省力化技術を積極的に導入し、また、15haの路地畑はネギなど機械化体系を導入した栽培に取り組んでいる。水稲育苗用ハウスでは隔離床養液栽培によるミニトマトの契約栽培も行っている。

〔経営の内容〕 経営概況：水稲63.5ha，大豆転作5.9ha，ネギ7.8ha，ミニトマト13a 他  
 構成員等：構成員16名（理事8名），常時雇用1名，パート10名  
 主な施設機械の保有状況：トラクター7台，田植機4台，コンバイン3台  
 パイプハウス21棟，園芸用機械 等  
 法人設立：平成25年1月17日

(参考：みやぎ担い手協議会ホームページより)



▲写真 井土生産組合（仙台市）



▲写真 井土地域（仙台市）※



▲写真 井戸生産組合の皆さん（仙台市）



▲写真 井戸地域（仙台市）レタス栽培（仙台市）※

（※参考：平成 27 年 2 月 vol.289/No.11 フォローアップニュースより

東北農政局設計課土地改良技術事務所発行）

### ○亶理町・山元町のいちご産地の復活と復興

壊滅的な被害を受けた亶理町の特産品「いちご」のハウスは、震災前は点在していたが東日本大震災復興交付金等を活用し 3 箇所のいちご団地に集約された。栽培方法も震災前は土耕栽培だったが、効率的な高設養液栽培とした。これまで「水稲+いちご」の複合経営だったものが、経営を分離し水田は土地利用型農業の担い手に集積されている。

〔亶理・山元のいちご産地の取組概要〕

いちご団地整備面積 亶理町 23ha（99 戸）

山元町 17ha（52 戸）



▲写真 大規模イチゴ団地（亶理町）

（JA みやぎ亶理提供）



▲写真 イチゴ生産状況

### ○農事組合法人「玉浦南部生産組合」

震災前は岩沼東部の 3 地区（寺島，蒲崎，新浜）で水稲や大豆の集団転作を行っていたが，営農再開に向けた話し合いの結果，震災前と同規模の水稲と園芸作物の複合経営を目指し法人化し営農を再開している。集落の農地を集積し 100ha 規模で，水稲栽培は湛水・乾田直播，疎植栽培等の省力化技術に取り組んでいる。また，園芸作物については，育苗用ハウスを利用したハウレンソウの周年栽培（育苗期間を除く）や，鉄骨ハウスでのキュウリ栽培を行っている。

〔経営の内容〕経営概況：水稲 60ha，大豆転作 10ha，ハウレンソウ 35a，施設キュウリ 70a

構成員等：構成員 13 名（役員 13 名），パート 10 名

主な施設機械の保有状況：復興交付金で水稻，大豆生産に必要な施設・機械を整備している

法人設立：平成 25 年 2 月 10 日

（参考：みやぎ担い手協議会ホームページより）



▲写真 玉浦南部生産組合（岩沼市）



▲写真 キュウリの収穫選別（岩沼市）

## ■ 石巻管内

### ○株式会社「パルファーム大曲」

大曲地区の農業復興の方策について検討した結果，地区の農地全体を担えるような法人を設立することで合意が得られ，営農を希望する担い手 4 名で株式会社パルファーム大曲を設立した。農地の復旧に伴い，水稻及び大豆で 100ha 規模となり，さらに施設トマトも導入して経営基盤の強化や収益性の向上を図っている。

水稻，転作，園芸の複合型営農を柱とし，交流・加工まで視野に入れた経営を目指している。

〔経営の内容〕 経営概況：水稻 60ha，大豆転作 23ha，施設ミニトマト 50a，露地ネギ 他

構成員等：構成員 3 名（役員 3 名），常時雇用 3 名，パート 7 名

主な施設機械の保有状況：汎用型乾燥調製施設（100ha 規模），格納庫  
育苗ハウス，トラクター 3 台，田植機 2 台  
コンバイン 2 台，乗用管理機 1 台他

法人設立：平成 24 年 12 月 6 日

（参考：みやぎ担い手協議会ホームページより）



▲写真 パルファーム大曲（東松島市）



▲写真 大曲地域（東松島市）大豆播種状況

## ○農業生産法人 「有限会社アグリードなるせ」

組織の成り立ちは、ほ場整備を契機に平成11年6月に農用地利用改善組合を設立したことによるものであるが、水稻、転作大豆、路地野菜等の作物を効率的かつ安定的に経営するため、平成18年に法人化し地域の担い手として取り組んでいた。

大震災により、経営している水田の2/3が浸水し農業用施設や機械も大きな被害を受けたが、営農を再開する事が地域を元気づけるとの信念で、被災直後の1ヶ月後から営農再開のための除塩や瓦礫処理作業も行い、平成23年度は約40haで水稻の作付けを開始した。

営農再開後は、地域の農地を守るため津波被災で離農する農家の農地を集積し、経営規模の拡大をはかるとともに、地域の方々の通年雇用を創出するため、生産した小麦や県産食材を活用したバウムクーヘンの製造・販売（6次産業化）等にも取り組み、経営の安定を図っている。

〔経営の内容〕 経営概況：水稻34ha、大豆転作47ha、麦37ha

野菜6ha（じゃがいも、キャベツ、白菜、トマト）

構成員等：構成員5名（役員5名）、常時雇用9名、パート10名

主な施設機械の保有状況：汎用型乾燥調製施設6基、農産物処理加工施設  
トラクター5台、田植機2台、コンバイン2台  
ポテトハーベスタ1台、無人ヘリ1台他

設 立：平成18年2月2日

（参考：アグリードなるせホームページより <https://agriead.jp/about#philosophy>）



▲写真 鳴瀬地域麦刈取り状況（東松島市）



▲写真 鳴瀬地域（東松島市）キャベツ収穫



▲写真 アグリードなるせ NOBICO



▲写真 バウムクーヘンの製造販売

## ■ 気仙沼管内

### ○気仙沼、南三陸の営農組合

津波被災農地のほ場整備地区が完了した工区では5年ぶりに営農が再開された。再開に当たっては、工区毎の営農組合で営農計画の策定を行い、育苗施設や各種農業機械については復興交付金により整備し、水稻やネギの作付けを開始した。

再開に当たっては、土壌条件の良くないほ場等もあったが、関係機関一丸となって取り組んだ結果、市町の平均収量には満たなかったものの、各工区の水稲収量は300～360kg/10a、在郷工区のネギは3t/10aと営農1年目としては概ね満足の出来る収量が確保できた。

〔営農組合の設立状況〕

#### 気仙沼市

- ①最知工区 最知営農組合、最知機械管理組合
- ②大谷工区 大谷機械管理組合
- ③田の沢工区 田の沢機械利用組合
- ④杉の下工区 杉の下機械管理組合

#### 南三陸町

- ①田表工区 田表機械利用組合
- ②板橋工区 板北機械利用組合
- ③西戸川工区 西戸川営農組合
- ④在郷工区 在郷営農組合
- ⑤泊浜工区 大沼営農組合
- ⑥廻館工区 廻館営農組合



▲写真 最知営農組合設立（気仙沼市）



▲写真 在郷工区（南三陸町）のネギ畑

（参考1：「みやぎ担い手協議会ホームページ」は以下URLより

<http://www.miyagi-agri.com/ninaitekyou/corporation/index.html>）

（参考2：各地域の活動状況写真は、宮城県内各普及センターたより、みやぎの農業法人等から引用）

#### 4 管内市町村毎の災害復旧・復興の取組状況

平成28年8月末現在

### 大河原地方振興事務所管内の災害復旧取組状況

#### 1 地震被害による農地の復旧

市町村	査定地区数	着手地区数							総事業額 (百万円)	着手率 (%)	営農再開 可能 面積 (ha)	完了率 (%)
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降				
白石市	1	1	0	0	0	0	0	0	23	100%	0.78	100%
蔵王町	1	1	0	0	0	0	0	0	4	100%	0.79	100%
川崎町	5	5	0	0	0	0	0	0	9	100%	1.35	100%
合 計	7	7	0	0	0	0	0	0	36	100%	2.92	100%

#### 2 (1) 地震被害による農業用施設の復旧

市町村	査定地区数	着手地区数							総事業額 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降			
白石市	14	14	0	0	0	0	0	0	49	100%	100%
角田市	20	20	0	0	0	0	0	0	108	100%	100%
蔵王町	10	10	0	0	0	0	0	0	113	100%	100%
大河原町	4	4	0	0	0	0	0	0	69	100%	100%
村田町	25	25	0	0	0	0	0	0	73	100%	100%
柴田町	8	8	0	0	0	0	0	0	47	100%	100%
川崎町	9	9	0	0	0	0	0	0	30	100%	100%
丸森町	4	4	0	0	0	0	0	0	14	100%	100%
合 計	94	94	0	0	0	0	0	0	503	100%	100%

#### (2) 農業用施設における工種別の復旧地区数

市町村	農業用施設 工種別内訳					
	頭首工	ため池	揚水機	道路	水路	橋梁
白石市	0	2	1	7	4	0
角田市	0	2	1	0	17	0
蔵王町	0	0	0	9	1	0
大河原町	0	0	0	0	4	0
村田町	0	2	1	20	2	0
柴田町	0	0	0	0	8	0
川崎町	0	2	0	4	3	0
丸森町	0	1	0	2	1	0
合 計	0 箇所	9 箇所	3 箇所	42 箇所	40 箇所	0 箇所



◀ 写真 県営災害復旧事業 内町下ため池  
被災(左)・復旧後(右) (角田市)

#### 3 災害関連農村生活環境施設復旧事業

市町村	査定地区数	査定額 (百万円)	着手地区数						総事業額 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)
			H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)			
白石市	3	55	3	0	0	0	0	0	54	100%	100%
角田市	2	70	2	0	0	0	0	0	68	100%	100%
村田町	1	69	1	0	0	0	0	0	69	100%	100%
丸森町	4	402	4	0	0	0	0	0	379	100%	100%
合 計	10	596	10	0	0	0	0	0	569	100%	100%



# 仙台地方振興事務所 管内の災害復旧・復興取組状況

## 1 農地(除塩含む)

市町村	査定地区数	着手地区数							総事業費(百万円)	着手率(%)	営農再開可能面積(ha)	完了率(%)	津波被災面積(ha)
		H23	H24	H25	H26	H27	H28(予定)	H29以降					
仙台市	4	3	0	1	0	0	0	0	24,753	100%	1,919.7	99%	2,000
名取市	24	11	11	2	0	0	0	0	5,158	100%	1,117.2	77%	1,500
多賀城市	1	1	0	0	0	0	0	0	3	100%	25.7	100%	70
岩沼市	27	8	14	0	2	1	0	2	6,892	93%	894.4	77%	1,170
亘理町	64	27	21	0	8	6	2	0	9,785	100%	1,469.7	70%	2,090
山元町	45	16	22	0	2	4	1	0	9,440	100%	954.7	71%	1,370
塩竈市	1	1	0	0	0	0	0	0	641	100%	4.4	20%	20
松島町	6	3	2	1	0	0	0	0	123	100%	28.7	94%	30
七ヶ浜町	7	7	0	0	0	0	0	0	774	100%	123.1	91%	140
大郷町※	1	1	0	0	0	0	0	0	2	100%	0.1	100%	-
<b>合計</b>	<b>180</b>	<b>78</b>	<b>70</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>57,571</b>	<b>99%</b>	<b>6,537.6</b>	<b>80%</b>	<b>8,390</b>

※大郷町は地震被害による農地復旧地区

### (1) 直轄農用地災害復旧関連区画整備事業 仙台東地区

市町村	地区面積(ha)	着手面積(単位:ha)							総事業費(億円)	着手率(%)	完了率(%)	受益面積(ha)
		H23	H24	H25	H26	H27	H28(予定)	H29以降				
仙台市	2,244				400	530	540	530	316	66%	47%	1,978



▲写真 県営災害復旧事業(農地)下田地区(七ヶ浜町)

## 2 津波被災地域における農地整備

### (1) 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業・復興基盤総合整備事業)

関係市町村	地区名	総事業費(億円)	地区面積(ha)	受益面積(ha)	着手面積	着手率	完了面積	完了率	備考
七ヶ浜町	七ヶ浜	26	143.0	119.0	117.7	99%	117.6	99%	新規
仙台市, 名取市, 岩沼市	名取	126	798.0	646.0	632.4	98%	631.2	98%	新規
名取市, 岩沼市	岩沼	119	770.0	643.0	643.2	100%	525.4	82%	新規
亘理町	亘理	212	1,430.0	1,096.0	906.3	83%	904.5	83%	新規
山元町	山元北部	27	157.0	123.0	122.5	100%	122.2	99%	新規
山元町	山元東部	116	632.0	423.0	239.0	57%	79.9	19%	新規
山元町	磯	14	56.0	40.0	40.1	100%	40.1	100%	新規
岩沼市	玉浦中部	4	113.0	100.0	100.3	100%	100.3	100%	継続
<b>合計</b>	-	<b>644</b>	<b>4,099</b>	<b>3,190</b>	<b>2,802</b>	<b>92%</b>	<b>2,521</b>	<b>85%</b>	

### 3 (1) 農業用施設(排水機場) ロードマップ:津波被災を受けた10ha以上の受益を持つ排水機場

「津波被災を受けた10ha以上の受益を持つ排水機場」47施設うち、仙台管内は災害復旧により対応する20施設がある。

市町村	査定地区数	査定事業費(百万円)	着手地区数							総事業費(百万円)	着手率(%)	完了率(%)	完了地区
			H23	H24	H25	H26	H27	H28(予定)	H29以降				
名取市	1	46	0	0	1	0	0	0	0	54	100%	100%	1
岩沼市	1	158	1	0	0	0	0	0	0	162	100%	100%	1
亘理町	3	1,120	3	0	0	0	0	0	0	1,009	100%	100%	3
山元町	6	1,523	0	6	0	0	0	0	0	1,682	100%	83%	5
松島町	4	92	0	4	0	0	0	0	0	98	100%	100%	4
七ヶ浜町	5	325	4	0	1	0	0	0	0	412	100%	100%	5
<b>合計</b>	<b>20</b>	<b>3,264</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,416</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>19</b>



▲写真 県営災害復旧事業(施設)花笠第二排水機場地区被災(左)・復旧後(右)(山元町)

#### 4 農地海岸の復旧

市町村	査定地区数	査定事業費 (百万円)	着手地区数							総事業額 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)	延長 (km)
			H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降				
亘理町・山元町	1	-	1	0	0	0	0	0	0	163	100%	100%	9.5
塩釜市	42	9,858	5	2	6	10	4	0	15	11,399	64%	62%	4.9
松島町	12	3,448	5	4	3	0	0	0	0	4,458	100%	100%	2.6
合 計	55	13,305	11	6	9	10	4	0	15	16,019	73%	71%	17.0



▲写真 農地海岸災害復旧事業 本屋敷海岸被災状況(左)・復旧後(中、右)(松島町)

#### 5 (1) 農業用施設の復旧(農地関連施設を除く)

この農業用施設は、県営、団体営をふくめ災害査定を受けた農業用施設全体の地区数。ロードマップで管理している「津波被災を受けた10ha以上の受益を持つ排水機場」は内数に含まれている。また、津波被災を受けた農地復旧と併せ行う、農地関連施設は除いたもの。

市町村	査定地区数	着手地区数							総事業費 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降			
柴田町	1	1	0	0	0	0	0	0	90	100%	100%
仙台市	31	18	0	0	3	0	0	10	321	68%	68%
名取市	74	33	7	6	3	0	0	25	802	66%	66%
多賀城市	2	2	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%
岩沼市	67	22	11	0	4	1	0	29	1,102	57%	57%
亘理町	130	38	10	0	11	15	0	56	2,606	57%	57%
山元町	142	85	7	0	6	0	0	44	4,665	69%	63%
塩釜市	2	2	0	0	0	0	0	0	50	100%	100%
松島町	52	28	21	3	0	0	0	0	1,282	100%	100%
七ヶ浜町	33	28	0	3	0	0	1	1	1,204	97%	94%
大和町	8	7	0	0	1	0	0	0	83	100%	100%
大郷町	58	57	0	0	1	0	0	0	396	100%	100%
富谷町	5	5	0	0	0	0	0	0	14	100%	100%
大衡村	1	1	0	0	0	0	0	0	10	100%	100%
合 計	606	327	56	12	29	16	1	165	12,626	73%	79%

#### (2) 農業用施設における工種別の復旧地区数

市町村	農業用施設 工種別内訳					
	頭首工	ため池	揚水機	道路	水路	橋梁
柴田町	1	0	0	0	0	0
仙台市	2	10	1	3	14	1
名取市	0	0	23	23	28	0
多賀城市	0	0	0	2	0	0
岩沼市	0	0	12	26	29	0
亘理町	0	8	19	46	57	0
山元町	1	11	24	41	65	0
塩釜市	0	0	0	1	1	0
松島町	1	10	14	14	13	0
七ヶ浜町	0	2	15	7	9	0
大和町	1	1	3	0	3	0
大郷町	2	22	6	3	25	0
富谷町	0	2	0	0	3	0
大衡村	0	1	0	0	0	0
合 計	8 箇所	67 箇所	117 箇所	166 箇所	247 箇所	1 箇所



▲写真 県営災害復旧事業(施設)不來内排水機場地区(松



▲写真 不來内揚水機吐き出し樋管完成(松島)

(3) 国営事業(直轄災害復旧事業)

名取川地区

市町村	受益面積 (ha)	着手地区数						総事業費 (億円)	着手率 (%)	完了率 (%)	備考	
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)					H29 以降
名取市, 仙台市, 岩沼市	3,165	1							155	100%	100%	排水機場, 防潮樋門, 排水路

(4) 水利施設整備事業, 農地防災事業(震災前からの継続地区)

関係市町村	地区名	総事業費 (億円)	地区面積 (ha)	受益面積 (ha)	着手面積	着手率	完了面積	完了率	備考
亙理町	柴鳥	20	-	881	881	100%	881	100%	排水機場, 排水路
山元町, 亙理町	牛橋	7	-	466	466	100%	466	100%	排水機場

5 災害関連農村生活環境施設復旧事業

市町村	地区数	査定額 (百万円)	着手地区数						総事業額 (百万円)	着手率	完了率	
			H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)				H29 以降
仙台市	16	881	16	0	0	0	0	0	0	1,095	100%	100%
名取市	1	85	1	0	0	0	0	0	0	100	100%	100%
岩沼市	1	116	1	0	0	0	0	0	0	113	100%	100%
山元町	2	425	2	0	0	0	0	0	0	481	100%	100%
松島町	1	6	1	0	0	0	0	0	0	6	100%	100%
大和町	1	15	1	0	0	0	0	0	0	15	100%	100%
大郷町	1	154	1	0	0	0	0	0	0	141	100%	100%
合計	23	1,682	23	0	0	0	0	0	0	1,951		



◀写真 災害関連農村生活環境施設復旧事業 井土地区被災状況(仙台市)

# 北部地方振興事務所管内の災害復旧取組状況

## 1 地震被害による農地の復旧

市町村	査定 地区数	着手地区数							総事業費 (百万円)	着手率 (%)	営農 再開 可能 面積(ha)	完了率 (%)
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降				
大崎市	6	6	0	0	0	0	0	0	23	100%	2.05	100%
加美町	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	0.82	100%
合 計	7	7	0	0	0	0	0	0	25	100%	2.87	100%

## 2 (1) 地震被害による農業用施設の復旧

市町村	査定 地区数	着手地区数							総事業費 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降			
大崎市	80	75	5	0	0	0	0	0	773	100%	100%
色麻町	2	2	0	0	0	0	0	0	16	100%	100%
加美町	7	6	1	0	0	0	0	0	220	100%	100%
涌谷町	10	10	0	0	0	0	0	0	75	100%	100%
美里町	10	10	0	0	0	0	0	0	61	100%	100%
松島町	2	1	1	0	0	0	0	0	61	100%	100%
合 計	111	104	7	0	0	0	0	0	1,207	100%	100%

## (2) 農業用施設における工種別の復旧地区数

市町村	農業用施設 工種別内訳					
	頭首工	ため池	揚水機	道路	水路	橋梁
大崎市	1	22	14	9	34	0
色麻町	0	1	0	0	1	0
加美町	0	2	0	0	5	0
涌谷町	0	1	0	2	7	0
美里町	0	0	2	0	8	0
松島町	0	0	0	0	2	0
合 計	1 箇所	26 箇所	16 箇所	11 箇所	57 箇所	0 箇所



▲写真 県営災害復旧事業(ため池)烏谷地区被災状況(左)・復旧後(右)(加美町)

## 3 災害関連農村生活環境施設復旧事業

市町村	査定 地区数	査定額 (百万円)	着手地区数							総事業額 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)
			H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降			
大崎市	10	553	10	0	0	0	0	0	0	547	100%	100%
色麻町	1	32	1	0	0	0	0	0	0	31	100%	100%
涌谷町	2	225	2	0	0	0	0	0	0	206	100%	100%
美里町	7	85	7	0	0	0	0	0	0	76	100%	100%
合 計	20	895	20	0	0	0	0	0	0	860	100%	100%

# 栗原地域事務所管内の災害復旧・復興取組状況

## 1 地震被害による農地の復旧 栗原管内では該当無し

## 2 (1) 地震被害による農業用施設の復旧

市町村	査定 地区数	着手地区数							総事業額 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降			
大崎市	1	1	0	0	0	0	0	0	2	100%	100%
栗原市	24	24	0	0	0	0	0	0	250	100%	100%
合 計	25	25	0	0	0	0	0	0	252	100%	100%

## (2) 農業用施設における工種別の復旧地区数

市町村	農業用施設 工種別内訳					
	頭首工	ため池	揚水機	道路	水路	橋梁
大崎市	1	0	0	0	0	0
栗原市	2	10	0	8	4	0
合 計	3 箇所	10 箇所	0 箇所	8 箇所	4 箇所	0 箇所



▲写真 県営災害復旧事業 秋山頭首工ゴム堰破損状況(栗原市)

## (3) 国営事業(直轄災害復旧事業)

### 追川上流地区

市町村	受益 面積 (ha)	着手地区数							総事業費 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)	備考
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降				
栗原市	2,162	1							209	100%	100%	PL, 頭首工等

## 3 災害関連農村生活環境施設復旧事業

市町村	査定 地区数	査定額 (百万円)	着手地区数							総事業額 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)
			H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降			
栗原市	4	84	4	0	0	0	0	0	0	78	100%	100%
合 計	4	84	4	0	0	0	0	0	0	78	100%	100%

# 東部地方振興事務所管内の災害復旧・復興取組状況

## 1 農地(除塩含む)

市町村	査定 地区数	着手地区数								総事業費 (百万円)	着手率 (%)	営農再開 可能面積 (ha)	完了率 (%)	津波 被災 面積(ha)
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降						
石巻市	59	15	13	6	7	5	6	7	11,822	88%	1,473.40	81%	2,110	
東松島市	61	30	12	4	4	0	1	10	8,920	84%	1,024.04	76%	1,370	
合 計	120	45	25	10	11	5	7	17	20,742	86%	2,497.44	79%	3,480	



▲写真 県営災害復旧事業(農地)鳴瀬・奥松島地区被災(左)・復旧状況(中)・営農再開(右)(東松島市)

## 2 津波被災地域における農地整備

### (1) 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業・復興基盤総合整備事業)

市町村	地区名	総事業費 (億円)	地区 面積 (ha)	受益 面積 (ha)	着手 面積 (ha)	着手率 (%)	完了 面積	完了率 (%)	備 考
東松島市	西矢本	36	238.0	197.0	196.6	100%	176.6	90%	継続
東松島市	奥松島	40	184.4	141.0	98.3	98%	73.8	52%	新規
石巻市	牡鹿	10	38.1	22.0	22.0	100%	0.0	0%	新規
石巻市	大川	26	477.0	413.0	279.0	68%	253.5	62%	継続
石巻市	北上	24	341.0	294.0	229.5	78%	219.5	75%	継続
石巻市	飯野川	4	360.0	322.0	321.5	100%	321.5	100%	継続
石巻市	三輪田	15	131.0	113.0	113.4	100%	113.0	100%	継続
石巻市	真野大谷地	4	179.0	160.0	160.0	100%	160.0	100%	継続
東松島市	大曲	21	159.0	128.0	127.5	100%	127.5	100%	継続
合計	-	180	2,108	1,790	1,548	94%	1,445	75%	

### 3 (1) 農業用施設(排水機場) ロードマップ:津波被災を受けた10ha以上の受益を持つ排水機場

「津波被災を受けた10ha以上の受益を持つ排水機場」47施設うち、石巻管内は災害復旧により26施設、農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)1施設の計27施設がある。

市町村	査定 地区数	着手地区数								総事業費 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)	完了地区
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降					
石巻市	14	6	4	2	1	0	0	1	2,480	93%	57%	8	
東松島市	12	5	4	3	0	0	0	0	2,166	100%	75%	9	
合 計	26	11	8	5	1	0	0	1	4,646	96%	65%	17	

### (2) 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業(震災前からの継続地区))

市町村	地区名	総事業費 (億円)	地区 面積 (ha)	受益 面積 (ha)	着手率 (%)	完了率 (%)	備 考
東松島市	洲崎	4	-	88	100%	100%	排水機場, 排水路



▲写真 県営災害復旧事業(施設)中下排水機場地区被災(左)・応急復旧(中)・復旧後(右)(東松島市)

#### 4 農地海岸の復旧

市町村	査定 地区数	査定事業費 (百万円)	着手地区数								総事業費 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)	延長 (km)
			H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降					
石巻市	1	25	0	0	0	0	0	0	0	1	58	0%	0%	0.3
東松島市	22	3,736	14	3	5	0	0	0	0	0	7,091	100%	41%	3.2
合 計	23	3,762	14	3	5	0	0	0	0	1	7,149	96%	39%	3.5



▲写真 県営農地海岸復旧事業 宮戸地区被災（左）・復旧後（中）・背後地復旧状況（右）（東松島市）

#### 5 (1) 農業用施設の復旧(農地関連施設を除く)

この農業用施設は、県営、団体営をふくめ災害査定を受けた農業用施設全体の地区数。ロードマップで管理している「津波被災を受けた10ha以上の受益を持つ排水機場」は内数に含まれている。また、津波被災を受けた農地復旧と併せ行う、農地関連施設は除いたもの。

市町村	査定 地区数	着手地区数								総事業費 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降				
石巻市	207	107	23	15	4	9	1	48	6,007	77%	71%	
東松島市	182	90	16	11	1	2	6	56	5,112	69%	68%	
涌谷町	2	1	1	0	0	0	0	0	5	100%	100%	
登米市	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
合 計	392	199	40	26	5	11	7	104	11,125	73%	75%	

#### (2) 農業用施設における工種別の復旧地区数

市町村	農業用施設 工種別内訳					
	頭首工	ため池	揚水機	道路	水路	橋梁
石巻市	0	3	51	49	104	0
東松島市	1	10	42	47	82	0
涌谷町	0	0	1	0	1	0
登米市	0	0	1	0	0	0
合 計	1 箇所	13 箇所	95 箇所	96 箇所	187 箇所	0 箇所



▲写真 県営災害復旧事業(施設)釜谷ため池被災前後(石巻市)

#### (3) 国営事業(直轄災害復旧事業)

河南地区

市町村	受益 面積(ha)	着手地区数								総事業費 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)	備考
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降					
石巻市 東松島市	4,950	1								535	100%	100%	開水路等

定川地区

石巻市 東松島市	635	1								2,775	100%	100%	排水機場、排水路等
-------------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	-------	------	------	-----------

#### 6 災害関連農村生活環境施設復旧事業

市町村	査定 地区数	査定額 (百万円)	着手地区数								総事業額 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)
			H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降				
石巻市	7	612	5	1	1	0	0	0	0	750	100%	100%	
東松島市	2	50	2	0	0	0	0	0	0	48	100%	100%	
合 計	9	662	7	1	1	0	0	0	0	798	100%	100%	



▲写真 団体営農村生活環境施設復旧事業 中道地区被災状況(左)・復旧後(右) (石巻市)

## 登米地域事務所管内の災害復旧取組状況

### 1 地震被害による農地の復旧

市町村	査定 地区数	着手地区数							総事業費 (千円)	着手率 (%)	営農 再開 可能 面積 (ha)	完了率 (%)	津波被災 面積 (ha)
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降					
登米市	4	4	0	0	0	0	0	0	10,800	100%	0.55	100%	-
合 計	4	4	0	0	0	0	0	0	10,800	100%	0.55	100%	-

### 2 (1) 地震被害による農業用施設の復旧

市町村	査定 地区数	着手地区数							総事業額 (千円)	着手率 (%)	完了率 (%)
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降			
登米市	85	79	5	1	0	0	0	0	469,907	100%	100%
涌谷町	1	1	0	0	0	0	0	0	1,077	100%	100%
合 計	86	80	5	1	0	0	0	0	470,984	100%	99%

### (2) 農業用施設における工種別の復旧地区数

市町村	農業用施設 工種別内訳					
	頭首工	ため池	揚水機	道路	水路	橋梁
登米市	0	2	16	1	66	0
涌谷町	0	0	0	0	1	0
合 計	0 箇所	2 箇所	16 箇所	1 箇所	67 箇所	0 箇所

### 3 災害関連農村生活環境施設復旧事業

市町村	査定 地区数	査定額 (百万円)	着手地区数							総事業額 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)
			H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降			
登米市	18	1,335	18	0	0	0	0	0	0	1,448	100%	100%
合 計	18	1,335	18	0	0	0	0	0	0	1,448	100%	100%



▲写真 団体営農村生活環境施設復旧事業 延滞地区被災状況（登米市）

# 気仙沼地方振興事務所南三陸支所管内の災害復旧・復興取組状況

## 1 津波被害による農地の復旧

市町村	査定地区数	着手地区数							総事業費 (百万円)	着手率 (%)	営農再開 可能面積 (ha)	完了率 (%)	津波被災 面積 (ha)	
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降						
気仙沼市	46	6	19	13	6	0	0	0	2	9,847	96%	182.70	35%	670
南三陸町	42	4	19	11	8	0	0	0	0	3,129	100%	150.12	42%	460
合計	88	10	38	24	14	0	0	0	2	12,976	98%	332.82	38%	1,130



▲写真 沖ノ田地区(気仙沼市)



▲写真 波伝谷地(南三陸町)

## 2 津波被災地域における農地整備

(1) 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業・復興基盤総合整備事業)

市町村	地区名	総事業費 (億円)	地区 面積	受益 面積 (ha)	着手 面積 (ha)	着手率 (%)	完了 面積 (ha)	完了率 (%)	備考
気仙沼	気仙沼	26	99.7	57.0	54.9	96%	13.7	24%	新規地区
南三陸	南三陸	31	160.8	87.0	86.5	98%	65.3	75%	新規地区

## 3 (1) 農業用施設(排水機場) ロードマップ:津波被災を受けた10ha以上の受益を持つ排水機場 南三陸管内では該当無し

## 4 農地海岸の復旧

市町村	査定地区数	査定事業費 (百万円)	着手地区数							総事業額 (千円)	着手率 (%)	完了率 (%)	延長 (km)
			H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降				
気仙沼市	12	746	1	6	2	0	1	0	2	816,533	83%	75%	2.9
南三陸町	14	1,424	0	3	1	10	0	0	0	1,621,776	100%	86%	3.8
合計	26	2,170	1	9	3	10	1	0	2	2,438,309	92%	81%	6.7



▲写真 県営農地海岸復旧事業 波伝谷地区被災(左)・復旧後(右)(南三陸町)

## 5 (1) 農業用施設の復旧(農地関連施設を除く)

市町村	査定地区数	着手地区数							総事業額 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)
		H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降			
気仙沼市	117	21	8	12	15	3	3	55	1,069	53%	50%
南三陸町	100	25	8	7	9	4	4	43	745	57%	52%
合計	217	46	16	19	24	7	7	98	1,814	55%	93%

## (2) 農業用施設における工種別の復旧地区数

市町村	農業用施設					
	頭首工	ため池	揚水機	道路	水路	橋梁
気仙沼市	3	0	9	50	55	0
南三陸町	3	0	3	50	42	2
合計	6箇所	0箇所	12箇所	100箇所	97箇所	2箇所



▲写真 県営農業用施設災害復旧事業 十郎衛門頭首工 被災状況(気仙沼市)

## 6 災害関連農村生活環境施設復旧事業

市町村	査定地区数	査定額 (百万円)	着手地区数							総事業額 (百万円)	着手率 (%)	完了率 (%)
			H23	H24	H25	H26	H27	H28 (予定)	H29 以降			
気仙沼市	1	173	1	0	0	0	0	0	0	141	100%	100%
合計	1	173	1	0	0	0	0	0	0	141	100%	100%



▲写真 団体営農村生活環境施設復旧事業 大沢地区被災状況 気仙沼市
