

平成24年度公共事業評価部会の審議結果について

平成25年3月21日

公共事業評価部会

1. 審議対象事業及び事業概要

番号	事業種別	事業名	事業実施箇所	事業採択年度	完成予定年度	事業目的・事業概要	全体事業費(億円)	進捗率(%)
1	ダム	かわうちきわ川内沢ダム建設事業	名取市	H9	H32	川内沢川沿川の洪水防御，既得取水の安定化及び河川環境の保全を図るもの。 重力式コンクリートダム ダム高H=37.0m 堤体積V=44,000m ³	80.0	3.5
2	港湾	石巻港港湾環境整備事業(廃棄物埋立護岸)	石巻市	H9	H33	石巻港内で発生する浚渫土砂及び震災廃棄物を受け入れるため，廃棄物埋立護岸の整備を実施するもの。 護岸延長L=1,437m	74.8	57.4

2. 審議結果(答申概要)

2事業とも、「事業継続」とした県の評価を「妥当」とした。
なお，審議対象事業の実施に関する意見は，以下のとおり。

〔川内沢ダム建設事業〕

今後の設計，建設に当たっては，ダムの構造，規模などについて総合的な検討を行い，治水，利水効果の早期発現を図るとともに，コスト縮減に努めること。また，東北地方太平洋沖地震による地盤沈下等の影響も考慮し，湛水被害の軽減に向け関係機関との調整を十分に行うこと。

〔石巻港港湾環境整備事業(廃棄物埋立護岸)〕

B地区における事業の実施に当たっては，東日本大震災により生じた災害廃棄物及び津波堆積物を早急に処分する必要があることから，各関係機関との調整を十分に行いながら，早期完成に努めること。

3. 部会審議の経過


〔川内沢ダム建設事業〕

平成24年 9月12日 諮問
" 第1回部会 審議
平成24年10月18日 第2回部会 審議及び答申取りまとめ
平成24年11月 7日 答申

〔石巻港港湾環境整備事業(廃棄物埋立護岸)〕

平成24年11月21日 諮問
平成24年12月21日 第3回部会 審議及び現地調査
平成25年 1月18日 第4回部会 審議及び答申取りまとめ
平成25年 1月21日 答申

平成24年度 公共事業再評価対象事業 位置図

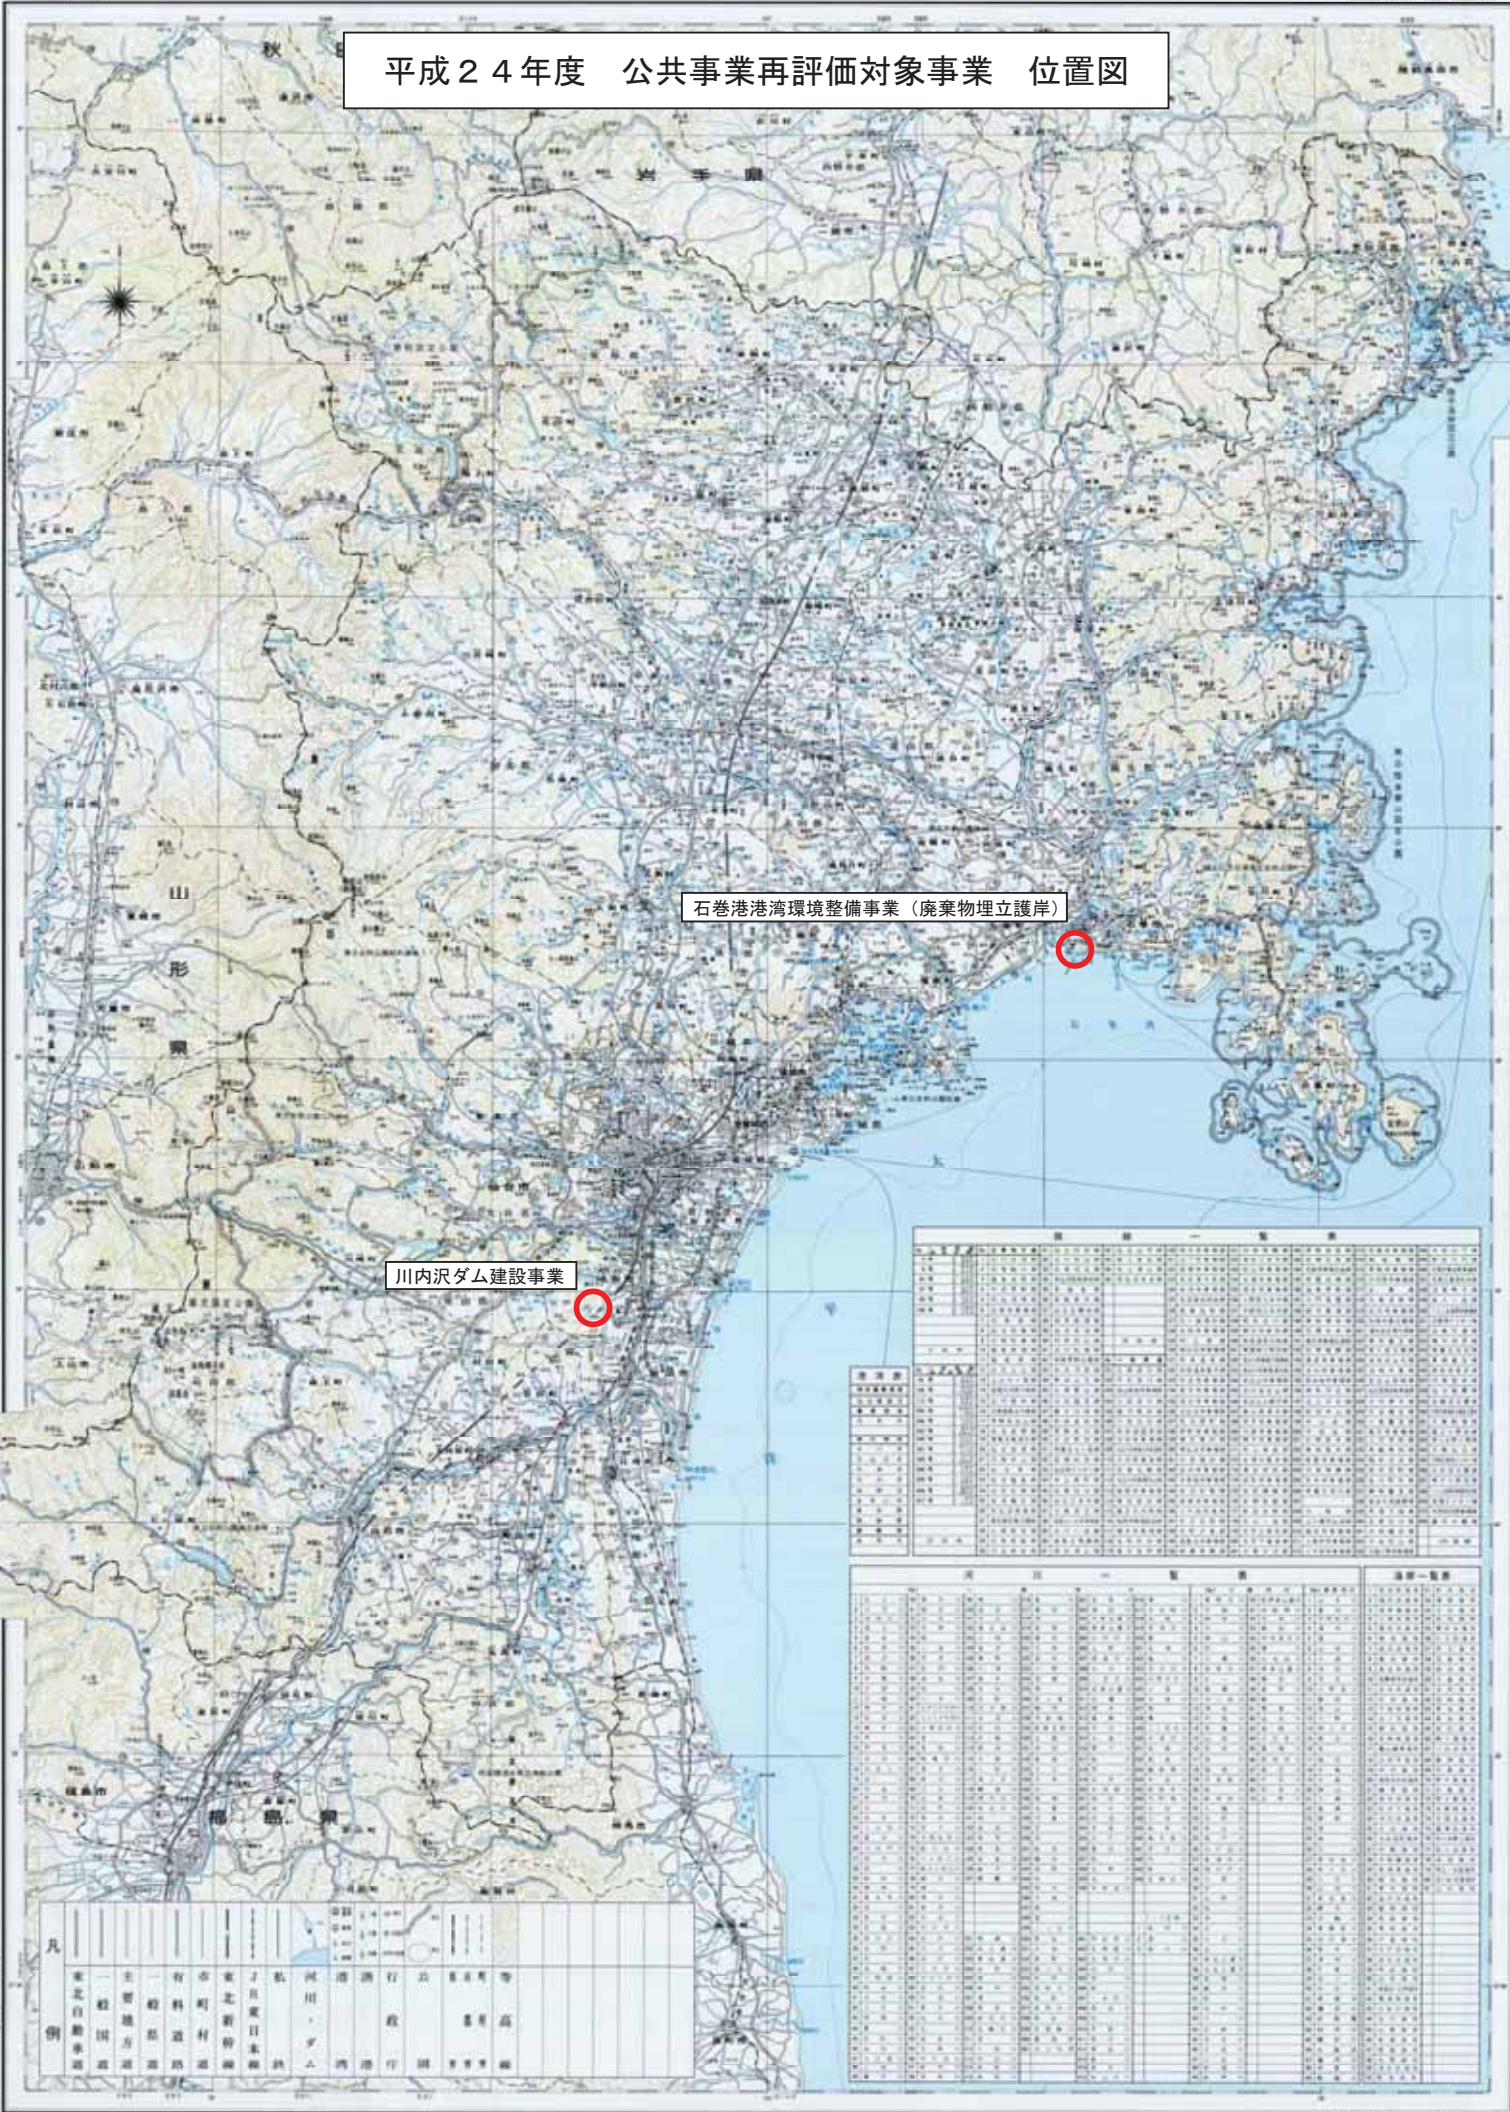

石巻港湾環境整備事業（廃棄物埋立護岸）

川内沢ダム建設事業

事業名		事業内容		事業期間		事業費		事業種別	
1	川内沢ダム建設事業	ダム建設	2010年度～2012年度	約100億円	国土交通省	ダム建設	国土交通省	国土交通省	国土交通省
2	石巻港湾環境整備事業	護岸整備	2010年度～2012年度	約50億円	国土交通省	護岸整備	国土交通省	国土交通省	国土交通省

事業名		事業内容		事業期間		事業費		事業種別	
3	川内沢ダム建設事業	ダム建設	2010年度～2012年度	約100億円	国土交通省	ダム建設	国土交通省	国土交通省	国土交通省
4	石巻港湾環境整備事業	護岸整備	2010年度～2012年度	約50億円	国土交通省	護岸整備	国土交通省	国土交通省	国土交通省

凡例		河川		道路		市町村界		支庁界	
○	ダム	—	河川	—	道路	—	市町村界	—	支庁界
△	ダム建設中	—	河川	—	道路	—	市町村界	—	支庁界
