



仙台塩釜港復興だより 第26号

－ 港湾は人の心も結んでいます －

災害復旧事業の進捗状況

仙台塩釜港湾事務所では、現在、東日本大震災で被災した公共土木施設の災害復旧工事を進めており、令和2年3月末の進捗状況は、箇所ベースで185箇所全てに着手し、うち174箇所(約94%)が完成しています。

このうち、港湾施設については、仙台港区は平成28年度、松島港区は平成30年度に全て完成し、塩釜港区76箇所のうち72箇所(約95%)の復旧が完了しています。

一方、海岸保全施設(防潮堤)については、仙台港区は平成29年度、松島港区は平成30年度に全て完成し、塩釜港区33箇所のうち26箇所(約79%)の復旧が完了しています。

引き続き、残る11施設の1日も早い復旧を目指し事業進捗を図ってまいります。

◎箇所数ベース(令和2年3月末)

(単位:箇所)

施設別	事業箇所数			箇所ベース	
	全体	着手済	うち完了	着手率(%)	完了率(%)
港湾施設	130	130	126	100	97
海岸保全施設	45	45	38	100	84
公園・緑地等	10	10	10	100	100
合計	185	185	174	100	94

◎事業費ベース(令和2年3月末)

(単位:億円)

施設別	事業費			金額ベース	
	全体	着手済	うち完了	着手率(%)	完了率(%)
港湾施設	188	188	183	100	97
海岸保全施設	161	161	134	100	84
公園・緑地等	8	8	8	100	100
合計	357	357	299	100	84

※事業費は令和元年災害再調査額含み

○仙台港区

◎箇所数ベース(平成29年度までに全て完成)

災害復旧事業の進捗状況(仙台港区)			
進捗状況	・港湾施設災:37件(完了)	・海岸施設災:3件(完了)	・環境関連災:9件(完了)

○松島港区

◎箇所数ベース(平成30年度までに全て完成)

災害復旧事業の進捗状況(松島港区)	
進捗状況	・港湾施設災:17件(完了) ・海岸施設災:9件(完了)

○塩釜港区

◎箇所数ベース(令和2年3月末)

災害復旧事業の進捗状況(塩釜港区)				
進捗 状況	・港湾施設災: 76件 着手: 76箇所, 完了: 72箇所 (100%) (95%)		・海岸施設災: 33件 着手: 33箇所, 完了: 26箇所 (100%) (79%)	
	・環境関連災: 1件(完了)			

要害浦胸壁(陸閘)災害復旧外工事(七ヶ浜町東宮地内)

[着手前]



[完成]



代ヶ崎清水防潮堤(陸閘)外災害復旧工事(七ヶ浜町代ヶ崎浜地内)

[着手前]



[完成]



石浜防潮堤外工事(塩竈市桂島地内)

[着手前]



[完成]



毛無崎胸壁外災害復旧工事(塩竈市野々島地内)

[着手前]



[完成]



吉田花洲浜防潮堤(陸閘)災害復旧工事(その2)(七ヶ浜町花洲浜地内)

[着手前]



[完成]



小浜(B)防波堤消波ブロック設置工事(その3)(七ヶ浜町花洲浜地内)

[着手前]



[完成]



七ヶ浜2エリア(東宮浜)自動化陸閘(七ヶ浜町東宮浜地内)

[被制御局(上屋)]



[電源切替盤]



[非常用発電機]



七ヶ浜3エリア(小友浜)電動化陸閘(七ヶ浜町小友浜地内)

[制御盤及び分電盤]




復興事業（新規防潮堤整備等）の進捗状況

当事務所管内では、災害復旧と併せて復興事業により新たな防潮堤の整備を進めています。

仙台港区では、港湾内の貨物などが津波により港湾背後に流出することを防止するため津波漂流物対策施設工事を臨港道路の中央幹線や北幹線で実施しているほか、中野・中野南・栄・向洋地区において防潮堤工事などを進めています。

また、塩釜港区では、貞山・北浜地区や浦戸諸島の桂島・寒風沢島等において、防潮堤や水門などの工事を進めています。

令和2年度は、宮城県震災復興計画の10年目・最終年度となることから、引き続き、災害復旧及び復興事業の完遂に向け工事進捗を図ってまいります。

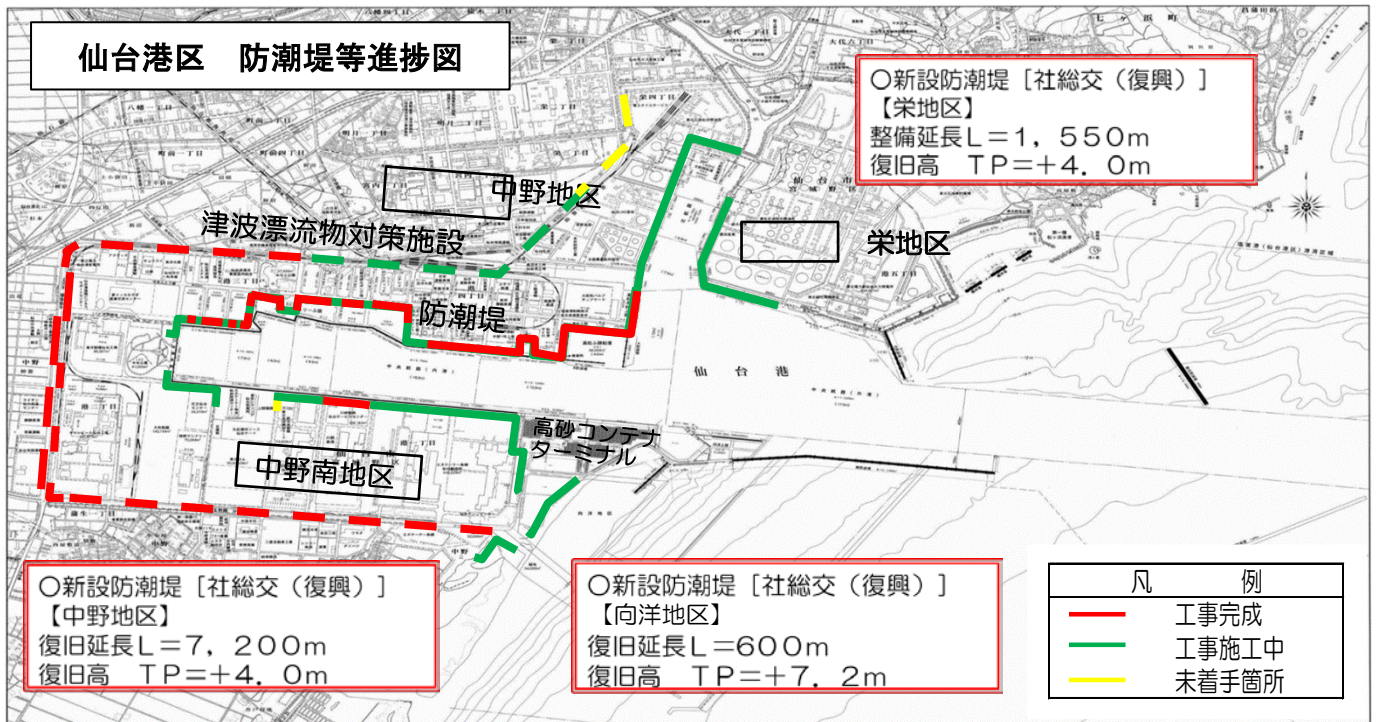


◎延長ベース(令和2年3月末)

港区	施設	全体	進捗状況			着手率(%)	完了率(%)
			着手済	完了	未着手		
港区全体	防潮堤(km)	14.4	14.4 (11.1)	7.4 (5.1)	(5.6)	100 (77)	51 (35)
	漂流物対策施設(km)	5.1	4.5 (3.6)	3.6 (3.6)	0.6 (1.5)	88 (71)	71 (71)
仙台港区	防潮堤(km)	9.2	9.2 (5.9)	2.6 (2.1)	(5.6)	100 (64)	28 (23)
	漂流物対策施設(km)	5.1	4.5 (3.6)	3.6 (3.6)	0.6 (1.5)	88 (71)	71 (71)
塩釜港区	防潮堤(km)	5.1	5.1 (5.1)	4.7 (2.9)	—	100 (100)	92 (57)
松島港区	防潮堤(km)	0.1	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)		100 (100)	100 (100)

※()内は令和元年9月末

仙台港区高砂コンテナターミナル拡張事業の進捗状況

R元(速報値) : 289,000TEU[10%増]
5年連続最高記録更新!!

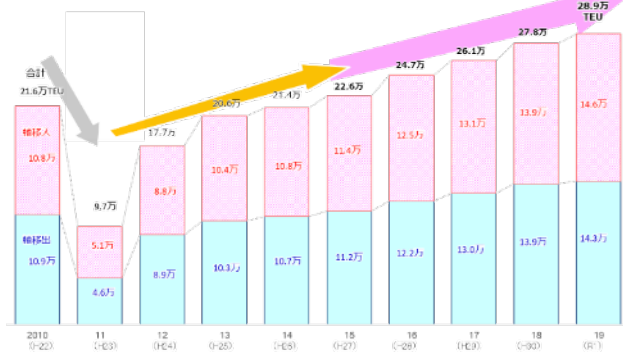



令和元年のコンテナ取扱貨物は28万9千TEU(※)を記録し、平成23年は東日本大震災の影響等により取扱量が大幅に減少したものの、翌年からは順調に回復し5年連続で過去最高を更新しました。

※「TEU」: 長さ20フィートコンテナ1本を1TEUとしてカウント。40フィートコンテナは2TEUとなる。コンテナ取扱量の単位 (Twenty-foot Equivalent Unit)。



高砂 CT 完成予想図

一方、コンテナ貨物増加に伴うコンテナヤードの狭隘化、セミトレーラのゲート待ちによる臨港道路の渋滞などの問題も発生しております。これらに対応するため、現在、令和3年度の完成を目指し高砂コンテナターミナル拡張工事(21ha→約27ha)を進めています。

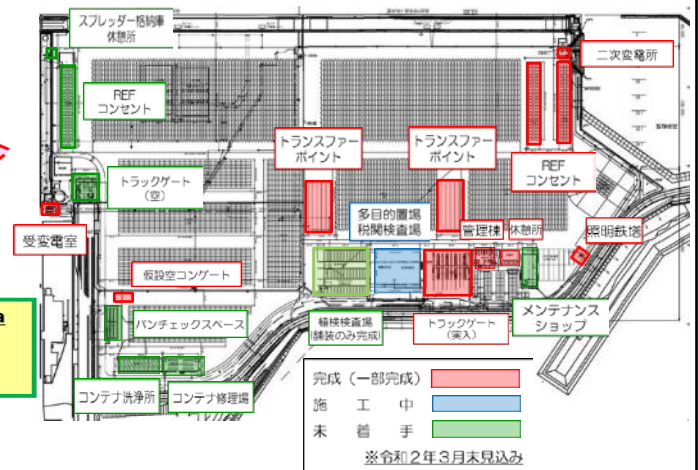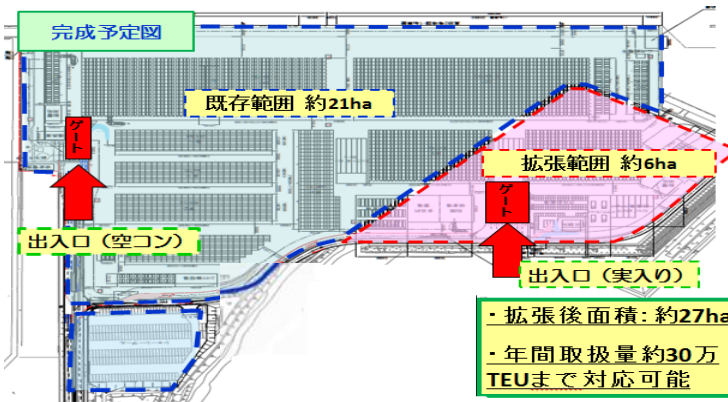

令和2年3月末のコンテナターミナルの進捗状況は、事業費ベースで約82%となっております。トラックゲート及び門型放射能測定装置等が完成したことから、令和2年4月にゲート切替を実施する予定です。

拡張工事の早期完成を目指し、引き続き、多目的置場、植検検査場などの工事進捗を図ってまいります。



管理棟(完成)



トラックゲート(完成)



門型放射能測定装置(完成)

仙台港クルーズ船入港予定（令和2年）

令和2年のクルーズ船入港予定は以下のとおりです。

なお、天候及び運行スケジュールなどの諸事情により変更となることがありますので、ご了承ください。

月 日	入港時間	出航時間	船 名	ふ 頭 名
7月16日（木）	13時00分	15時00分	にっぽん丸	高松2号ふ頭
7月21日（火）	9時00分	15時00分	[国内クルーズ]	
8月29日（土）	11時30分	17時00分	ぱしふいっくびいなす	
9月1日（火）	14時00分	14時00分	[国内クルーズ]	
10月24日（土）	7時00分	(27日)17時00分	レガッタ [外航クルーズ]	
11月1日（日）	13時00分	21時30分	飛鳥II [国内クルーズ]	



船名	総トン数	全長	全幅	喫水
レガッタ	30,277 t	181m	25.46m	5.83m
乗客定員	乗員数	船社	船籍	
684名	400名	オーシャニア・クルーズ	MH	

仙台港区「栄船だまり」ネーミングライツスポンサー決定

栄船だまりのネーミングライツ(港湾施設への愛称を命名する権利)

スポンサーが決定し契約締結をしました。

[概要]

企業名：宮城マリンサービス株式会社

契約期間：令和元年12月25日から令和7年3月31日まで



愛称：宮城マリンタグボートステーション仙台

対象施設：栄船だまり（防波堤及び岸壁を含む施設の総称）

特典：港湾施設や仙台塩釜港湾事務所作成パンフレット等への愛称表示



[愛称表示状況]

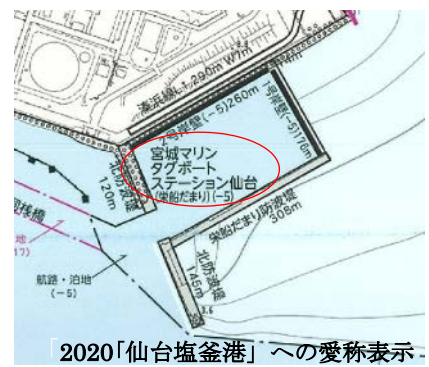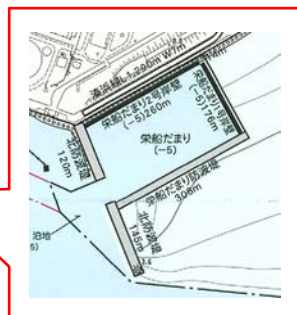

「2020「仙台塩釜港」への愛称表示」

防潮堤（陸閘）の整備状況

当事務所管内では、災害復旧及び復興事業による防潮堤工事に併せ、道路や通路などに陸閘157基を設置する工事を進めています。

令和2年3月末の整備状況は、陸閘157基のうち67基(平成30年度15基、令和元年度52基)が完成し約43%〔県管理(直営)が7基、管理委託が30基、自動化陸閘が20基〕の進捗率となっています。

また、3月末時点において、約30%〔県管理が7基、管理委託が40基〕にあたる計47基の陸閘運用を開始しました。

残る90基の陸閘についても、早期の運用開始に向け、引き続き整備に取り組んでまいります。

○陸閘設置箇所（全体計画）

(単位：基)

	県管理(※ ₁)	自動化陸閘	管理委託	合計
仙台	0	21	32	53
塩釜	6	20	31	57
七ヶ浜	0	10	22	32
松島	1	0	14	15
合計	7	51	99	157
割合	4%	33%	63%	100%

※₁：常時閉鎖陸閘で必要に応じ県が開閉作業を実施するもの

○令和2年3月末の整備状況

(単位：基)

	平成30年度迄	令和元年度	令和2年度(予定)	合計
県管理(※ ₁)	1	6	0	7
自動化陸閘	0	20	31	51
管理委託	14	26	59	99
合計	15	52	90	157
累計	15	67	157	-
進捗率	10%	43%	100%	-

※₁：常時閉鎖陸閘で必要に応じ県が開閉作業を実施するもの

○令和2年3月末での運用状況

(単位：基)

	平成30年度迄	令和元年度	令和2年度(予定)	合計
県管理(※ ₁)	1	6	0	7
自動化陸閘	0	0	51	51
管理委託	14	26	59	99
合計	15	32	110	157
累計	15	47	157	-
進捗率	10%	30%	100%	-

※₁：常時閉鎖陸閘で必要に応じ県が開閉作業を実施するもの

編集事務局

宮城県仙台塩釜港湾事務所 企画担当チーム

〒983-0001 仙台市宮城野区港三丁目1-3 仙台港国際ビジネスサポートセンター5階

TEL：022-254-3131 FAX：022-254-3136

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgkown E-mail：sdsgkown@pref.miyagi.lg.jp
