


第3回公共事業評価部会 河川事業に係る追加説明資料


H20.8.29

土木部 河川課

土木行政推進計画(河川・ダム・海岸事業)

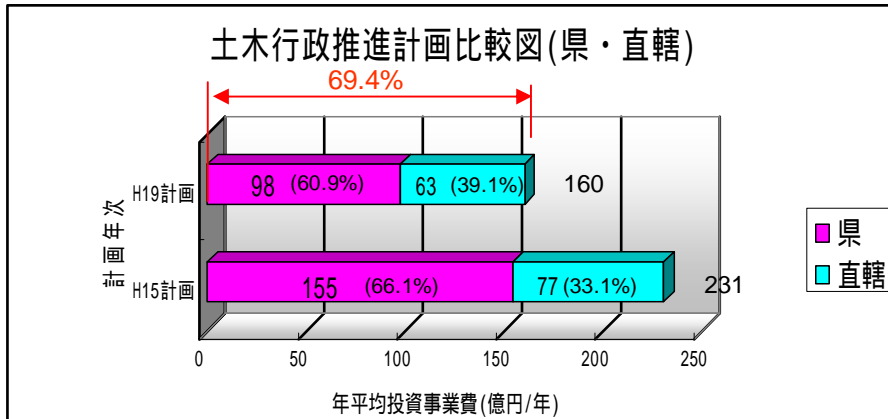


新土木行政推進計画全体の年平均投資額は、現計画の約70%

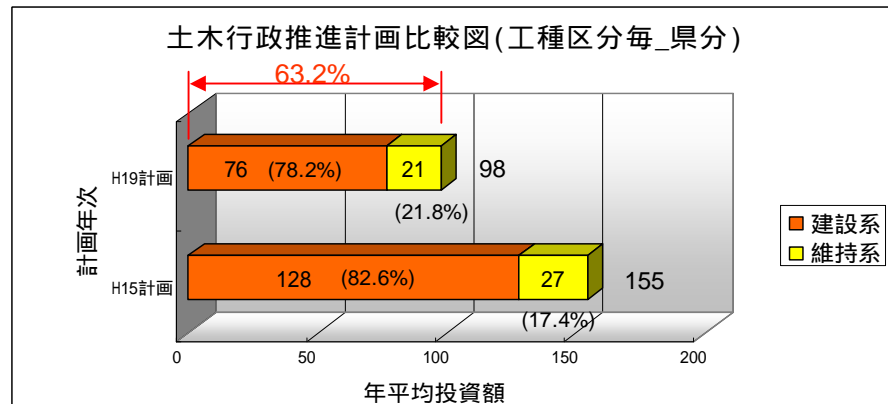

新土木行政推進計画(県分)の年平均投資額は、現計画の約63%

維持管理系(更新費含む)へシフト(約17% 約22%)

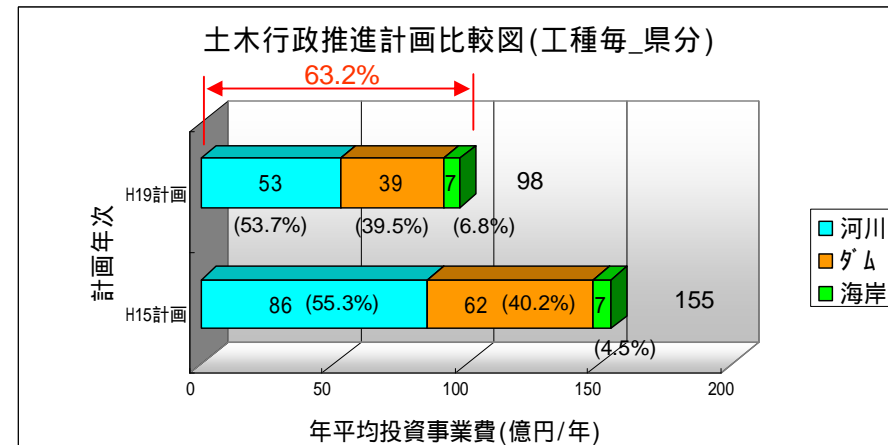

事業区分では、宮城県沖地震津波対策や侵食対策等の海岸事業を増(約5% 約7%)

土木行政推進計画(河川・ダム・海岸事業)

【基本方針】

土木行政推進計画「見える川づくり10箇年計画(H20.3月策定)」に基づく
河川(箇所)・区間の重点化

- ◆治水安全度向上に高い効果が期待できる建設ダム事業に重点投資
・長沼ダム及び払川ダム建設事業の推進(H24完成予定)
- ◆人口・資産が集積する大規模河川や都市部河川の重点整備
・平成24年度完成予定の長沼ダムと歩調を合わせた迫川の整備推進
・川内沢川緊急対策特定区間(H24完成予定),
七北田川(蒲生工区H20完成予定),大川(本町橋架換H23完成予定)等
- ◆水害常襲河川の安全度向上
・白石川(平家川),田尻川(百々川・佐賀川),南沢川,皿貝川等
「宮城県沖大規模地震津波高潮対策」の推進
・鹿折川(H24完成予定),高城川
・河川防潮水門(三陸南沿岸13水門)の遠隔操作化(H20完成予定)
「県の富県戦略」を支援する治水施設の整備推進
・竹林川(明通川防災調整池)の整備推進(H20完成予定)

なお,土木行政推進計画においては河川名のみならず重点整備する地区名(区間)も明示

平成20年度公共事業再評価対象事業の概要

1. 実施中の事業 優先度の高い事業として重点的に実施しているもの

◆「見える川づくり10カ年計画」に基づく重点事業

- ・長沼ダム(平成24年度完成), 迫川, 大川, 七北田川
- ・白石川(平家川), 田尻川(百々川・佐賀川)

◆土木行政推進計画に位置づけられている事業

- ・長沼川, 荒川, 竹林川, 高城川, 砂押川, 鹿折川, 坂元川, 出来川

2. 休止中の事業 休止理由が解消次第事業再開予定のもの

全て河川事業として必要かつ重要な事業であるが, 以下のような理由で休止している
河川事業全体の予算額の抑制に伴い休止している河川(齊川, 雉子尾川, 西川)
下流整備による流下能力増を待って事業再開予定の河川(芋塚川)
他事業との調整のために時期を調整中の河川(善川, 梅田川, 富士川)
用地が解決次第再開予定の河川(鳴瀬川)

平成20年度 河川事業再評価実施箇所表

事業区分	番号	事業名	河川名	箇所名	事業着手	完成予定	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31		
事業実施中	5	広域基幹	迫川	迫川	S15	H50	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	H15は長沼ダムと一括して詳細審議
休止中	6	広域基幹	迫川	芋埴川	S40	H30	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	再	完		平成29年度再開予定。		
事業実施中	7	広域基幹	迫川	熊川	S55	H30	休	休	再	実	実	休	休	再	実	実	実	実	休	休	休	休	休	休	休	再	完			
事業実施中	8	広域基幹	迫川	長沼川	S61	H40	実	実	実	実	実	実	休	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	
事業実施中	9	広域基幹	迫川	荒川	S60	H40	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	休	休	休	休	再	実	実		
事業実施中	22	総流防	坂元川		S47	H40	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	H15は坂元道路と一括して詳細審議
事業実施中	10	広域基幹	田尻川	田尻川本川、佐賀川、百々川	S43	H50	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	
事業実施中	13	広域基幹	竹林川		S55	H49	休	休	休	休	休	休	休	休	休	実	実	休	休	休	休	休	休	休	休	再	実	実		
事業実施中	14	広域基幹	白石川	白石川、平家川、天津沢川	S19	H40	実	実	実	実	実	実	実	休	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	支川平家川整備優先
事業実施中	16	広域基幹	大川		S50	H45	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	
事業実施中	17	広域一般	高城川		S57	H50	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	
事業実施中	18	都市基幹	七北田川	七北田川	S24	H40	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	
事業実施中	20	都市基幹	砂押川		S25	H30	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	休	休	休	休	休	休	休	休	再	実	実		
事業実施中	21	地震高潮	鹿折川		S55	H24	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	完									
事業実施中	23	総流防	出来川		S63	H40	実	実	休	休	再	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	
休止中	11	広域基幹	鳴瀬川		S21	H31	実	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	再	実	平成31年度再開予定。	
休止中	12	広域基幹	善川		S33	H35	実	実	休	実	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	再	実	実	平成29年度再開予定。	
休止中	15	広域基幹	白石川	齋川	S54	H40	実	実	実	実	実	実	実	実	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	再	実	実	平成29年度再開予定。	
休止中	19	都市基幹	七北田川	梅田川	H3	H40	実	実	実	実	実	休	休	実	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	再	実	実	藤川工区含む、平成29年度再開予定。	
休止中	24	総流防	雉子尾川		S35	H40	実	実	実	実	実	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	再	実	実	平成29年度再開予定。	
休止中	25	総流防	富士川		S37	H40	実	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	再	実	実	平成29年度再開予定。	
休止中	26	総流防	西川		H1	H35	実	実	実	実	休	休	実	実	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	再	実	実	平成29年度再開予定。	
			評価事業数				22	0	0	0	0	16	0	0	0	0	22										19			

:再評価済
 :再々評価対象であるが事業休止につき審議対象としなかった事業
 :再々評価予定
 :再々評価予定
 新:当年度新規
 完:当年度完成
 休:当年度休工
 中:当年度以降中止
 再:当年度事業再開

再評価対象事業 22事業

事業実施中 14
 休止中 8

休止事業については5年以内に再開予定なし。
