



「名蓋川復旧だより」は、地域住民の皆様へ復旧事業に関する情報をお伝えするものです。

## ○事業概要・復旧方針

名蓋川は、平成27年関東・東北豪雨及び令和元年東日本台風、そして令和4年7月の大雨により堤防が決壊し、矢目地区を中心に大規模な浸水被害を受けました。このため、これまで進めてきた堤防補強の内容を見直し、抜本的な対策を図るため、災害復旧助成事業の採択を受け、多田川合流点から国道347号までの4.1kmについて河川整備を行います。


## 【 工事説明会を開催しました（令和8年3月18日、19日） 】

### 【説明内容】

- ・ 工事の進捗状況と今後の予定について、地域の皆様にご説明いたしました。
- ・ 令和6年5月の着工式から約2年、皆様のご協力により、工事は着実に進捗しており、一部区間において、堤防や護岸が完成するなど、令和4年と比較すると、治水安全度は向上しています。
- ・ 令和7年9月に上部工工事の請負者が破産したため、県では10月に契約を解除しました。その後、速やかに新たな業者と2月に契約を結び、現在は工事を再開しています。これに伴い、**新橋（上野橋・農道橋）供用開始時期が1年延期（令和8年3月→令和9年3月）**となりました。
- ・ 当初は「新橋供用開始後に現在の橋を撤去し、堤防工事を進める」計画でしたが、工事全体が延期となってしまうため、**工程の見直しを実施**しました。
- ・ 治水安全度の向上を最優先しつつ、地域への影響を最小限に抑えるため、**橋を段階的に通行止め**し、堤防工事を進めます。  

通行止め期間	上野橋：	令和8年	5月下旬から	令和9年3月頃
	農道橋：	令和8年11月上旬から	令和9年3月頃	
- ・ **工事全体の完成時期は、当初予定どおりの「令和9年3月」を目指して工事を進めます。**

### 【工事の進捗状況：農道橋付近の状況】

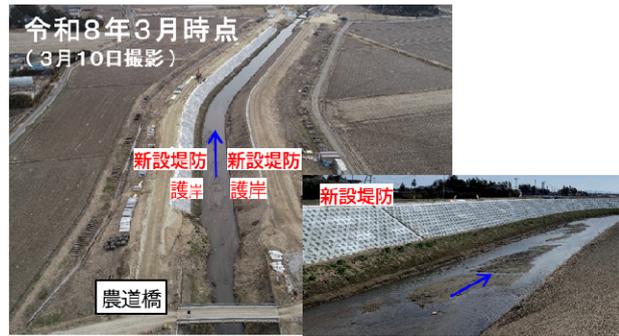

現在の堤防を撤去し、新しい堤防の盛土と護岸を施工しています。

### 【説明会でいただいた主なご意見】

- ・ (ご意見) 土砂搬入のダンプトラック経路と道路等の補修について  
 → (県回答) 経路はこれまでと変更はありません。引き続き、名蓋川協議会だより等でお知らせします。道路等の補修は、現地を確認し、市町と調整のうえ、損傷状況に応じた適切な補修を進めます。
- ・ (ご意見) 路面清掃に伴う水たまり除去及び路肩の土砂撤去について  
 → (県回答) 引き続き路面清掃を徹底し、水たまりが改善できるよう路肩土砂の撤去等を実施します。

### 【説明会の様子】



令和8年3月18日  
大崎市  
高倉地区公民館



令和8年3月19日  
加美町  
平柳構造改革センター

## 【 上野橋 通行止めのお知らせ 】


通行止め期間中は、大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。  
周辺の国道、市町道への迂回をお願いします。

**通行止め開始 令和8年5月20日（水）午前10時～**

※通行止め解除予定 令和9年3月頃（名蓋川復旧だより・工事看板等でお知らせします。）

### 【位置図】（迂回路・予告看板）

予告看板は、令和8年4月上旬から設置し、お知らせします。

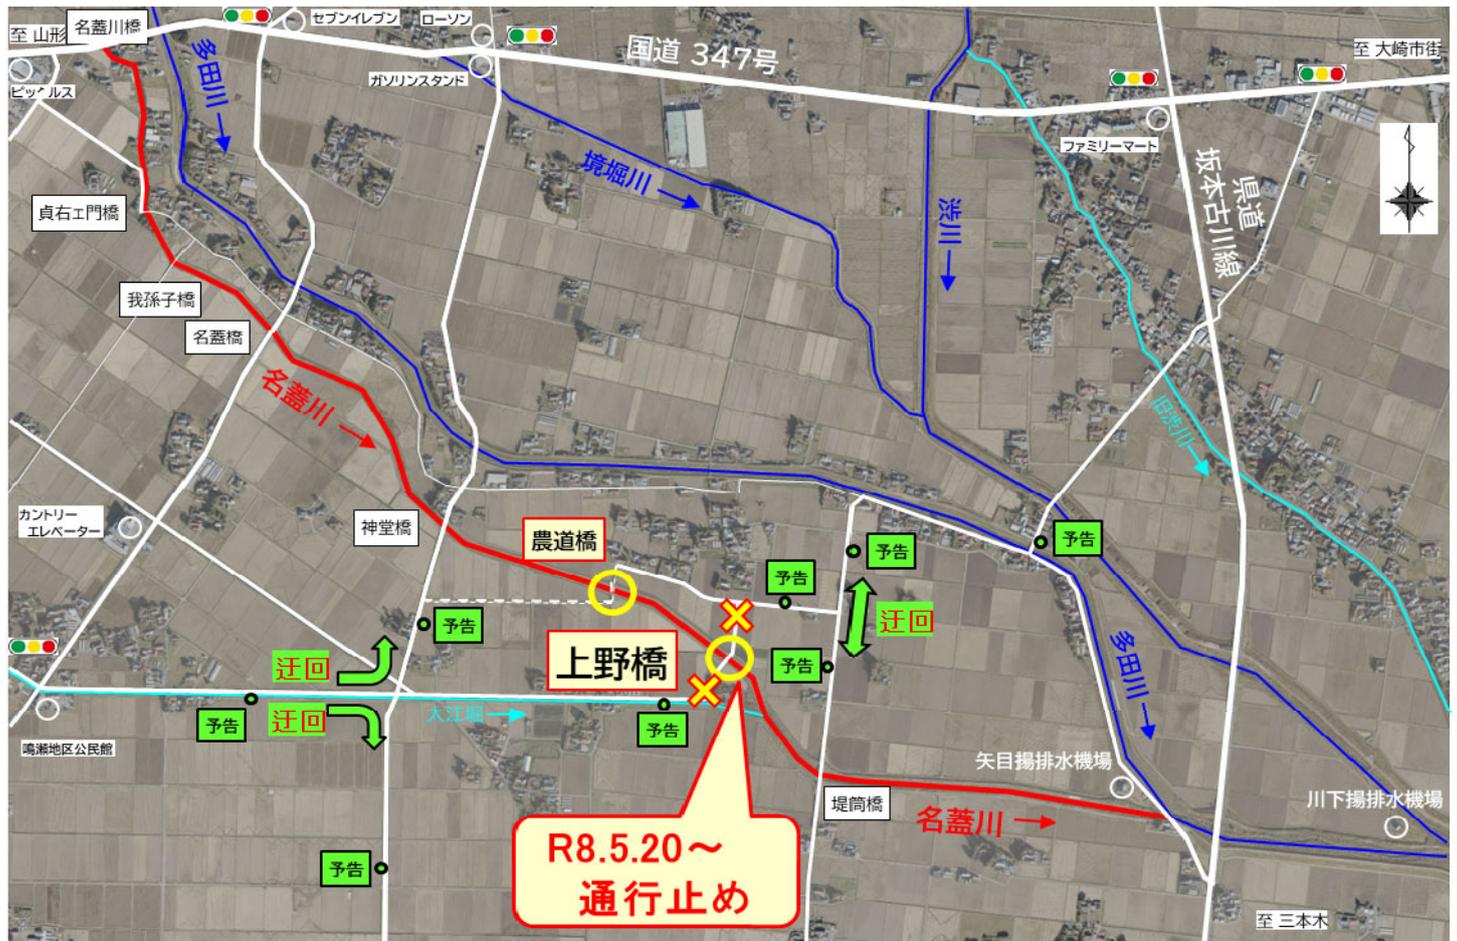

※ 予告看板の位置は変更となる場合があります。

## 【 農道橋 今後の通行止めの予定について 】

- 令和8年11月上旬から、通行止めを予定しています。
- 詳しくは、名蓋川復旧だより・予告看板等でお知らせします。（令和8年夏頃）

## 名蓋川災害復旧にかかる問い合わせはこちら



明日につなぐ×ミヤギの未来  
宮城県土木部

宮城県北部土木事務所河川砂防第二班  
〒989-6117 大崎市古川旭四丁目1番1号  
電話：0229-91-0747（直通）  
F A X：0229-22-5260  
E-mail：nh-dbkks2@pref.miyagi.lg.jp



むすび丸
