

豊里大橋工事だより

第3号 令和元年9月1日発行

本県の土木行政の推進につきましては、日ごろより格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、県道河南米山線豊里大橋については昨年7月から工事を開始し、今年1月より片側交互通行により工事を進めさせていただいております。

今年の1月には下図①箇所にて橋桁の作業に現地着手し、約102m区間において5月に新しい橋桁の架設が完了しました。

現在は、河川が増水しやすい時期（出水期7月～9月）にあたり、橋下側からの大がかりな作業は出来ないことから、新しい桁の塗装など橋梁の上からの作業を実施しているところです。

10月からは、既設の橋桁の撤去及び新しい橋桁を設置する作業等を再開し、来年度末の工事完成を目標に工事を進めます。


引き続き、工事に伴う交通規制によりご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
今後も工事の進捗状況等につきましては、随時情報提供をさせていただきます。

○これまでの作業内容について (下の番号は、橋桁が新しくなる順番です。)

- ①区間：新しい橋桁設置済。桁塗装作業。舗装の作業準備。
- ②～③区間：古い床版撤去済。古い橋桁撤去及び新しい橋桁設置作業の準備。
- ④区間：古い床版撤去作業の準備。

(凡例)

- ：新しい橋桁設置完了
- ：古い床版撤去完了
- ：古い舗装撤去完了
- ：通行範囲

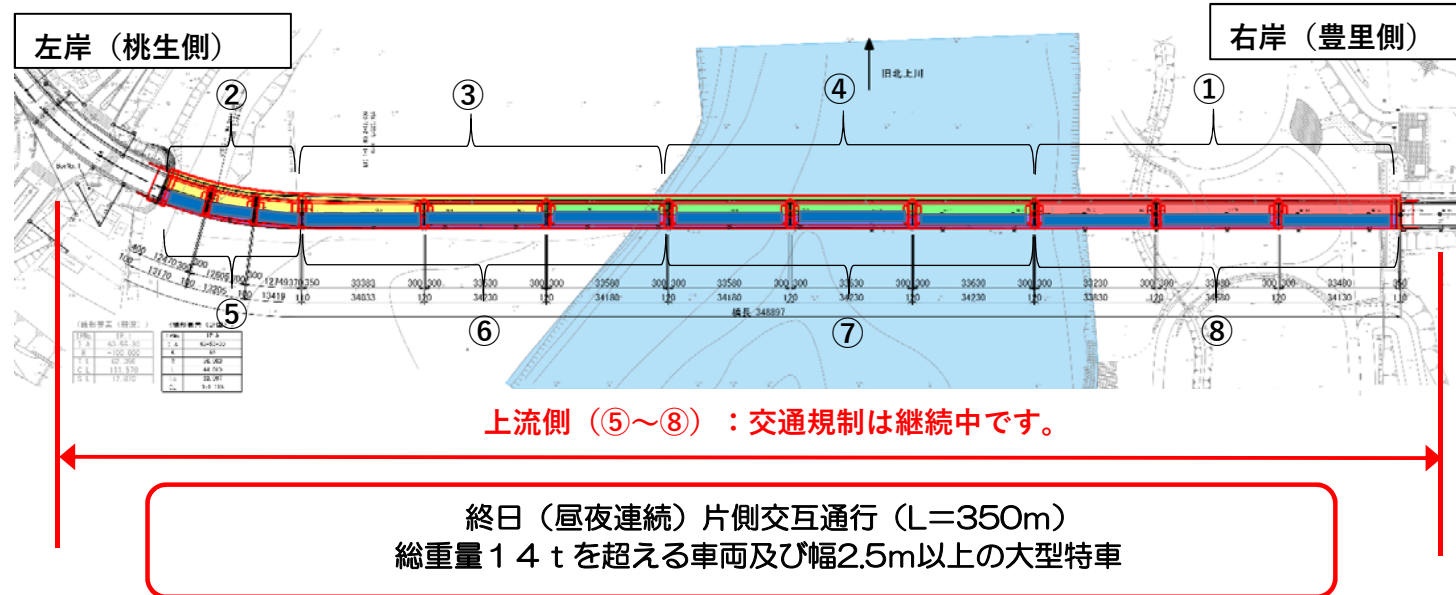

○これまでに完了した作業について

左図①区間 新しい橋桁の設置が完了しました。



(大型クレーンによる桁架設状況)



(舗装前の橋桁上面の状況)

左図②～③区間 古い床版の撤去が完了しました。




(古い床版の撤去状況)



(古い床版の撤去完了状況)

○現在の作業について

現在は、新しい橋桁の設置が完了した左下図①区間では、新しい橋桁の塗装作業や支承（橋桁を受ける金属製の台）の設置作業、舗装作業の準備等を行っております。

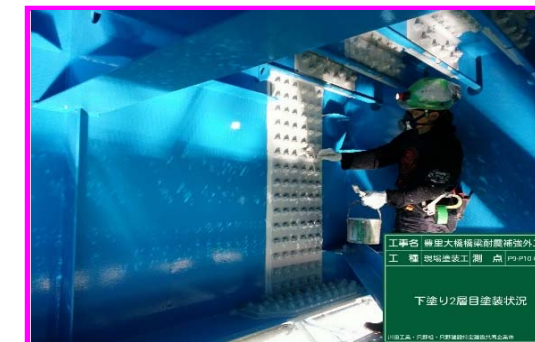

(桁接続部の塗装)



(支承の設置作業)

(担当・問い合わせはこちらまで)
 宮城県東部土木事務所登米地域事務所 道路管理班
 〒987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
 電話：0220-22-2716 E-mail：et-tmdbkm@pref.miyagi.lg.jp
