

化粧坂 通信 第六号

宮城県気仙沼土木事務所

令和4年度末の暫定供用に向けた掘削工事が完了しました！

化粧坂道路改良工事は、令和2年12月から本格的な掘削工事を実施してまいりました。令和3年9月から岩盤切削機を用いて掘削を進め、ついに令和4年11月に掘削が完了しました。


掘削土量は126,000m³であり、ダンプトラック台数は32,400台でした。掘削した残土は、県と市の公共事業で盛土材として再利用され、搬出先として南気仙沼公園の盛土、津谷川防潮堤・港川防潮堤・蔵内防潮堤・鮎立防潮堤のかさ上げ盛土等に使われました。



R4.11.16 写真



No.22から本町橋側を望む

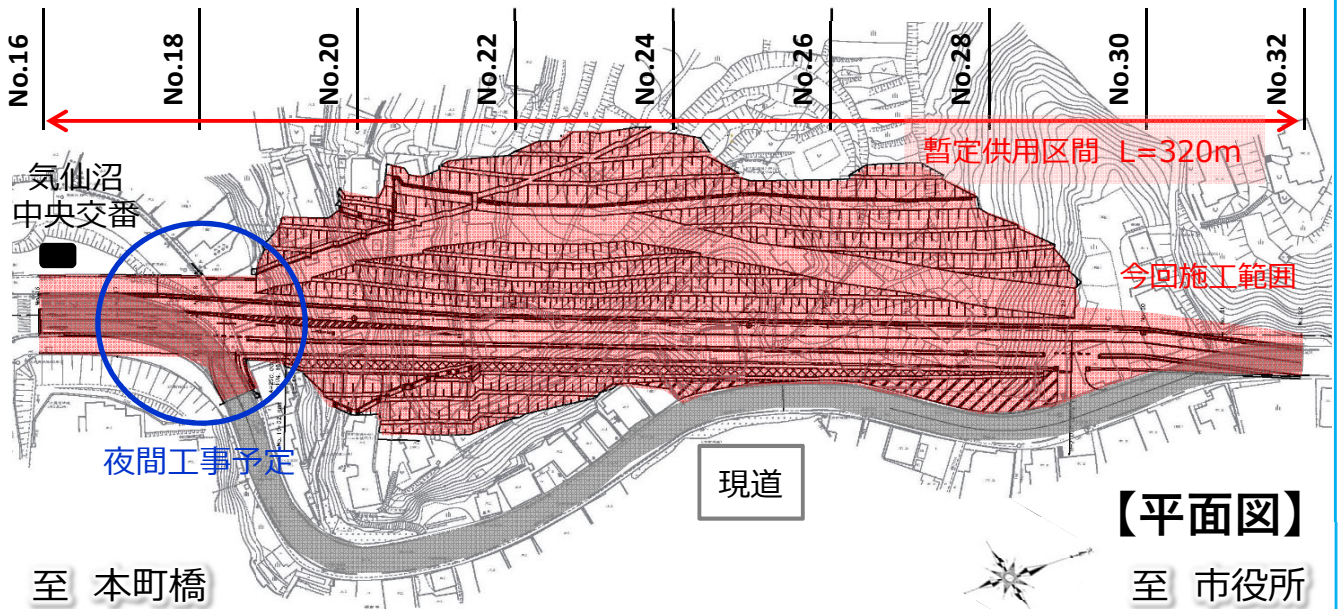

掘削完了した区間を今年度中に暫定供用するために、上記の青丸において夜間通行止め（21:00～6:00）で工事をする予定にしております。工事期間は2～3週間程度を想定しており、施工時期は令和5年1月～2月を考えております。詳しい内容は改めてお知らせしますので工事期間中はご不便をお掛けしますが、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

宮城県気仙沼土木事務所

〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢4 7 番地 6

電話：0226-24-2546

E-mail：ksdbkdk1@pref.miyagi.lg.jp

ホームページ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/

