

Information

みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業レポート (第20号)

事業レポートは、「みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業」(以下、「当工区」という。)について、地域の皆様に最新の情報を定期的にお知らせするものです。今回は、下図3箇所の整備状況等について紹介いたします。



みやぎ県北高速幹線道路

Ⅳ期区間(築館工区) L=1.7km<整備中>

Ⅰ期区間(供用済)

(国)398号

国道4号
築館バイパス

東北縦貫自動車道

(一)若柳築館線

加倉IC


(主)築館登米線

東北新幹線

A. 国道4号築館バイパス接続部の工事に着手しました

当工区と国道4号築館バイパスとの接続部の工事に着手しました。来年3月頃からは、国道4号築館バイパス本線部を片側交互通行にして、新たに右折車線を整備する予定です。ご通行の際はご注意くださいとともに、地域の皆様のご理解とご協力についてよろしくお願い致します。

完成予想図

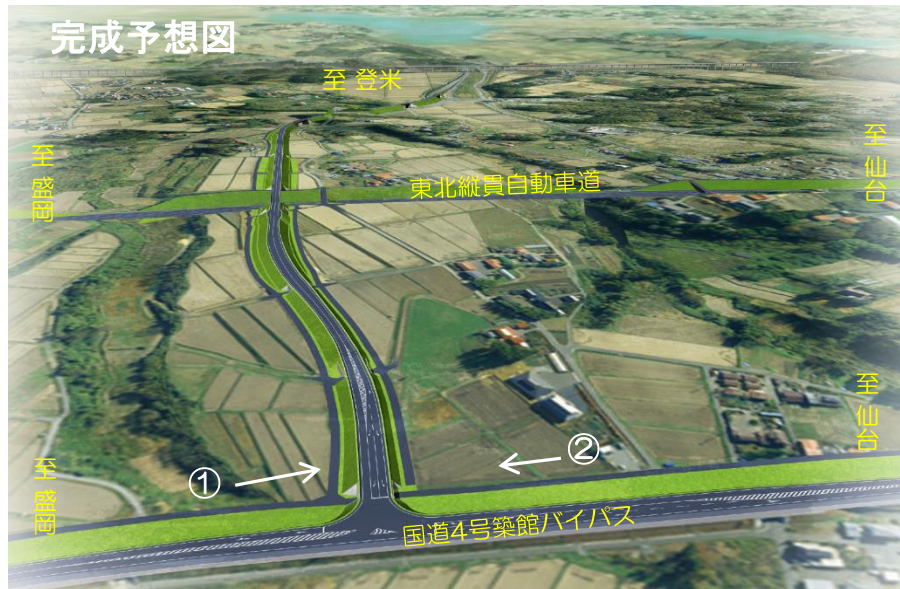


B. 後沢本線橋上部工の床版コンクリートを打設しました


10月3日(火)の深夜に東北縦貫自動車道(築館IC~若柳金成IC間)を通行止めにして架設した上部桁について、床版部※1)コンクリートを打設しました。今後、壁高欄(コンクリート製)※2)や落下物防止柵の設置等を行い、年内に工事が完了する予定です。

- ※1) 床版部：橋上を通過する車両等の荷重を受ける鉄筋コンクリート構造部分
- ※2) 壁高欄：よく見かける鋼製の構造(欄干)ではなく、コンクリート構造の壁

上部桁断面図

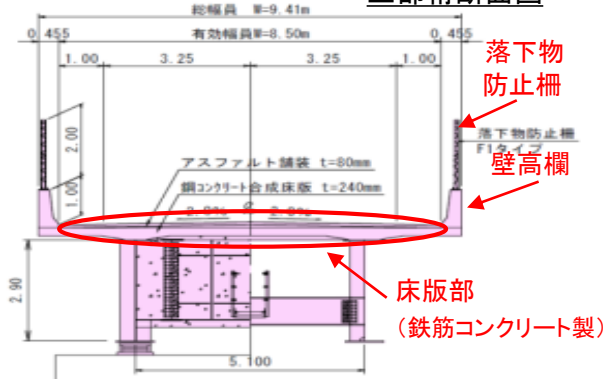

完成予想図

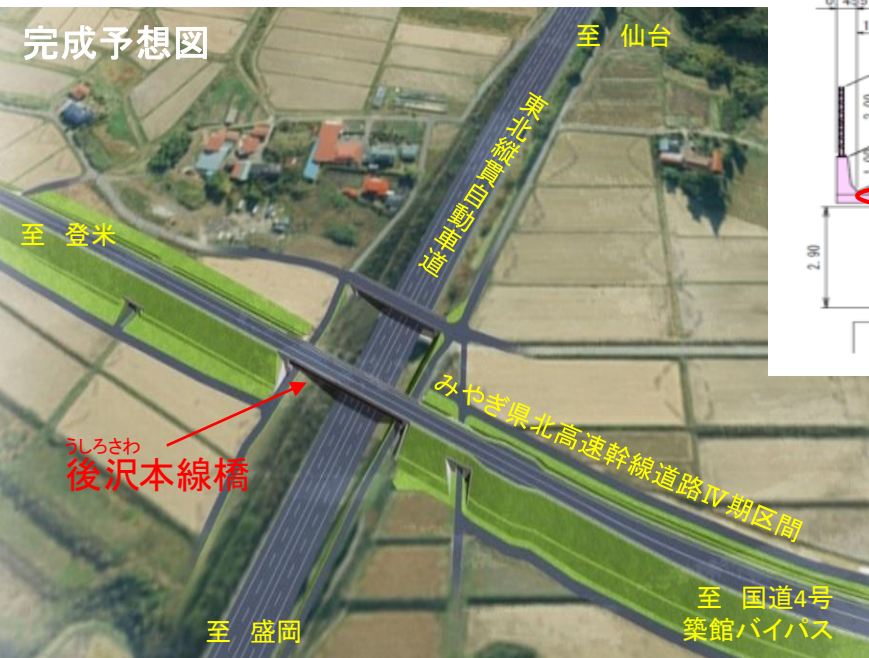


床版部コンクリート打設状況



C. 萩沢忽滑沢本線橋の下部工工事を進めています

当工区における4橋のうち1橋が完了し、3橋の整備を推進しています。萩沢忽滑沢本線橋では、上部桁を支える橋台工の鉄筋組立てやコンクリート打設を進めており、年内に工事完了の予定です。なお、引続き上部桁の架設を行います。

完成予想図

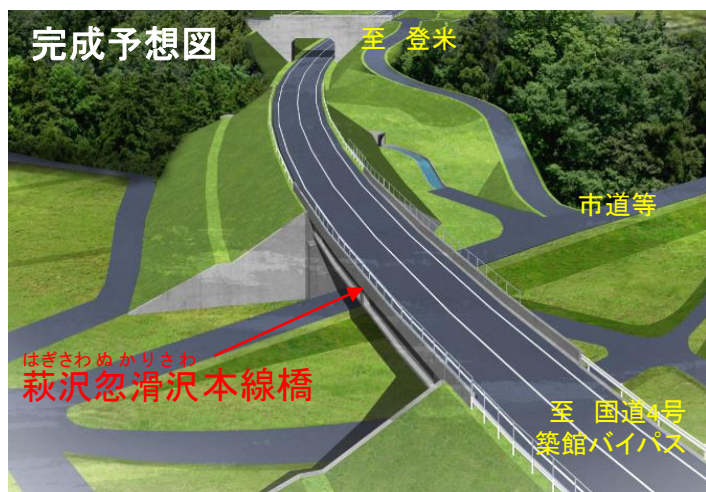

橋台工2基の鉄筋組立て状況



宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 道路建設班
 〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木5-1(栗原合同庁舎)
 TEL 0228-22-2189
 FAX 0228-22-9049
 URL : <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-khdbk/>
 E-mail: nh-khdbkd@pref.miyagi.lg.jp

