

[復興のポイントⅡ] 水産業集積拠点，漁業拠点の集約再編

1) 漁港・漁村

①漁港の本格復旧工事

漁港では平成23年12月から本格復旧工事が進められています。平成26年3月末現在，県管理漁港は27港すべてで，市町管理漁港は113港の内104港で，本格復旧工事に着手しており，県・市町村管理漁港合わせた着手率は94%となっています。

また，県管理漁港の復旧工事においては資材不足などにより現場の進捗が遅れたことから，平成27年度に完了予定だった13漁港の内，気仙沼，塩釜，雄勝の3漁港では完成時期を平成29年度に延伸するなど漁港の復旧・復興のロードマップの見直しを図りました。壊滅的な被害を受けた各漁港の早期復旧は，本県水産業の復興にとって不可欠であることから，全漁港を一日でも早く使用できるよう復旧工事を進めます。

②漁港施設用地の嵩上げ工事

荷さばき所等の官地の漁港施設用地の嵩上げ及び排水対策は，災害復旧事業と併せて平成23年11月から嵩上げ工事等を実施しています。

県管理の漁港施設用地については，平成25年度までに，嵩上げが必要となる25漁港のうち22漁港において工事を着手（着手率88%）し，市町管理の漁港施設用地についても，98漁港のうち69漁港において工事を着手（着手率70%）しています。

また，水産加工団地等の民地の嵩上げは，石巻漁港水産加工団地については民地の嵩上げが完了し，気仙沼漁港水産加工団地は94%が完了し，加工団地内に76企業の立地が内定している。女川漁港水産加工団地については，91%の嵩上げが完了し，団地内に12企業の立地が内定しています。

主な事業		
課名	事業費（千円） [決算額]	事業名
水産業基盤整備課 漁港復興推進室	33,327,688	水産基盤整備災害復旧費（再掲） 広域漁港整備事業

※過年度繰越しがある場合は過年度繰越しを含む金額を記載しています。

－主な取組－

○漁港復旧の取組について

1 概要

東日本大震災により県内に142ある漁港は，その全てが被災しており，その復旧のための工事費は漁港施設及び海岸保全施設を合わせて，県管理漁港で1,490億円，市町管理漁港で1,035億円の合計2,525億円となっています。

壊滅的な被害を受けた各漁港の早期復旧は，本県水産業の復興にとって不可欠であることから，全漁港を一日でも早く使用できるように復旧事業を進めています。

2 状況

漁港施設の復旧工事は，震災直後から応急工事に着手し，平成23年12月から本格復旧工事を進めています。

復旧状況は，平成26年3月末現在で，県管理漁港27港の全てに着手し，市町管理漁港でも，河川災害で復旧する2港を除いた113港の内104港に着手しており，着手率は94%となっている。また，契約率は，県が71%，市町が91%となり，県市町合わせて77%となっています。

県管理漁港の復旧工事は，平成27年度内完了を目指して進めてきたが，資材不足などで現場の進捗が遅れていることから，ロードマップを見直し，平成27年度に完了予定だった13漁港の内，気仙沼，塩釜，雄勝の3漁港は完成時期を平成29年度に延伸し，その他の漁港についても別紙ロードマップのような工程に見直しをしました。

3 完成の状況



気仙沼漁港 休憩岸壁



志津川漁港 東防波堤

4 「漁港の復旧・復興ロードマップ」

県管理の27漁港について、見直した復旧・復興ロードマップをホームページで公表しています。(漁港復興推進室ホームページ：<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gyofuku/>)

漁港の復旧・復興ロードマップ




◇県管理漁港の復旧工程

	漁港名	種別	所在地	復旧工程						被害額 (査定額:百万円)	
				平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度
気仙沼管内	① 気仙沼漁港	特定第3種	気仙沼市	施工準備(構造設計等) 応急対策							5,659
	② 小鶴漁港	第2種	気仙沼市	施工準備(構造設計等) 応急対策							998
	③ 鮎立漁港	第2種	気仙沼市	施工準備(構造設計等) 応急対策							832
	④ 松岩漁港	第2種	気仙沼市	施工準備(構造設計等) 応急対策							1,299
	⑤ 波路上漁港	第2種	気仙沼市	施工準備(構造設計等) 応急対策							3,107
	⑥ 浦の浜漁港	第2種	気仙沼市	施工準備(構造設計等) 応急対策							1,733
	⑦ 日門漁港	第2種	気仙沼市	施工準備(構造設計等) 応急対策							1,023
	⑧ 泊(歌津)漁港	第2種	南三陸町	施工準備(構造設計等) 応急対策							1,877
	⑨ 伊里前漁港	第2種	南三陸町	施工準備(構造設計等) 応急対策							1,426
	⑩ 志津川漁港	第2種	南三陸町	施工準備(構造設計等) 応急対策							4,384
	⑪ 波伝谷漁港	第2種	南三陸町	施工準備(構造設計等) 応急対策							1,431
東部管内	⑫ 石巻漁港	特定第3種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策							17,132
	⑬ 女川漁港	第3種	女川町	施工準備(構造設計等) 応急対策							16,108
	⑭ 渡波漁港	第3種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策							6,958
	⑮ 雄勝漁港	第2種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策							868
	⑯ 寄磯漁港	第2種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策							2,616
	⑰ 鮎川漁港	第4種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策							5,088
	⑱ 網地漁港	第2種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策							1,169
	⑲ 福貴浦漁港	第2種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策							1,775
	⑳ 狐崎漁港	第2種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策							829
	㉑ 桃ノ浦漁港	第2種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策							1,781
山台管内	㉒ 仁斗田漁港	第2種	石巻市	施工準備(構造設計等) 応急対策							1,680
	㉓ 塩釜漁港	特定第3種	塩竈市	施工準備(構造設計等) 応急対策							5,580
	㉔ 磯崎漁港	第2種	松島町	施工準備(構造設計等) 応急対策							747
	㉕ 桂島漁港	第2種	塩竈市	施工準備(構造設計等) 応急対策							608
	㉖ 関上漁港	第2種	名取市	施工準備(構造設計等) 応急対策							2,812
㉗ 荒浜漁港	第2種	巨理町	施工準備(構造設計等) 応急対策							4,586	
県全体 27漁港											94,106

: 事業期間延伸部分

⑳ 塩釜漁港復旧工事工程

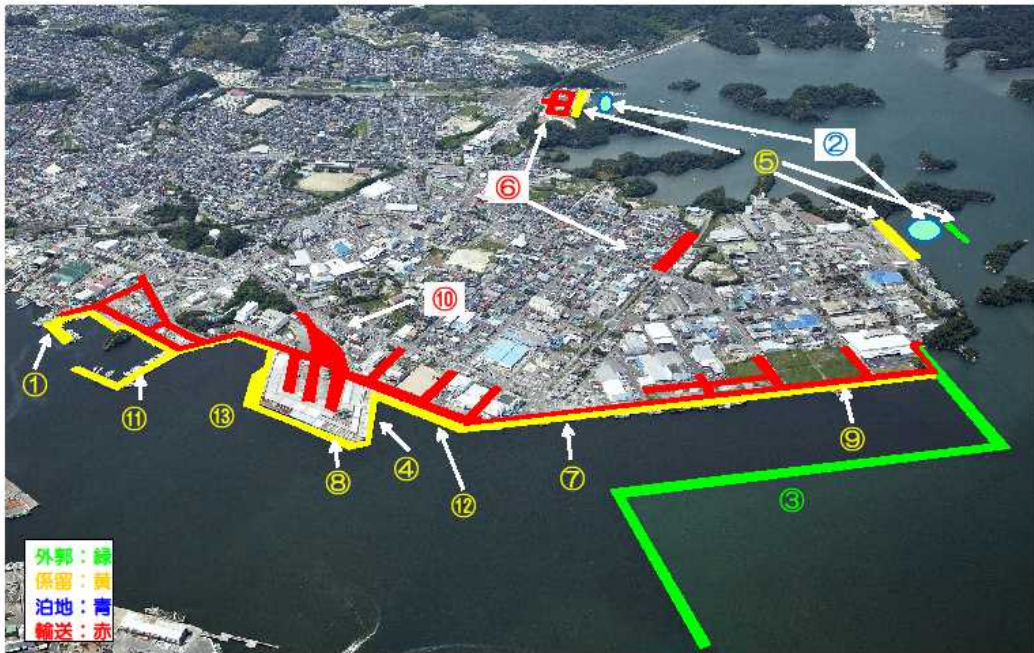

塩釜漁港	事業名	施設名	復旧工程							被害額 (査定額: 百万円)	
			平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		
			施工準備(構造費)								5,580
			応急対策								
			災害復旧工事								
①	災害復旧事業	岸壁外		→							
②	災害復旧事業	泊地		→							
③	災害復旧事業	防波堤		→							
④	災害復旧事業	棧橋外		→							
⑤	災害復旧事業	物揚場外		→							
⑥	災害復旧事業	臨港道路			→						
⑦	災害復旧事業	岸壁		→							
⑧	災害復旧事業	棧橋外		→							
⑨	災害復旧事業	岸壁				→					
⑩	災害復旧事業	臨港道路				→					
⑪	災害復旧事業	岸壁外				→					
⑫	災害復旧事業	岸壁					→				
⑬	災害復旧事業	棧橋外					→				

(漁港復興推進室)
