


# 出島架橋事業だより

Vol.1  
令和4年9月

日頃より、町道女川出島線の出島架橋事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。  
出島架橋工事は、女川町の依頼を受け宮城県が進めております。  
近隣の皆様へ、本工事の進捗状況と今後の予定をお知らせいたします。

## 工事場所

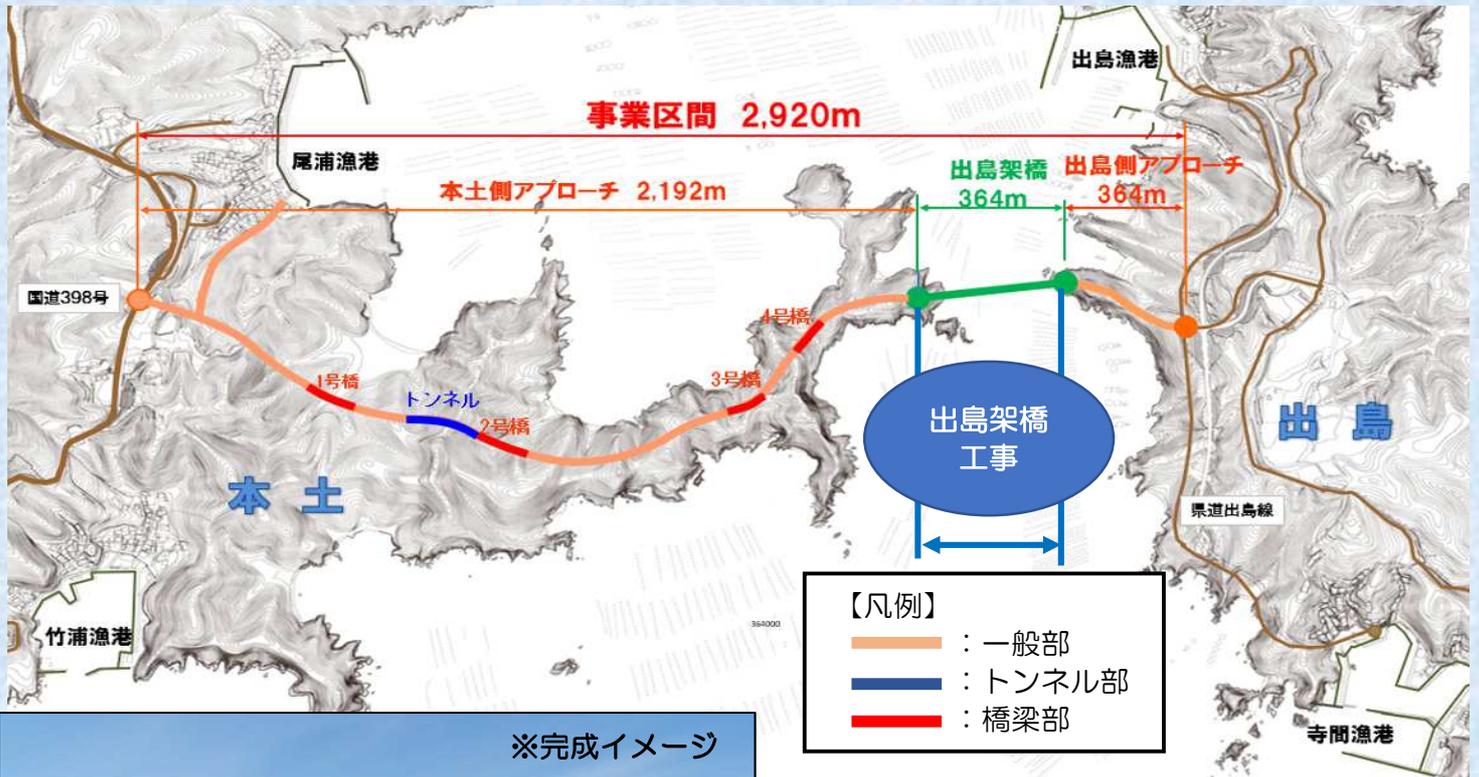

※完成イメージ



※完成イメージ



### 橋梁諸元

橋長	364.0m	鋼材重量	約4,100t
有効幅員	6.50m	橋梁形式	鋼中路式
アチ支間	306.0m		アーチ橋

## お問い合わせはこちらまで

### ★出島架橋本体工事に関して★

宮城県 東部土木事務所  
〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目7番地  
電話：0225-98-3157

### ★事業全体に関して★

女川町 建設課 土木係  
〒986-2265 牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1  
電話：0225-54-3131

裏面には  
「進捗状況と今後の予定」  
の記載があります。


# 工事の進捗状況

進捗率：全体 29% 上部工：工場製作 49%、現地工事 0%  
(R4.7月末現在) 下部工：現地工事 52%

橋体本体は、鉄製です。  
現在三重県津市の工場で、製作中です。



< 完成イメージ >

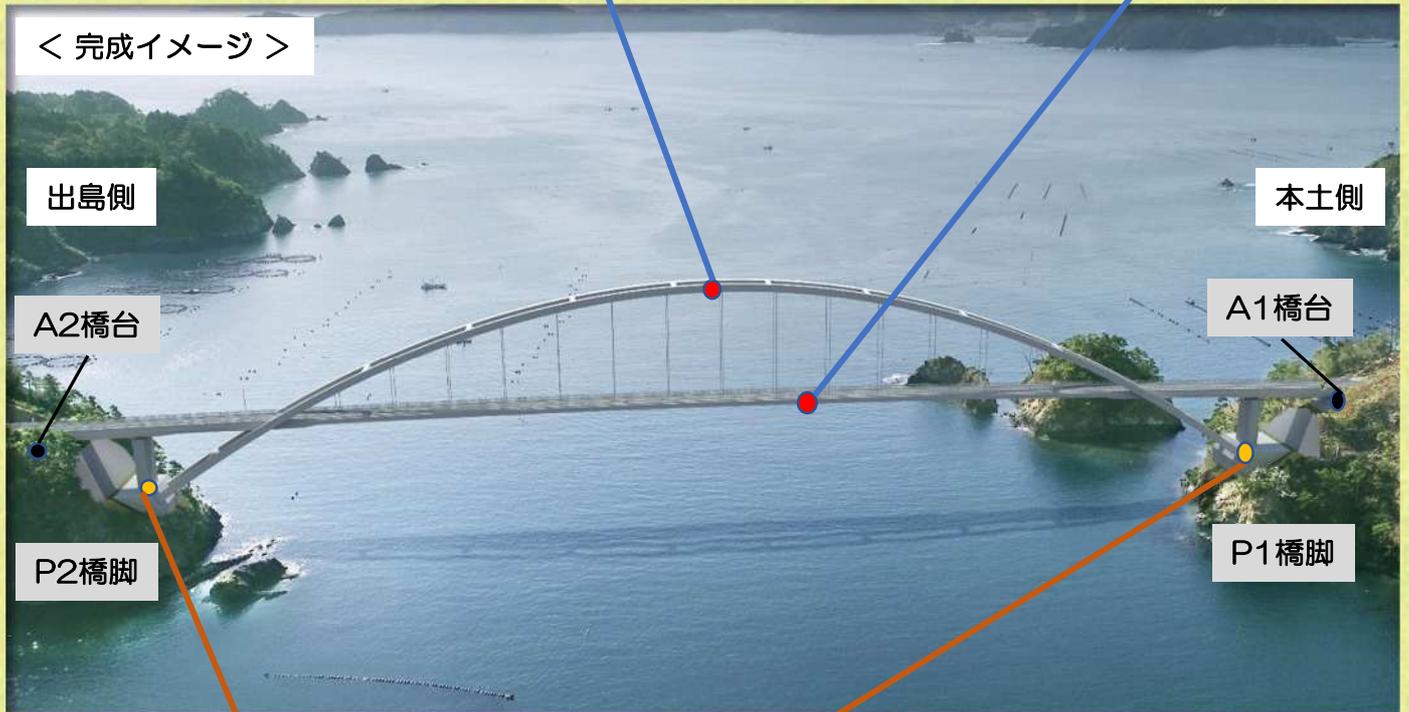

下部工（担当：㈱橋本店、東日本コンクリート㈱）

橋体本体を支える下部工は、鉄筋コンクリート構造です。  
現在はP1・P2橋脚を同時施工中です。

# 今後の予定

## ●上部工●

引き続き工場での製作・塗装を進め、令和5年1月より女川港石浜ヤードへの海上輸送をおこないます。また、令和4年9月より架設位置周辺の海上調査を行うとともに石浜ヤードでの整地作業等を行い、運ばれてくる橋体本体の搬入・組立に備えます。

## ●下部工●

P1橋脚、P2橋脚の完成を令和4年度末を目標に施工を進めており、その後本土側並びに出島側の橋台を施工する予定です。
