

Nougyou Nounon いしのまきNN通信



トヤケ森から望む石巻管内の風景

「いしのまきNN通信」は、石巻地域の農業農村整備事業に関連する活動等を広くお知らせすることを目的に、年3回程度発行しています。掲載希望の情報等がありましたら農村振興班までご一報ください。今後ともよろしくお願ひします。

東松島市 奥松島(東名・洲崎)地域 営農再開実証プロジェクト報告会の開催



第30号の目次:



▲プロジェクト報告会の様子

平成26年12月17日、東松島市小野市民センターにて奥松島(東名・洲崎)地域営農再開実証プロジェクト報告会が開催されました。

東日本大震災の影響で長期間水没していた東名・洲崎地域では、干陸化を完了した農地の一部で営農再開に向けた水稻・ソバの試験栽培が行われており、その試験結果についての報告が行われました。

水稻については、塩害の影響もなく、10a当たり505kgの米が収穫されました。

ソバについては、除塩回数等の条件別に6箇所試験田を設置した結果、一部で塩害・湿害の発生も見られましたが、今後の復旧計画に有効な試験結果が得られました。

報告会では、東名・洲崎地域の試験田で収穫された米とソバ、同じく試験栽培を行っている東松島市宮戸地域で収穫されたネギやサツマイモの試食が行われました。

東名・洲崎地域の本格的な営農再開は平成28年度からを予定しており、今回得られた結果は平成27年度の更なる試験に活用されます。



▲収穫された試験栽培作物の試食

奥松島(洲崎・東名)地域 営農再開実証プロジェクト 報告会	1
大新筒排水機場の復旧完了 に伴う試運転	2
東部管内の農地・農業用施設 等の復旧・復興の進捗	3
「石巻圏域の農業農村整備 2015-2016」の発行	4


大新筒排水機場 復旧工事完了に伴う試運転

平成27年3月19日、東日本大震災によって被災し、復旧の進められていた大新筒排水機場で工事が完了し、石巻市蛇田土地改良区によって試運転が行われました。

大新筒排水機場は、石巻市蛇田地区の旧北上川沿いに位置し、同じく蛇田地区に存在する蛇田排水機場と共に蛇田地区からの雨水、生活排水、農業排水などを排水していましたが、東日本大震災によって旧北上川から海水が流入し、電気設備等の浸水や地盤沈下による吐出水槽の沈下などの被害を受けました。

被災直後に応急復旧が行われ、必要最小限の排水機能を復旧して稼働していましたが、平成25年10月から本格的な復旧工事が開始し、平成27年3月に復旧を完了しました。

石巻市蛇田地区 排水機場位置図

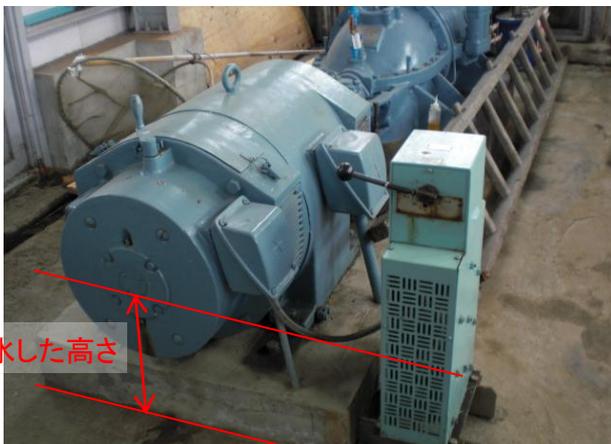

▲平成23年4月4日 浸水直後の排水ポンプ



▲平成27年3月4日 更新された排水ポンプ



▲平成27年3月19日 排水機の試運転の様子



▲平成27年3月19日 吐出水槽の確認の様子

東部管内の農地・農業用施設等の復旧・復興の進捗

宮城県では、東日本大震災に係る農地・農業用施設等の復旧・復興のロードマップを見直し、平成27年3月12日に新たなロードマップを公表しました。うち、東部管内については以下の通りです。

復旧・復興の概要

東日本大震災に係る津波による災害に対処し、早期営農再開を図るため、東部地方振興事務所では管内の被災市及び土地改良区からの要請を踏まえた計645件の災害査定を受け、376億円の復旧事業費が決定しました。また、国は、東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律（平成23年5月2日法律第43号）を施行し、農林水産省が直轄で2地区において事業を行っています。

■管内の国直轄事業の概要

事業名	地区名	受益面積(ha)	総事業費(百万円)	備考
直轄災害復旧事業	河南	4,950	535	施設
直轄特定災害復旧事業	定川	635	2,775	施設

復興の行程と進捗状況

宮城県が平成27年3月12日に発表した「農地・農業用施設等の復旧・復興のロードマップ」は、他事業との調整や関係者との調整、入札不調への対応による工事の完了目標を見直しており、東部管内では、下記のとおり、農地の完了目標を平成30年度に実施する計画として見直しています。管内の農地で復旧対策が必要な全体面積は3,480haであり、平成27年2月末までに3,157haで復旧工事に着手し、着手率は約91%となっています。復旧工事に着手した面積のうち、2,804haで工事が完成し、完了率は約81%となっています。

また、震災による津波で被害を受けた農業用施設（排水機場）は27施設で、現時点では、そのうちの24施設で着手し、着手率は約89%となっています。復旧工事に着手した施設のうち、18施設で工事が完成し、完了率は約67%となっています。なお、応急復旧により、従前と比較し、約9割の排水能力を回復しています。

■管内の災害復旧・復興のロードマップ

工種	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	備考
■農地(除塩含む)※1	着手								
面積:3,480ha	1,880ha	855ha	299ha	191ha	85ha	170ha			
進捗(%)	53%	78%	87%	93%	95%	100%			
■農地(除塩含む)※1	完成								
面積:3,480ha	1,880ha	354ha	492ha	275ha	149ha	105ha	135ha	90ha	
進捗(%)	54%	64%	78%	86%	91%	94%	97%	100%	
■農業用施設 ※2	応急	着手							
排水機場:27施設	2施設	15施設	7施設	0施設	3施設				
進捗(%)	7%	63%	89%	89%	100%				
■農業用施設 ※2	応急	完成							
排水機場:27施設	2施設	2施設	12施設	7施設	1施設	3施設			
進捗(%)	7%	15%	59%	85%	89%	100%			
■農地海岸	着手								
農地海岸:23箇所	0箇所	16箇所	6箇所	0箇所	0箇所	1箇所			
進捗(%)	0%	70%	96%	96%	96%	100%			
■農地海岸	完成								
農地海岸:23箇所	0箇所	0箇所	0箇所	3箇所	19箇所	1箇所			
進捗(%)	0%	0%	0%	13%	91%	100%			

■管内の主な事業の進捗状況 平成27年2月末現在



本資料は、県が公表した「東日本大震災に係る農地・農業用施設等の復旧復興のロードマップ見直しについて(H27.3.12)」のうち、東部管内分を表記している。

- ※1 農地復旧面積には自力復旧、復興事業による転用などの面積を含む。
- ※2 農業用施設については受益面積10ha以上の排水機場とし、国が直轄で行う2地区(河南地区、定川地区)を除く。

「石巻圏域の農業農村整備2015-2016」を作成しました

当事務所では、2年毎に「石巻圏域の農業農村整備」と題し、管内の農業農村整備事業等を紹介したパンフレット作成しています。

今年度は、2015・2016年度のパンフレットを作成し、発行することとなりました。

今回のパンフレットは「復旧から再生へ」の副題のとおり、「みやぎの農業・農村復興計画」に示される「復旧期（2011～2013）」を終え「再生期（2014～2017）」を迎えたことを意識し、東日本大震災の農地・農業用施設等の被害概要や復旧・復興の概要、復興の工程と進捗状況等の内容を記載しています。

また、「農地・農業用施設の復旧復興のロードマップ」の見直しに合わせ、農地災害復旧事業の施工年次計画の位置図も更新されています。

各関係機関に配布しますが、追加で必要な場合等は当部までご連絡ください。



一日も早い災害復旧と
地域復興をめざして

宮城県東部地方振興事務所 農業農村整備部
(編集：農村復興班)

〒986-0812 石巻市東中里1丁目4-32
Tel 0225(95)1411 (内) 489 Fax 0225(96)4880
E-mail et-ss-nos@pref.miyagi.jp
URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-sgsin-ns/

