


【岩井崎地先海岸】進捗状況

事業概要

施工延長 L=338.4m (特殊堤・傾斜堤・直立堤)

特殊堤工(重力式) L= 85.0m	傾斜堤工 L=214.1m
直立堤工 L= 39.0m	駐車場整備工 A=850.0m ²
バス巡回場整備工 A=2,990.0m ²	

計画平面図

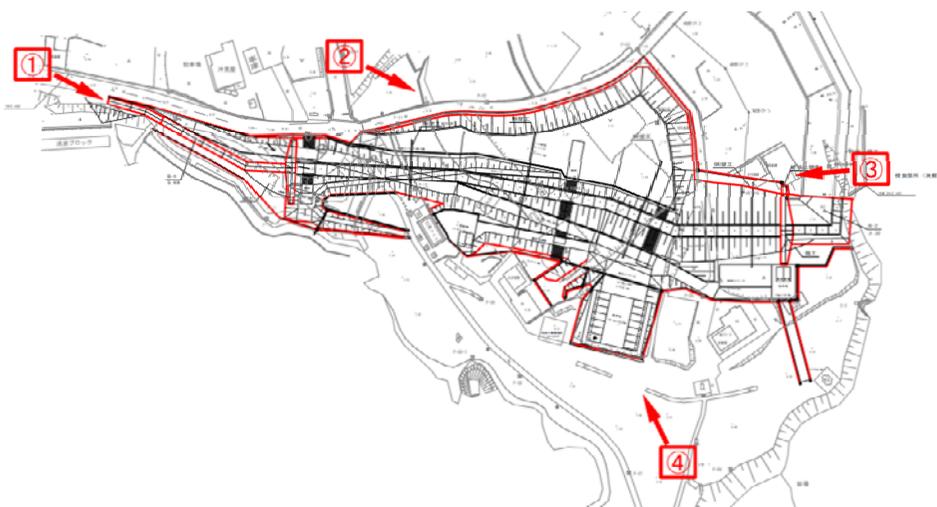

事業位置



気仙沼海岸 岩井崎地先海岸
気仙沼市波路上岩井崎地内

① 着手前 平成28年8月



② 着手前 平成28年8月



③ 着手前 平成28年8月




④ 着手前 平成28年8月



計画横断図

堤防部(傾斜堤区間)
(天端高T.P.+9.84m)



【岩井崎地先海岸】進捗状況

進捗状況

平成30年3月 完成

① 平成30年3月 完成



起点部の特殊堤区間

② 平成30年3月 完成



中間部の傾斜堤区間

③ 平成30年3月 完成



終点部の直立堤区間

④ 平成30年3月 完成



中間部の傾斜堤区間
