

# 【気仙沼海岸 千岩田地区海岸】 進捗状況

## 事業概要

復旧延長 L=357.1m

重力式護岸工(H=7.2m)

L=357.1m


コンクリート工

V=12,294m<sup>3</sup>


地盤改良工

N= 912本


## 計画平面図

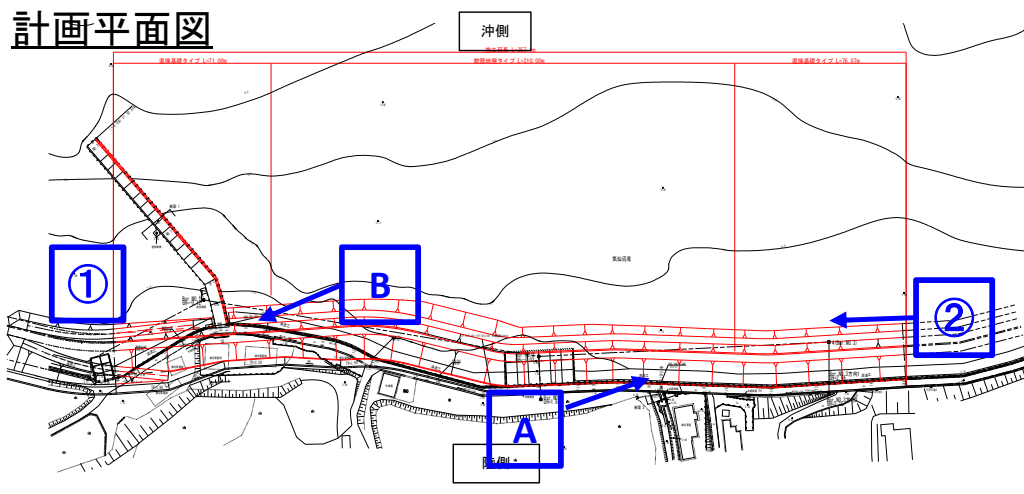

## 計画横断図

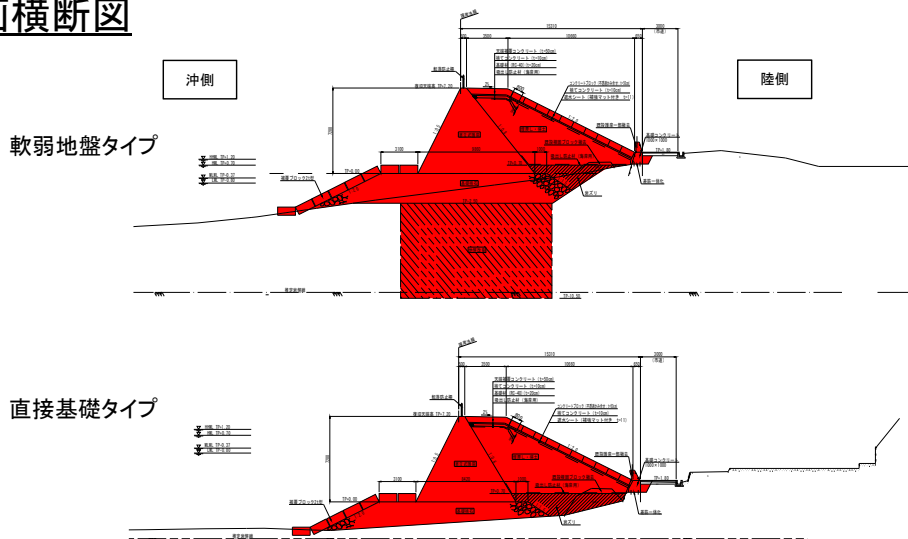

## 事業位置

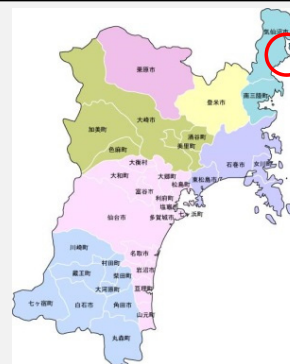

気仙沼海岸千岩田地区海岸  
気仙沼市岩月千岩田地先

## ① 着手前 平成26年7月

起点側(北側)



## ② 着手前 平成26年7月

終点側(南側)



# 【気仙沼海岸 千岩田地区海岸】 進捗状況

## 進捗状況

防潮堤の整備が完了しました。

### ① 令和3年2月末 現在の状況(樋門部)



### ② 令和3年2月末 現在の状況(突堤部)

