


【気仙沼海岸 台ノ沢地区海岸】 進捗状況


事業概要

復旧延長	L=283.4m
重力式護岸工 (H=7.2m)	L=283.4m
コンクリート工	V=9,093m ³
階段工	N= 2箇所
樋管工	N= 2箇所

計画平面図

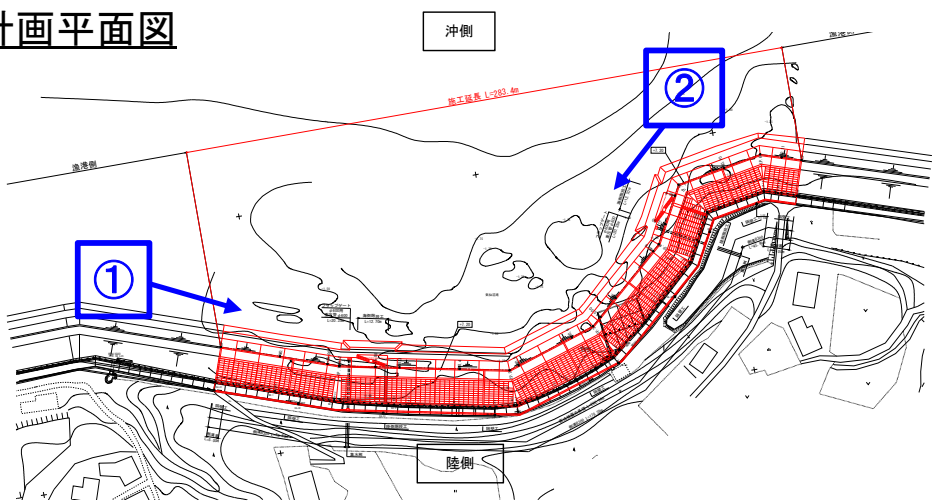

計画横断図

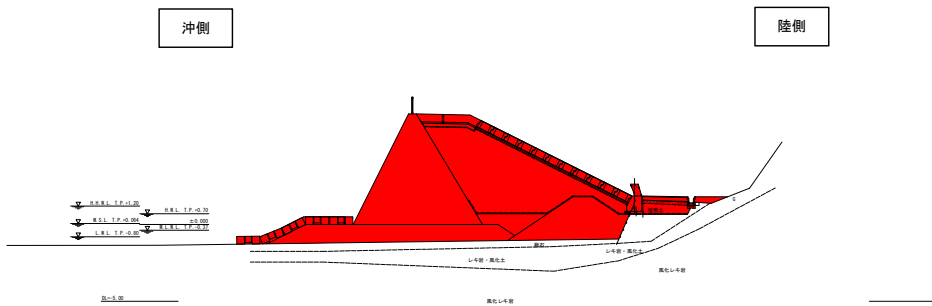

事業位置



気仙沼海岸台ノ沢地区海岸
気仙沼市岩月台ノ沢地先

① 着手前 平成26年7月

起点側(北側)より



② 着手前 平成26年7月

終点側(南側)より



【気仙沼海岸 台ノ沢地区海岸】 進捗状況

進捗状況

平成30年12月 完成

① 平成30年12月 完成



② 平成30年12月 完成

