

平成30年度 北上川下流東部流域下水道事業

宮城県東部下水道事務所

事業箇所処理区域名	北上川下流東部流域下水道			
	北上川下流東部			
	全体計画	認可計画	28年度末	流入量
行政人口(人)	123,869		52,598	
計画処理面積(ha)	1,855.3	1,744.1	1,293.9	
計画処理人口(人)	38,100	43,510	41,180	
計画処理水量(m ³ /日)	19,753	21,379		日平均
処理能力(m ³ /日)	25,300	25,300	25,300	12,003
系列数	3	3	3	
管渠延長(m)	43,530	43,530	43,530	
放流渠延長(m)	100	100	100	
ポンプ場(箇所)	18	18	17	
事業期間	H8~H47	H8~H32		
事業費(億円)	235	218	203	
処理場名	石巻東部浄化センター			
所在地	石巻市魚町			
敷地面積(ha)	3.0			
処理方式	純酸素活性汚泥法			

(目的)
石巻圏域(旧北上川以東)における公共用水域の水質保全及び地域住民の生活環境の改善を図る。

(事業経過)
平成9年度 事業計画策定、都市計画決定、事業着手
平成9~15年度 幹線管渠延伸工事及び浄化センターの増・改築工事施工
平成16年4月1日 一部供用開始(河北町・桃生町)
平成16年7月16日 一部供用開始(女川町)
平成18年度 第3系列供用開始
平成24年9月18日 下水処理開始式(被災した浄化センター第1系列において高級処理を再開)


平成28年度事業(交付金事業)
事業費 C=419百万円
平成28年度県単災
事業費 C=350百万円(うち繰越 C=138百万円)
平成29年度事業概要
【補助事業(交付金事業)】
事業費 C=356百万円(うち繰越 C=64百万円)
平成29年度受託事業
事業費 C=140百万円(うち繰越 C=92百万円)
下図に工事を記載

平成30年度事業概要
【補助事業(交付金事業)】
事業費 C=298百万円

北上川下流東部流域下水道(北上川下流東部処理区)



石巻東部浄化センター

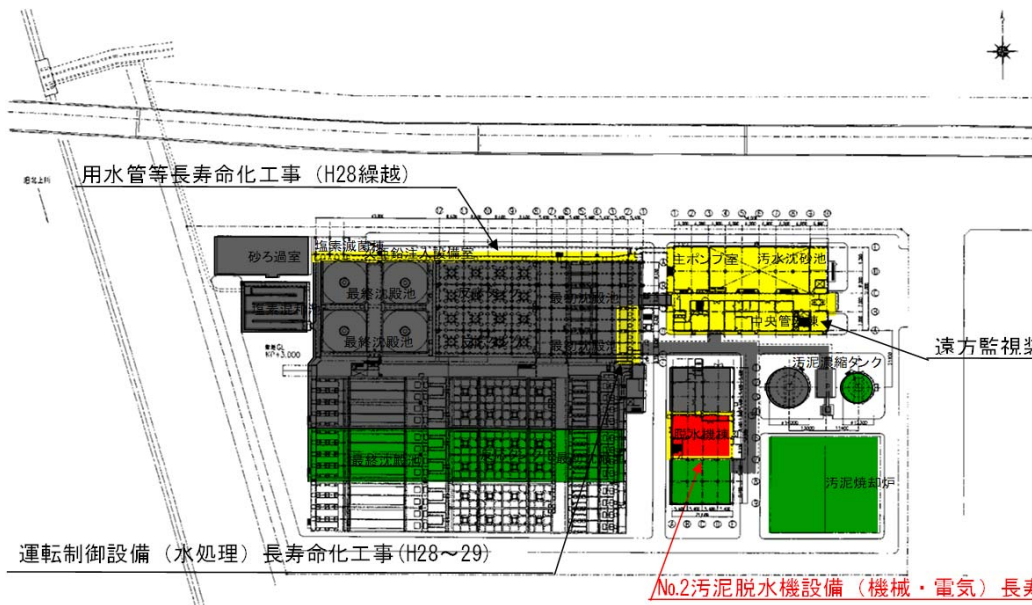

色	計画区域	区域
白	行政	区域界
黄	設管備渠	H28年度まで施工済
赤		H29年度(実績)
緑		H30年度(実施予定)
白	全体計画	
P	ポンプ場	
T	終末処理場	
