
資料－１－２

第176回女川原子力発電所環境調査測定技術会資料

女川原子力発電所
環境放射能調査結果(案)
資　料　編


令和７年度第４四半期

1　調査地点

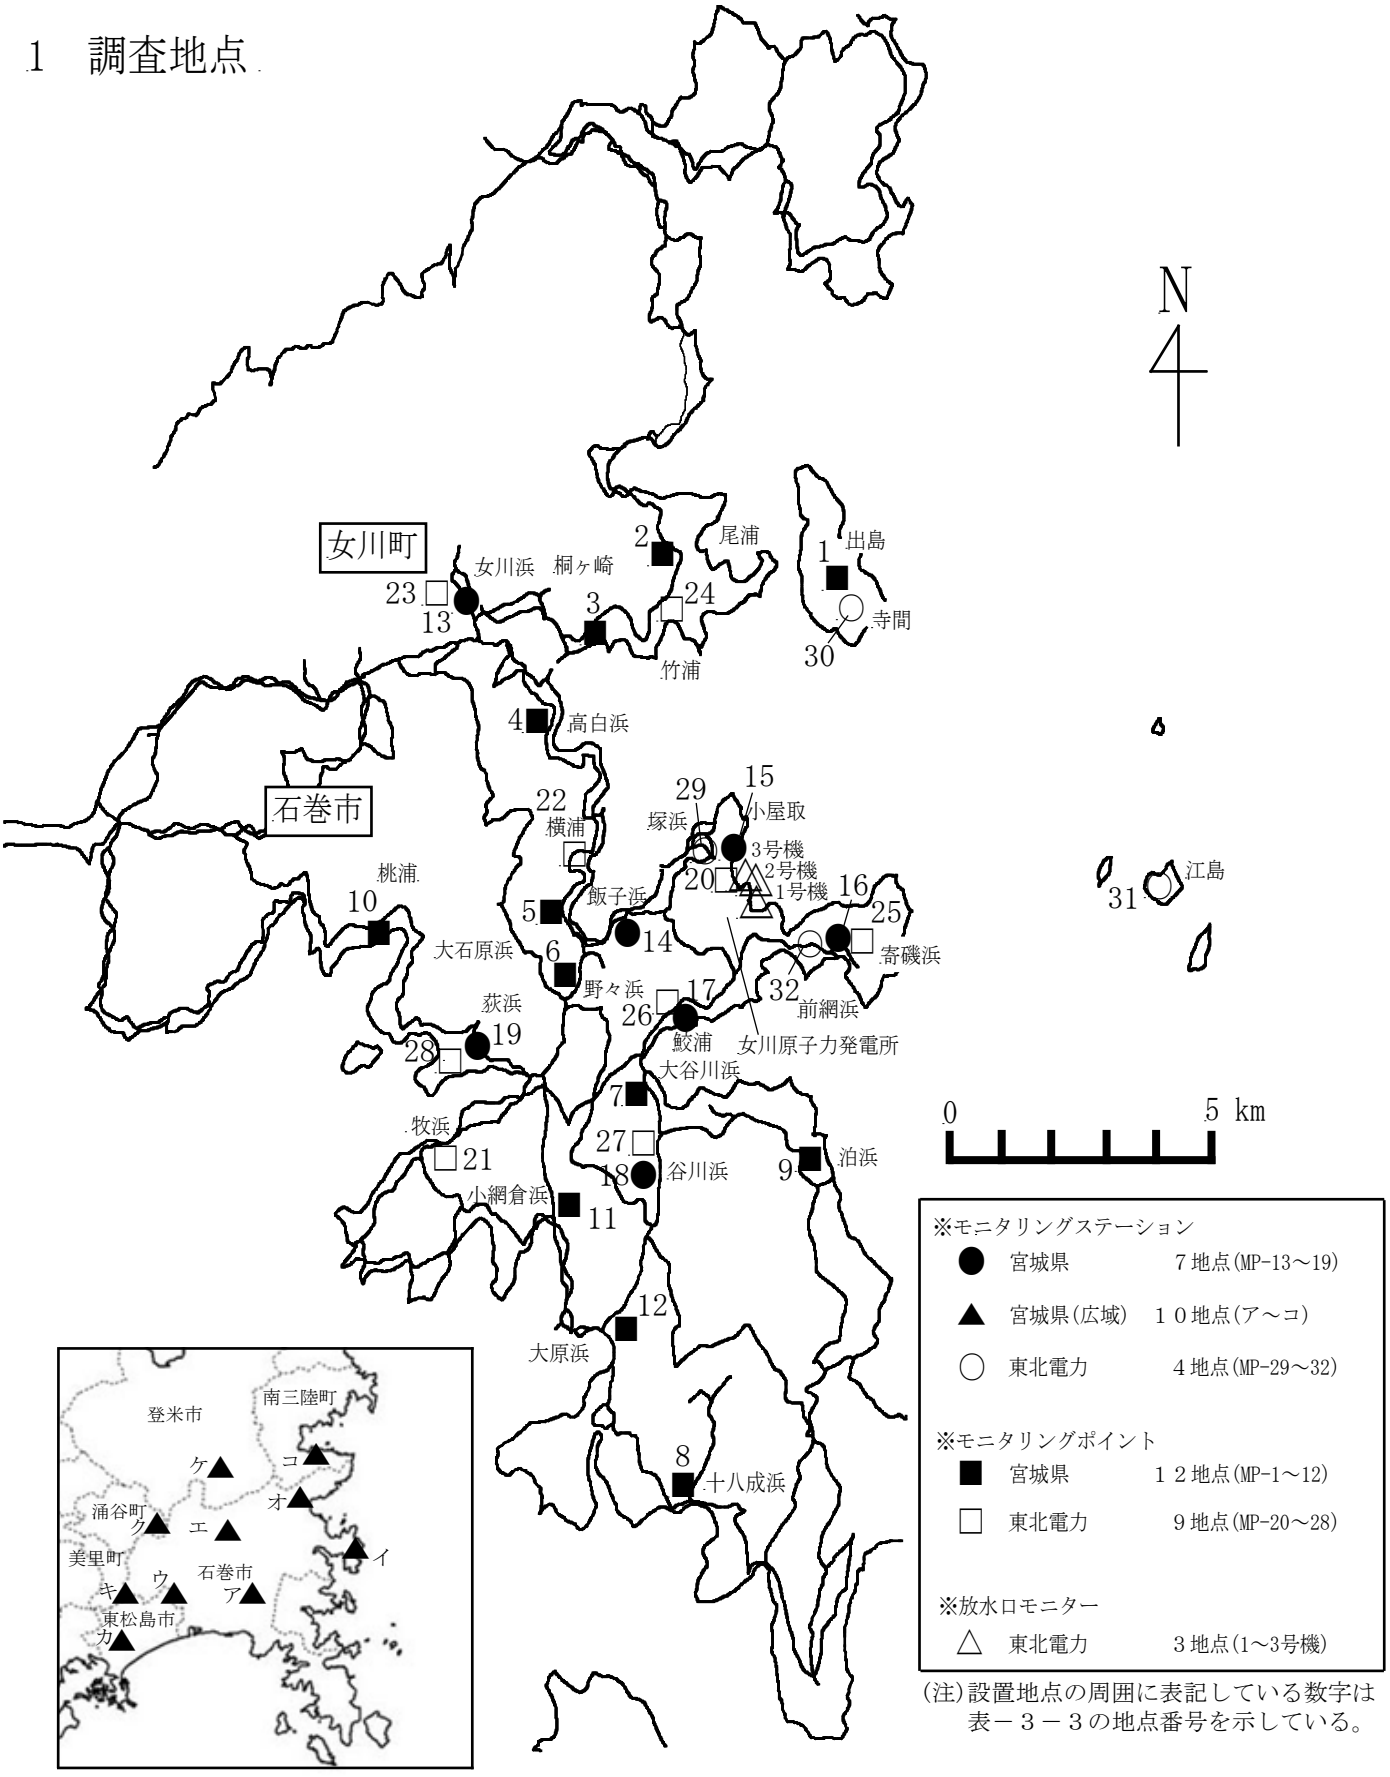


(注)設置地点の周囲に表記している数字は
表－３－３の地点番号を示している。


図－１－１　モニタリングステーション、モニタリングポイント
及び放水口モニター設置地点

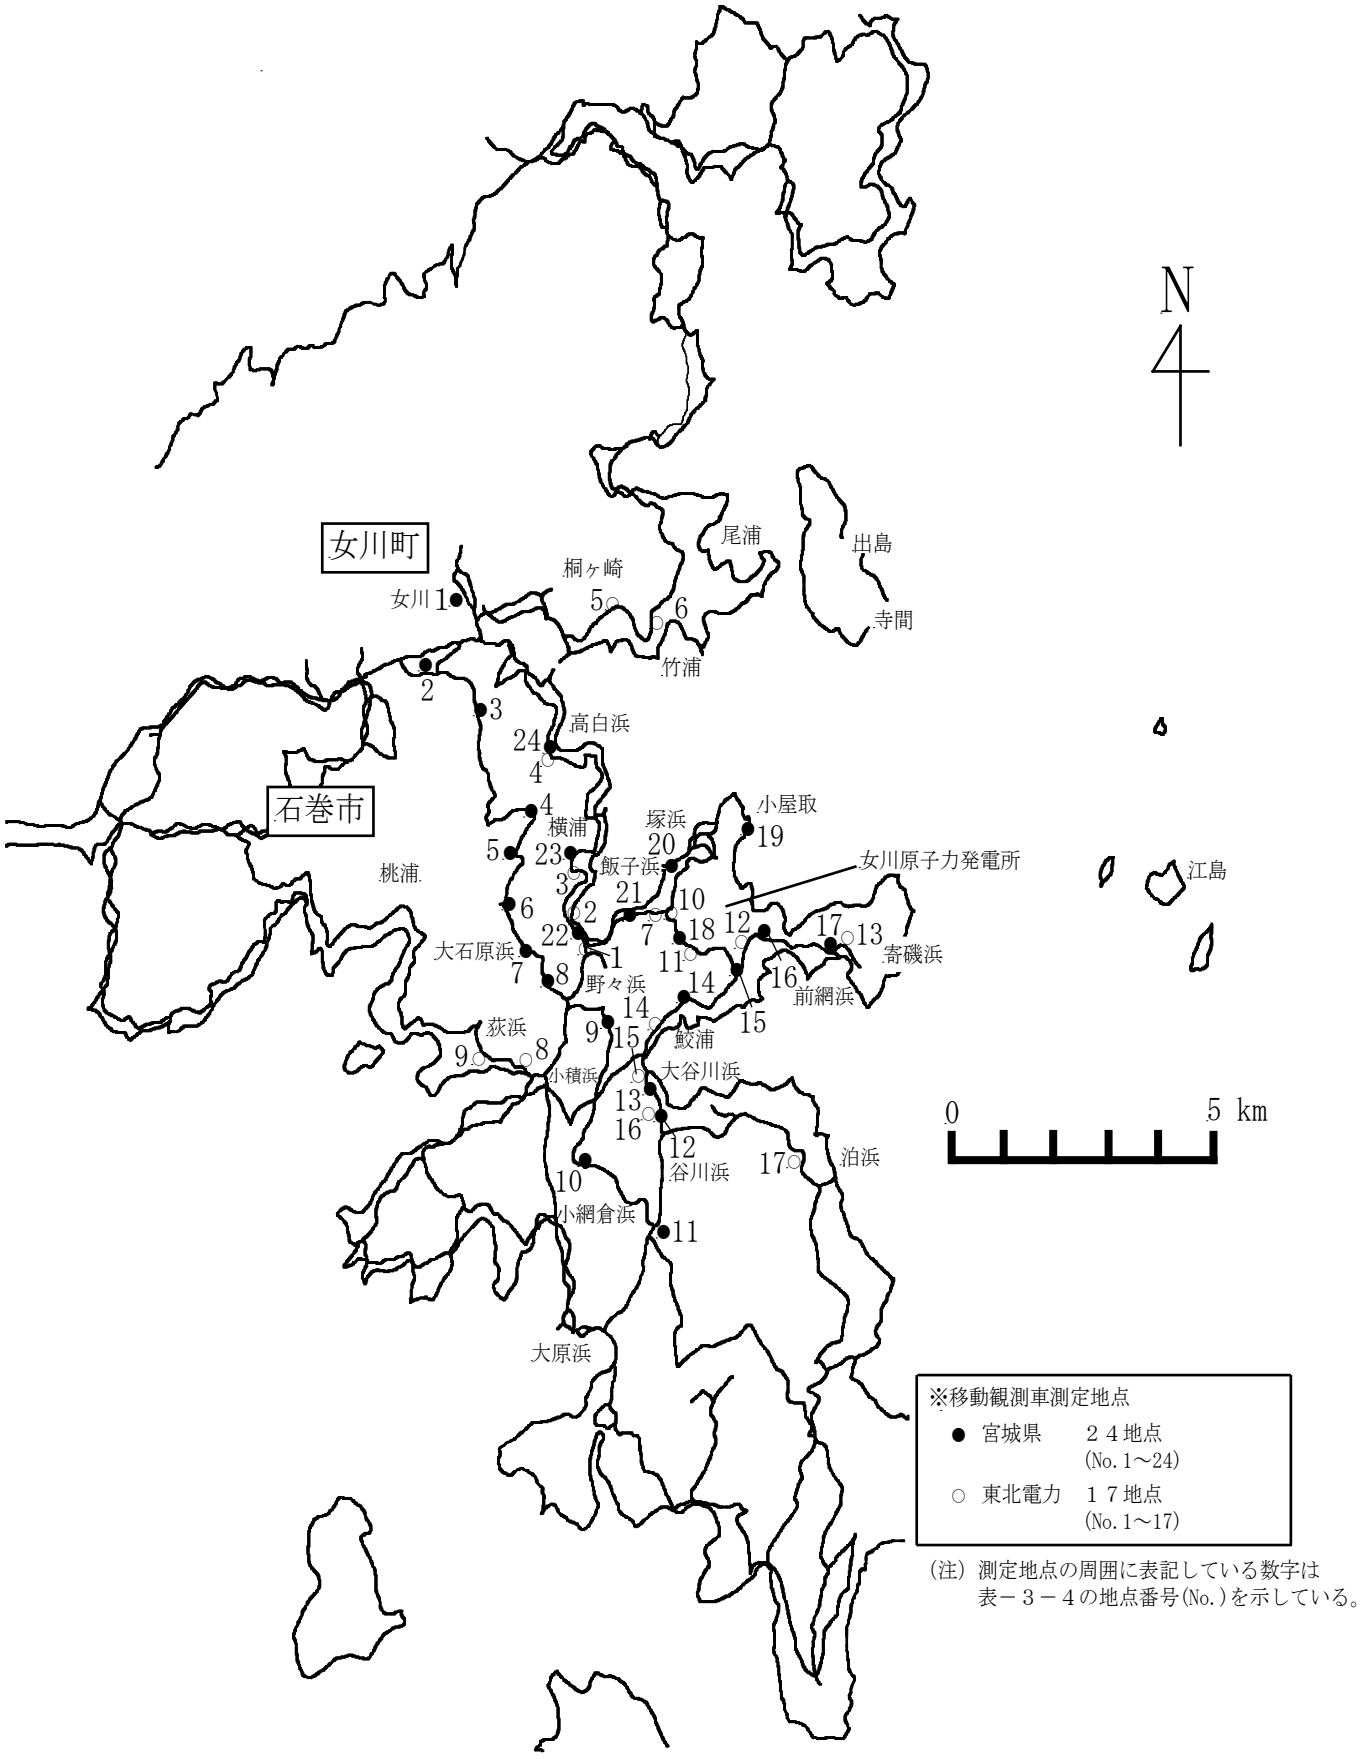

図－１－２　移動観測車測定地点

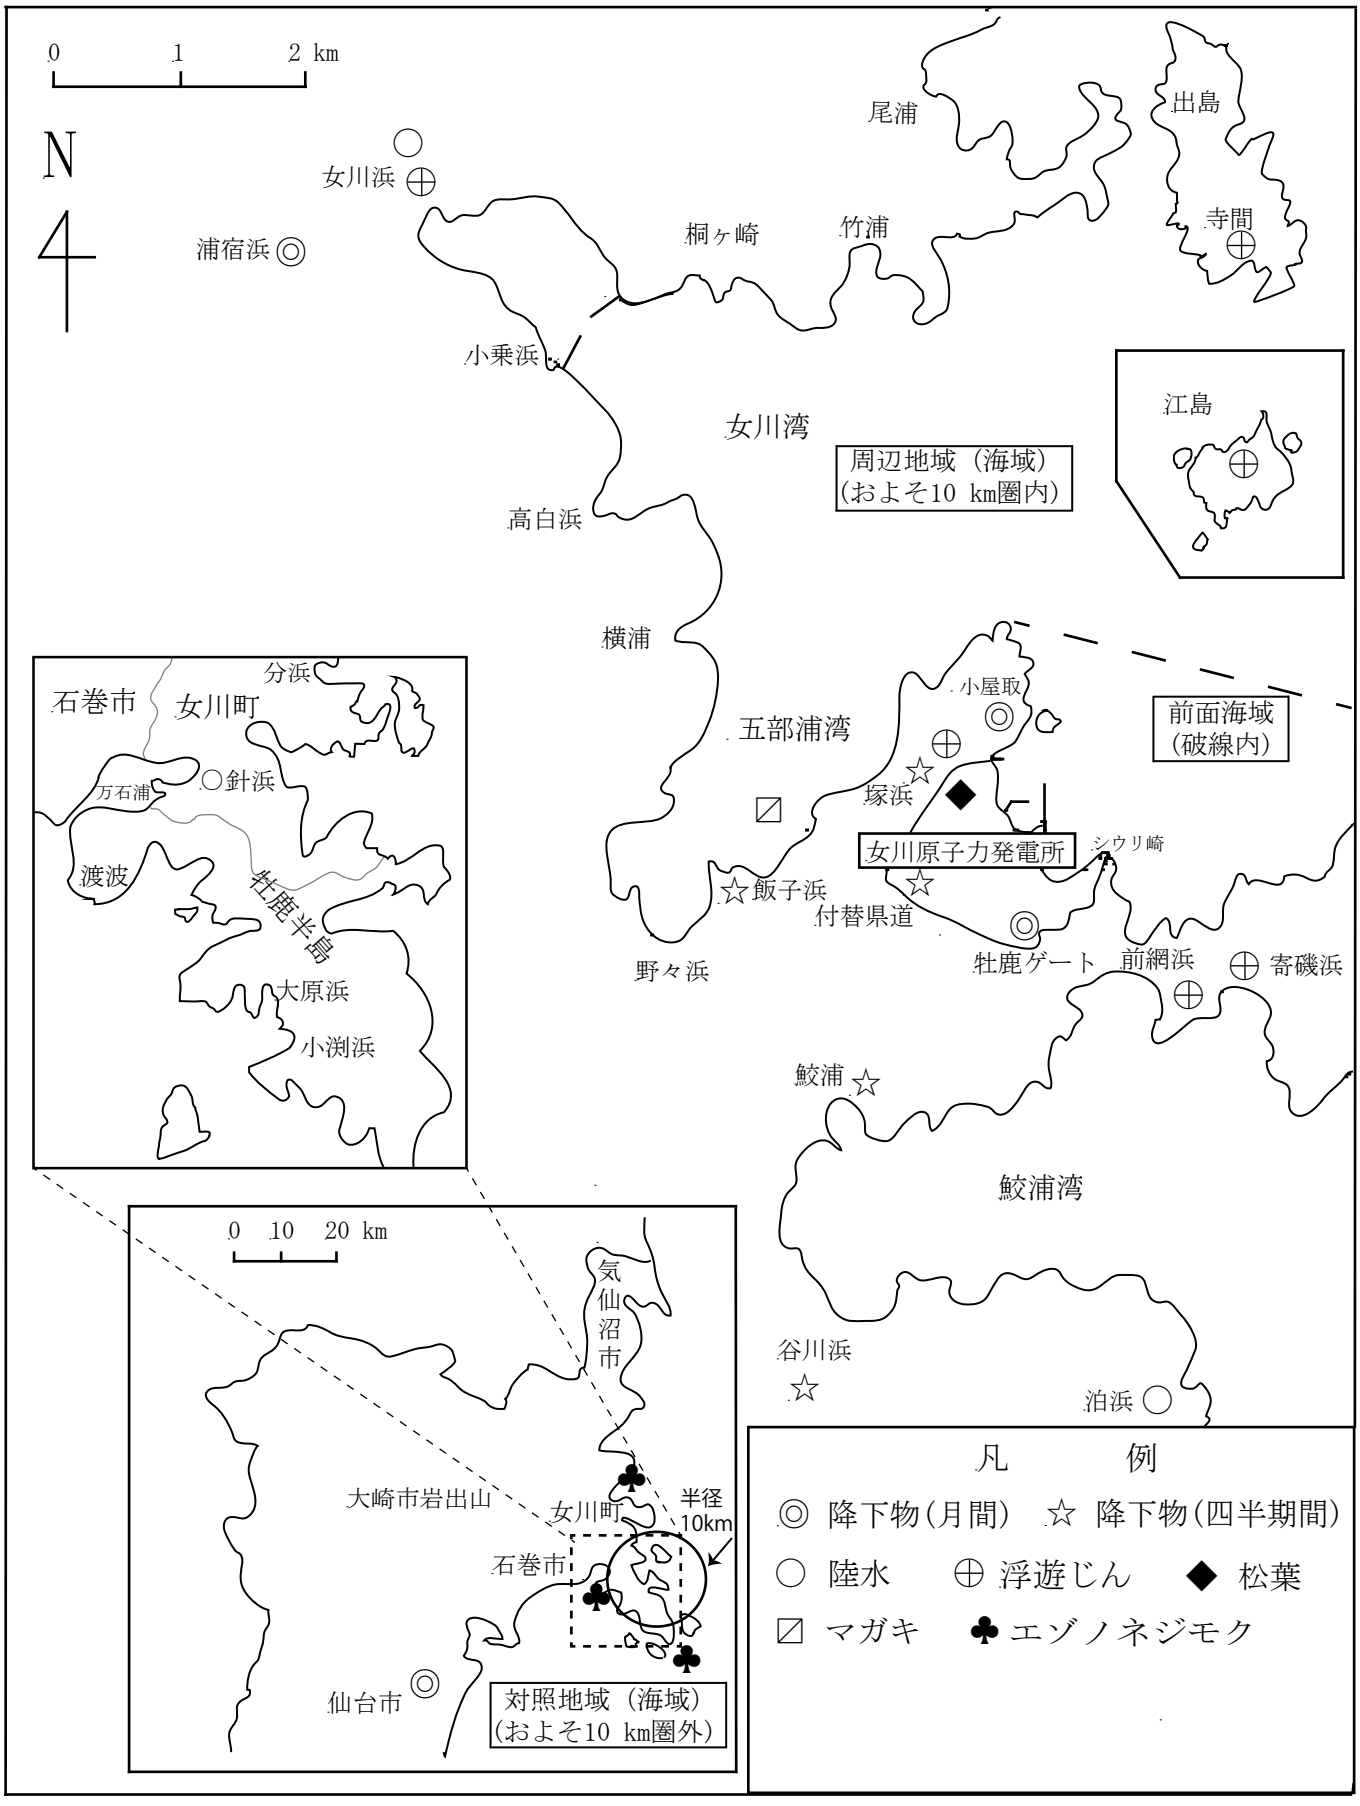

図－１－３　環境試料採取地点（1）

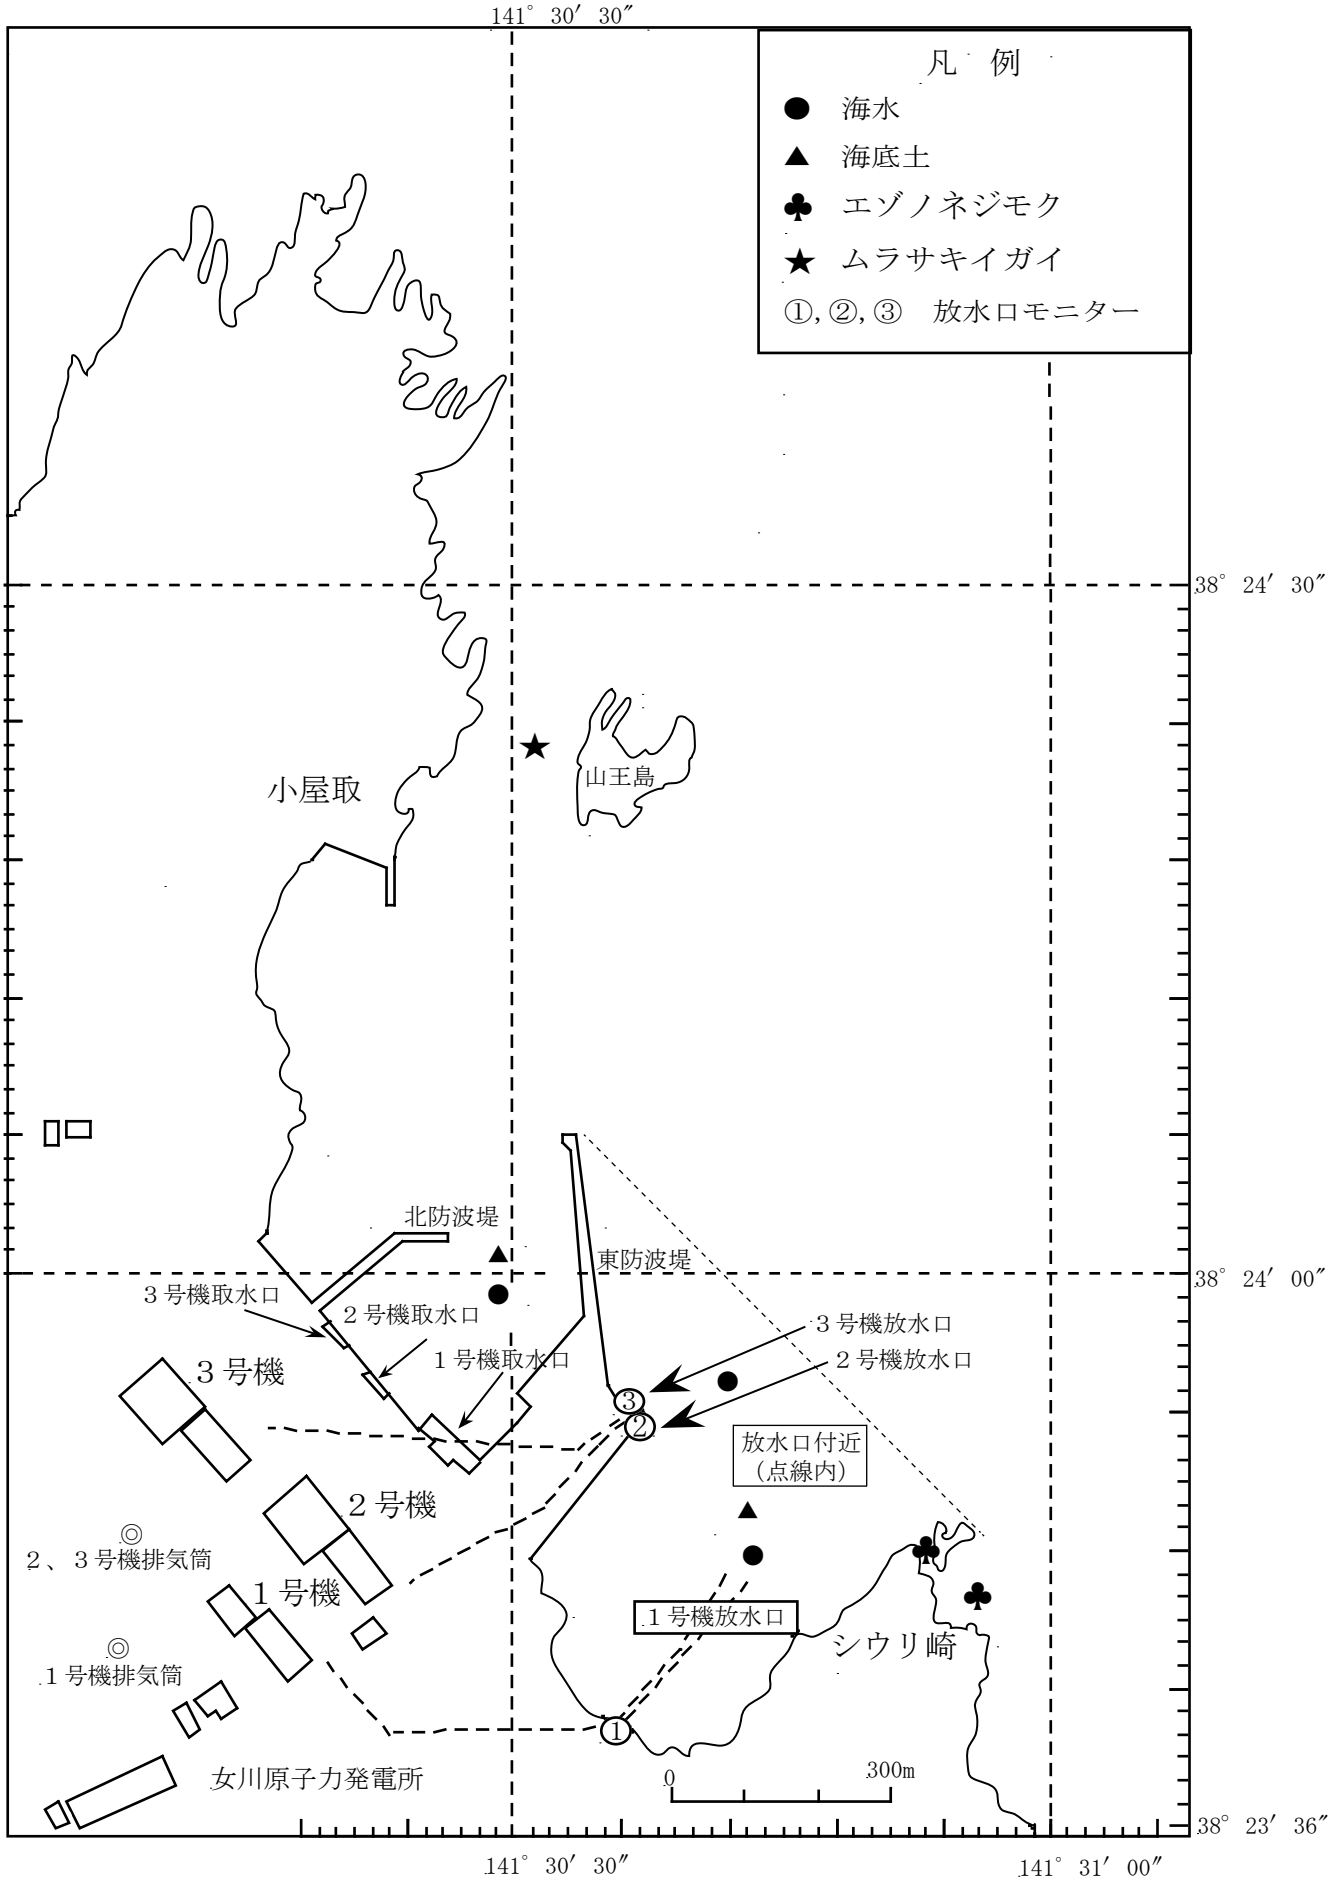

図－１－４　環境試料採取地点（2）

2　測定方法及び測定機器等

（１）測定方法及び測定機器

ア　環境試料の採取

「環境試料採取法（昭和５８年文部科学省）」による。

イ　大気浮遊じんの採取

調査機関	ダストサンプラー型式	流　量
宮　城　県	応用光研工業　S-2766　(女川局) 日立アロカメディカル　DSM-R41-22843　(寄磯局)	約30 L/分
東北電力㈱	日立アロカメディカル　DSM-RC41-20392	約150 L/分

ウ　モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の測定

調査機関	測　定　方　法		測　定　器
宮　城　県	① NaI(Tl) 検出器	NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない	検出器： 日立製作所　ADP-1132UR1型 3″φ×3″NaI(Tl)シンチレーション検出器（恒温装置付） スペクトロメータ： 日立製作所　ASM-1465型
	② 電離箱 検出器	電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法	検出器： 日立製作所　RIC338型 Arガス封入球形加圧電離箱検出器（有効容積 約14L、ステンレス製）（寄磯局以外） アロカ　RIC348型 Ar及びN_2ガス封入球形加圧電離箱検出器（有効容積 約14L、アルミ合金製）（寄磯局）
	③ データ 収　集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	
東北電力㈱	① NaI(Tl) 検出器	NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない	検出器： アロカ　ADP-1132UR1型 3″φ×3″ NaI(Tl)シンチレーション検出器（恒温装置付） スペクトロメータ： アロカ　ASM-RC41型
	② 電離箱 検出器	電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法	検出器： アロカ　RIC338型 Arガス封入球形加圧電離箱検出器（有効容量 約14L、ステンレス製）
	③ データ 収　集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	

(参考)　広域モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の測定

調査機関	測　定　方　法		測　定　器
宮 城 県	① 電離箱検出器	電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法	検出器： 富士電機　NCE207K1型 Ar及びN_2ガス封入球形加圧電離箱検出器、有効容積　約14L
	② データ収　集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	

エ　海水(放水)中の全ガンマ線計数率の測定

調査機関	測　定　方　法		測　定　器
東北電力㈱	① NaI(Tl)検出器	１号機 放水路内に設置した検出器で、海水（放水）の全ガンマ線計数率を連続的に測定する方法 ２、３号機 放水路から陸上に設置した遮へい容器に海水（放水）を汲み上げ、検出器で全ガンマ線計数率を連続的に測定する方法	1号機：日立製作所 2″φ×2″NaI(Tl)シンチレーション検出器 2号機：アロカ 3″φ×3″NaI(Tl)シンチレーション検出器 3号機：アロカ 3″φ×3″NaI(Tl)シンチレーション検出器
	② データ収　集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	

オ　大気中の放射性物質の濃度の測定

調査機関	測　定　方　法		測　定　器
宮 城 県	① ダストモニタ	大気浮遊じんを連続採取し、全アルファ放射能濃度と全ベータ放射能濃度を連続測定する方法	検出器：アロカ　MDR-3000型 全アルファ放射能濃度： ZnS(Ag)シンチレーション検出器 全ベータ放射能濃度： プラスチックシンチレーション検出器
	② データ収　集	テレメータシステムによる１時間ごとのデータ収集	

カ　空間ガンマ線積算線量の測定

調査機関	測　定　方　法	測　定　器	読み取り装置の校正
宮 城 県	各地点（モニタリングポイント及びモニタリングステーション）に3本(3素子)の蛍光ガラス線量計（RPLD）素子を配置し、3か月間の積算線量を測定する方法 測定値は90日換算値で表す	AGCﾃｸﾉｸﾞﾗｽ FGD252	Cs-137(3.7GBq) 標準照射装置による。
東北電力㈱		AGCﾃｸﾉｸﾞﾗｽ FGD-202S	Cs-137(18.5GBq) 標準照射装置による。

キ　移動観測車による空間ガンマ線量率の測定

調査機関	測　定　方　法	測　定　器
宮 城 県	NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を測定する方法 、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない。	検出器： アロカ　ADP-1132 UR1型 3″φ×3″ NaI(Tl)シンチレーション検出器、温度補償型 スペクトロメータ： アロカ　ASM-1465型
東北電力㈱		検出器： 日立製作所　ADP-1132型 3″φ×3″ NaI(Tl)シンチレーション検出器、温度補償型 スペクトロメータ： 日立製作所　ASM-1306型

ク　ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

①　測定方法

「ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー（令和2年4訂 原子力規制庁）」による。

測定試料		試　料　形　態	測定供試料量 *1	計測時間	報告単位
農　産　物		灰化物	灰 20g以上	30000～80000秒	Bq/kg生
陸　　水		蒸発濃縮物	10L以上		mBq/L
陸　　土		乾　土	乾土 100g程度		Bq/kg乾土
浮 遊 じ ん		宮城県：ろ紙 HE-40T、CP-20 東北電力：ろ紙 HE-40T 灰化	1000m^3以上		mBq/m^3
降下物	月　間	蒸発濃縮物	0.5m^2以上		Bq/m^2
	四半期間	蒸発濃縮物	0.166m^2以上		
指 標 植 物		灰化物	灰 20g以上		Bq/kg生
魚 介 藻 類		灰化物	灰 20g以上		Bq/kg生
海　　水		共沈法：AMP-MnO_2共沈物	20L以上		mBq/L
		迅速法：未処理海水 *2	2L		mBq/L
海　底　土		乾　土	乾土 100g程度		Bq/kg乾土
指標海産物		灰化法：灰化物	灰 20g以上		Bq/kg生
		迅速法：生または乾燥物 *3	生 1kg相当以上		

*1　降下物の測定供試料量の欄は、試料採取容器の開口部面積を表す。

*2　I(ヨウ素)-131も測定対象とするため。

*3　I-131を測定対象とするため。対象はアラメ及びエゾノネジモクのみ。

②　測定器

調査機関	測　定　器
宮 城 県	オルテック　高純度Ge半導体検出器（相対効率＊ 28%、31%）
	セイコーＥＧ＆Ｇ　MCA-7a型多重波高分析装置
東北電力㈱	ｾﾐｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ｷｬﾝﾍﾞﾗ GC3518型高純度Ge半導体検出器（相対効率＊ 39%、40% 2台）
	ｾﾐｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ｷｬﾝﾍﾞﾗ LYNX-MCA型多重波高分析装置

＊　相対効率とは、距離25cmにおけるCo-60の1.33MeVガンマ線に対する3″φ×3″NaI(Tl)の効率に対する相対値を表す。

ケ　ストロンチウム―９０の分析

調査機関	分　析　方　法	測　　定　　器
宮 城 県	「放射性ストロンチウム分析法(令和7年5訂 原子力規制庁)」による。	低バックグラウンド放射能自動測定装置 アロカ　LBC-5102
東北電力㈱		低バックグラウンド放射能自動測定装置 日立アロカメディカル　LBC-4601

コ　トリチウムの分析

調査機関	分　析　方　法	測　　定　　器
宮 城 県	「トリチウム分析法(令和5年3訂 原子力規制庁)」による。	低バックグラウンド液体シンチレーション カウンター 日立アロカメディカル　LSC-LB 7
東北電力㈱		低バックグラウンド液体シンチレーション カウンター 日立製作所　LSC-LB 7

サ　気象観測

調査機関	観　測　方　法	観　測　装　置
宮 城 県	主に「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針(平成13年一部改訂　原子力安全委員会)」による。	風向風速計　ANEOS（株）　WS-BN6型 雨雪量計　ANEOS（株）　RS-A52型 感雨雪計　ANEOS（株）　NS-131型 温 度 計　ANEOS（株）　TS-3D1型 日 射 計　ANEOS（株）　MS-60C型 放射収支計　ANEOS（株）　MF-11型 土壌水分計　ANEOS（株）　DIK-321B-BS2型
東北電力㈱		風向風速計　ANEOS（株）　WS-BN6型 雨雪量計　ANEOS（株）　RS-A52型 感雨雪計　ANEOS（株）　NS-131型

(参考)　広域モニタリングステーションの気象観測

調査機関	観　測　方　法	観　測　装　置
宮 城 県	主に「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針(平成13年一部改訂　原子力安全委員会)」による。	風向風速計　ANEOS（株）　WS-BN6型 雨雪量計　ANEOS（株）　RS-A52型 感雨雪計　ANEOS（株）　NS-131型

（２）検出下限値、数値及びトレンドグラフの表し方

ア　検出下限値

①　ゲルマニウム半導体検出器による分析

検出下限値は、試料の測定値（正味計数）の統計誤差（計数誤差）の3倍とする。

②　Sr（ストロンチウム）-90及びH-3（トリチウム）の分析

検出下限値は、試料の測定値の統計誤差の3倍とする。

イ　数値の表し方

本報告書では、測定結果は以下の規定に従って表示する。数値の丸め方は、表示数値を（n）桁とする場合、（n+1）桁まで計算し（n+1）桁目を四捨五入する。

①　環境放射線

（ア）RPLDによる90日または365日間の空間ガンマ線積算線量のデータは、ミリグレイ単位で小数点以下2桁目まで表示する。

（イ）空間ガンマ線量率のデータは、ナノグレイ毎時単位で小数点以下1桁目まで表示する。

（ウ）降水量は、最少計量単位である0.5㎜以上の降水（雨雪）量を表示する。

（エ）感雨は、感雨（雪）のないときは「 」（空白）とし、感雨（雪）があったときは「○」（まる）を表示する。

（オ）測定対象外の項目は「／」(斜線)、欠測した時は「－」(ハイフン)とする。

②　環境放射能

（ア）データはすべて統計誤差（1σ）を併記する。

（イ）測定値の表示桁数は2桁とし、統計誤差は測定値の最下位桁まで表示する（例1、2）。

（例1）69.07±14.32　→　69±14

（例2）69.07±1.432　→　69±1

（ウ）測定値の最上位桁に比べて統計誤差の最上位桁が3桁目以下の場合、測定値は統計誤差の最上位桁と同じ位まで表示し、統計誤差は、最上位桁のみを表示する（例3、4）。

ただし、統計誤差を丸めた結果、位が上がり桁数が増えた場合は、統計誤差を2桁表示する（例5）。

（例3）69.07±0.1432　→　69.1±0.1

（例4）69.07±0.01432　→　69.07±0.01

（例5）69.07±0.964　→　69.1±1.0

（エ）測定対象外の項目は「／」（斜線）、欠測した項目は「 」(空白)とする。

（オ）測定結果が検出下限値よりも小さいものは「ND」（Not Detected）とする。

ただし、ゲルマニウム半導体検出器による核種分析結果においては、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

（カ）測定時間はライブタイムで表示し、単位は「秒」とする。

（キ）陸土の分析結果の換算係数は、Bq/kg乾土からBq/㎡への乗数を表す。

③　海水放射線

単位はcpmとし、整数値で表す。

ウ　放射性物質の降下量及び環境試料の放射性核種濃度のトレンドグラフの表し方

福島第一原発事故前後の長期的な推移を視覚的に把握するため、事故前及び事故後に検出下限値以上の値が確認された試料に対してトレンドグラフを作成し、検出下限値未満又は欠測の場合はグラフに表示しない。

3　測定結果

（1）モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率測定結果

表－３－１－１　　1 月における空間ガンマ線量率測定結果 （1）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	女　川							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量	感　雨
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	(mm)	有無
1	30.8	29.4	28.0	71.7	68.8	66.2		
2	30.0	28.6	27.9	71.1	68.4	65.7		
3	30.4	28.8	27.9	71.3	68.6	65.4		
4	28.6	27.9	27.2	70.7	67.4	65.3		○
5	31.7	28.5	27.4	72.3	68.2	65.5		○
6	32.3	28.6	27.0	71.7	67.9	64.7		○
7	29.7	28.6	27.5	70.6	68.0	65.9		
8	32.3	29.8	28.5	72.5	69.5	66.7		○
9	30.2	28.5	27.0	71.0	67.8	65.2		○
10	29.8	28.8	27.8	71.4	68.5	66.3		
11	33.3	29.4	28.5	74.2	70.0	66.6		○
12	35.2	29.0	27.4	75.5	68.1	65.1		○
13	33.6	29.4	28.3	72.8	69.4	66.8		○
14	30.3	28.6	27.3	71.5	68.0	65.3		○
15	47.8	29.8	26.8	86.7	69.3	65.2	1.0	○
16	33.9	29.2	28.0	73.9	68.9	65.8	0.5	○
17	35.8	29.3	28.0	75.3	68.9	66.2		○
18	28.7	27.6	26.9	69.0	66.6	64.1		
19	32.9	29.5	27.2	72.4	68.9	65.0		○
20	30.0	28.9	27.8	70.7	67.0	64.0		○
21	29.2	28.3	27.6	69.2	66.8	64.5		
22	30.4	28.7	27.9	70.9	67.8	65.7		○
23	29.3	28.3	27.6	69.9	67.3	64.7		○
24	31.4	29.5	28.5	72.2	69.0	66.3		○
25	29.6	28.7	27.8	70.9	68.5	66.2		
26	29.7	28.7	27.3	70.8	67.9	65.0		○
27	33.6	29.3	28.0	73.3	69.1	66.6		○
28	29.1	28.3	27.3	70.2	67.9	65.6		○
29	29.9	28.7	27.5	71.5	68.4	64.9		○
30	29.2	28.4	27.5	70.5	68.0	65.6		
31	29.9	28.7	27.6	70.8	68.1	66.0		○
月　間	47.8	28.8	26.8	86.7	68.3	64.0	1.5	
標 準 偏 差		1.2			1.6			
欠測率（%）		0.0			0.0			

令和7年度

表－３－１－１　　１月における空間ガンマ線量率測定結果　（２）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	飯子浜							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感雨
	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	44.4	43.1	41.9	86.7	83.9	81.2		
2	43.4	42.3	41.4	87.5	83.5	80.7		
3	43.4	42.4	41.3	86.1	83.5	80.7		
4	43.5	42.1	41.2	85.6	82.8	79.9		
5	46.7	42.7	41.4	90.1	83.8	80.4		
6	45.5	42.4	41.1	87.7	83.3	80.3		
7	42.9	41.9	41.2	85.4	82.8	79.6		
8	48.5	43.7	41.8	90.4	84.9	80.6		
9	44.2	42.1	41.2	86.6	82.9	79.9		
10	43.1	42.2	41.5	87.2	83.3	80.3		
11	49.6	43.3	42.2	90.4	85.1	81.6		
12	52.1	43.4	41.8	93.6	84.2	80.3		
13	48.6	43.2	41.9	90.0	84.5	80.4		
14	45.8	42.9	41.5	88.4	83.7	79.3		
15	57.3	43.8	41.3	97.0	84.6	80.3		
16	48.7	43.2	41.7	92.3	84.2	80.7		
17	44.5	42.9	42.1	86.7	83.8	80.6		
18	42.8	41.9	41.0	85.2	82.5	79.2		
19	45.0	42.6	41.2	86.2	83.3	80.1		
20	46.1	43.1	42.1	87.3	82.5	78.7		
21	43.2	42.4	41.5	86.0	82.3	79.0		
22	44.5	42.7	41.9	86.7	83.0	80.4		
23	43.1	42.3	41.6	85.8	82.5	79.6		
24	44.2	42.8	42.0	86.4	83.3	80.0		
25	43.8	42.6	41.7	86.4	83.5	81.0		
26	43.9	42.6	41.5	87.0	83.0	79.9		
27	46.1	42.6	41.4	87.9	83.2	80.4		
28	43.1	42.4	41.6	85.6	82.9	79.9		
29	43.5	42.5	41.5	85.7	83.3	80.4		
30	43.4	42.4	41.6	86.7	83.2	79.7		
31	44.0	42.6	41.4	86.9	83.3	80.7		
月　間	57.3	42.7	41.0	97.0	83.4	78.7		
標準偏差	1.2			1.7				
欠測率（%）	0.0			0.0				

令和7年度

表－３－１－１　　１月における空間ガンマ線量率測定結果　（３）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	小屋取							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感雨
	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	49.7	48.2	46.7	88.9	85.6	82.3		○
2	48.1	47.4	46.6	88.1	85.2	83.1		
3	48.5	47.5	46.6	87.9	85.3	82.2		○
4	48.7	47.3	46.1	88.4	84.6	82.0		○
5	50.5	47.3	46.0	88.7	84.8	81.2		○
6	51.2	47.0	45.7	89.1	84.1	81.3		○
7	47.3	46.4	45.5	86.8	83.6	80.4		
8	51.1	47.9	46.2	89.2	85.5	82.6		○
9	48.6	46.6	45.7	88.2	84.0	80.2		○
10	48.6	47.4	45.9	87.4	84.8	81.9		
11	51.9	48.5	47.3	90.5	86.6	83.0		○
12	61.7	49.0	46.6	98.3	86.1	81.8		○
13	52.9	47.8	46.4	91.3	85.5	81.6		○
14	51.1	47.5	45.7	88.5	84.7	80.9		○
15	60.5	48.4	45.5	98.0	85.3	80.5	1.0	○
16	56.0	48.2	46.3	92.3	85.3	82.6	0.5	○
17	51.2	48.3	47.4	89.7	85.3	82.3		○
18	48.1	47.2	46.0	86.4	84.0	80.8		
19	49.7	47.5	46.2	88.3	84.5	81.6		○
20	51.1	47.9	47.1	89.2	83.5	79.6		○
21	48.0	47.2	46.5	85.8	83.4	81.1		
22	49.4	47.6	46.7	88.3	84.4	80.6		○
23	48.5	47.3	46.6	87.2	83.9	81.0		○
24	49.4	48.0	47.0	88.5	85.1	82.0		○
25	49.0	47.9	46.8	88.9	85.0	80.9		
26	48.2	47.4	46.1	87.7	83.9	79.9		○
27	50.7	47.3	46.3	89.8	84.5	81.7		○
28	47.8	47.1	46.4	86.5	84.0	80.8		○
29	48.2	47.1	46.2	87.6	84.3	81.6		○
30	47.9	47.1	46.0	87.5	84.3	81.2		
31	48.9	47.7	46.8	87.9	84.8	82.1		○
月　間	61.7	47.6	45.5	98.3	84.7	79.6	1.5	
標準偏差	1.2			1.7				
欠測率（%）	0.0			0.0				

令和7年度

表－３－１－１　　１月における空間ガンマ線量率測定結果　（４）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	寄磯 NaI(Tl) 最大	NaI(Tl) 平均	NaI(Tl) 最小	電離箱 最大	電離箱 平均	電離箱 最小	降水量 (mm)	感雨 有無
1	37.1	35.8	34.5	80.4	77.8	75.3		○
2	36.0	35.0	34.3	82.3	77.2	74.7		
3	35.9	35.2	34.3	80.2	77.2	73.9		
4	36.1	34.9	34.0	79.4	76.7	74.2		○
5	39.0	35.4	34.4	80.8	77.2	73.6		○
6	37.0	35.1	34.0	79.5	76.6	73.3		○
7	35.8	34.6	33.9	79.1	76.2	73.7		
8	37.9	36.1	34.6	81.3	78.3	73.8		○
9	37.1	34.8	33.9	80.3	76.3	73.4		○
10	36.2	35.2	34.4	80.4	77.1	73.6		
11	38.3	35.9	34.8	82.9	78.6	75.8		○
12	40.3	35.6	34.3	83.3	77.0	74.4		○
13	38.9	35.8	34.7	81.7	78.1	74.4		○
14	37.8	35.6	34.1	81.1	77.4	74.1		○
15	45.6	36.4	33.8	88.9	77.9	72.7	0.5	○
16	41.0	36.1	34.7	83.2	78.1	75.2		○
17	37.2	35.8	34.9	80.6	77.3	74.7		○
18	35.7	34.6	33.9	78.3	75.8	72.2		
19	37.4	35.4	34.1	81.0	77.0	72.9		○
20	37.9	35.7	34.7	82.7	76.0	72.9		○
21	35.9	35.1	34.4	78.5	75.7	73.1		
22	36.3	35.3	34.6	79.3	76.6	74.0		○
23	35.9	34.9	34.3	79.3	76.1	73.0		○
24	36.9	35.6	34.7	80.4	77.0	74.0		○
25	36.1	35.3	34.7	81.3	76.9	74.2		
26	36.2	35.3	34.2	81.4	76.4	73.2		○
27	38.3	35.4	34.6	80.6	76.8	74.2		○
28	35.8	35.1	34.3	79.5	76.5	74.1		
29	35.9	35.3	34.5	79.5	76.8	73.9		○
30	35.8	35.1	34.4	81.6	76.6	73.9		
31	36.2	35.3	34.3	79.3	76.6	73.0		○
月　間	45.6	35.4	33.8	88.9	77.0	72.2	0.5	
標準偏差		0.9			1.6			
欠測率（%）		0.0			0.0			

令和7年度

表－３－１－１　　１月における空間ガンマ線量率測定結果　（５）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	鮫浦							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感雨
	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	53.4	51.4	50.2	103.4	99.6	95.6		○
2	51.7	50.7	49.8	103.9	98.8	95.4		○
3	51.5	50.7	49.7	101.8	99.0	95.3		○
4	52.5	50.7	49.8	103.2	98.6	94.9		○
5	57.6	51.4	49.6	106.7	99.4	94.7		○
6	54.8	50.9	49.5	103.2	98.8	95.1		○
7	51.1	50.3	49.6	102.2	98.2	94.8		
8	57.0	52.0	50.2	106.4	100.2	96.5		○
9	52.3	50.5	49.6	102.7	98.2	95.2		
10	51.9	50.8	49.9	102.4	98.6	95.4		
11	59.3	52.0	50.5	107.9	100.5	97.0		○
12	62.1	52.0	49.6	112.5	99.5	94.6		○
13	56.4	51.4	50.1	107.7	99.8	96.3		○
14	54.5	51.4	49.7	104.6	99.2	94.0		○
15	63.9	52.2	49.7	111.9	100.0	95.4	0.5	○
16	55.2	51.5	50.4	104.0	99.5	95.8		○
17	52.7	51.4	50.2	103.9	99.1	94.8		○
18	51.2	50.4	49.6	101.0	97.6	94.6		
19	53.0	51.1	49.9	103.1	98.7	94.7		○
20	54.1	51.5	50.1	102.3	98.0	93.5		○
21	51.9	51.0	49.9	100.6	97.6	94.1		
22	55.7	51.2	50.2	104.5	98.4	94.1		○
23	51.7	50.8	50.0	101.5	98.2	94.1		○
24	52.4	51.3	50.4	102.7	98.7	95.4		○
25	52.1	51.1	50.2	101.8	98.7	95.6		
26	51.9	51.1	50.1	101.9	98.1	94.9		○
27	54.0	51.1	50.1	103.7	98.8	95.2		○
28	51.7	50.9	50.1	103.1	98.6	94.5		○
29	51.9	51.1	50.2	101.4	98.6	95.6		○
30	52.1	51.0	50.3	101.2	98.4	94.8		
31	52.5	51.2	50.4	102.5	98.5	95.4		
月　間	63.9	51.2	49.5	112.5	98.8	93.5	0.5	
標準偏差	1.2			1.8				
欠測率（%）	0.0			0.0				

令和7年度

表－３－１－１　　１月における空間ガンマ線量率測定結果　（６）

単位：nGy/h

局	谷　川							
項目	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感雨
日	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	50.1	48.9	47.6	85.0	82.6	80.2		
2	49.3	48.4	47.6	83.8	82.1	79.9		
3	49.8	48.5	47.6	85.2	82.3	79.4		
4	50.0	48.4	47.1	84.3	81.9	79.9		
5	57.8	49.1	47.6	90.6	82.8	79.8		
6	51.5	48.5	47.2	85.5	81.9	79.0		
7	49.5	48.2	47.1	83.9	81.6	80.0		
8	56.2	49.8	48.2	89.2	83.5	80.4		
9	50.2	48.3	47.4	84.6	81.6	79.4		
10	49.6	48.7	47.5	84.4	82.3	80.0		
11	55.8	49.7	48.2	89.4	83.9	81.1		
12	61.9	49.8	47.4	96.1	83.2	79.7		
13	51.7	49.2	48.1	86.5	83.1	80.6		
14	52.4	49.1	47.4	85.9	82.5	80.2		
15	60.5	49.7	47.3	94.2	83.0	77.4		
16	51.5	49.2	47.9	85.2	82.7	80.3		
17	50.1	49.2	48.4	84.6	82.5	80.2		
18	49.0	48.3	47.2	83.2	81.1	79.0		
19	52.4	49.4	47.8	86.9	82.4	79.3		
20	50.1	49.1	48.1	84.9	81.2	78.4		
21	49.3	48.6	47.7	83.2	81.1	78.8		
22	50.0	48.7	48.0	84.5	81.7	79.8		
23	49.7	48.6	47.7	83.5	81.3	79.2		
24	50.4	49.3	48.4	85.2	82.5	80.2		
25	49.8	48.9	48.0	85.1	82.2	80.6		
26	49.8	49.0	47.8	83.8	81.9	79.6		
27	52.6	49.1	47.9	87.2	82.5	80.2		
28	49.8	48.7	48.0	84.7	81.9	79.7		
29	49.9	49.0	48.0	84.6	82.3	80.4		
30	49.7	48.8	47.9	83.8	81.9	79.7		
31	49.7	48.9	48.0	84.3	82.1	80.3		
月　間	61.9	48.9	47.1	96.1	82.3	77.4		
標準偏差	1.1			1.5				
欠測率（%）	0.0			0.0				

令和7年度

表－３－１－１　　１月における空間ガンマ線量率測定結果　（７）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	荻　浜							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感　雨
	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	57.1	55.4	53.9	93.1	89.8	87.1		
2	55.8	54.9	54.1	92.8	89.6	86.8		○
3	56.2	55.0	53.7	91.9	89.5	87.3		
4	56.2	54.8	53.9	92.1	89.0	86.8		○
5	58.6	55.3	54.0	93.6	89.8	87.8		○
6	58.8	55.0	54.0	93.5	89.2	86.5		○
7	55.6	54.7	53.8	91.2	89.0	86.6		
8	67.0	56.4	54.3	101.9	91.1	86.4		○
9	56.7	54.8	53.7	92.8	88.8	86.1		○
10	56.1	55.1	54.0	91.8	89.6	87.0		
11	62.1	56.2	54.7	97.3	91.2	88.6		○
12	68.8	56.3	53.9	101.2	90.3	86.9	0.5	○
13	60.1	55.9	54.6	95.1	90.5	87.9		○
14	58.7	55.6	53.9	93.5	89.7	86.9		○
15	67.7	56.4	53.7	102.2	90.6	86.5	0.5	○
16	59.7	55.7	54.7	94.3	90.2	87.7		○
17	57.1	55.6	54.8	92.7	89.7	87.8		○
18	55.6	54.7	53.8	90.5	88.3	86.7		
19	57.3	55.6	54.0	93.6	89.8	86.6		○
20	57.0	55.6	54.6	92.4	88.5	85.4		○
21	55.9	55.1	54.1	91.0	88.2	85.9		
22	56.8	55.3	54.2	91.9	88.9	86.0		○
23	56.2	55.0	54.2	91.0	88.6	86.7		○
24	56.7	55.5	54.7	92.3	89.5	86.8		○
25	56.4	55.3	54.4	91.8	89.6	87.7		
26	56.1	55.3	54.1	91.2	89.0	86.8		○
27	59.2	55.5	54.6	93.1	89.6	86.8		○
28	56.0	55.1	54.2	90.7	89.1	86.9		○
29	56.4	55.3	54.3	92.4	89.2	87.1		○
30	56.1	55.2	54.2	92.1	89.2	87.2		○
31	56.3	55.4	54.1	92.1	89.2	86.7		○
月　間	68.8	55.4	53.7	102.2	89.5	85.4	1.0	
標準偏差	1.2			1.5				
欠測率（%）	0.0			0.0				

令和7年度

表－３－１－１　　1月における空間ガンマ線量率測定結果（８）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	塚浜 NaI(Tl) 最大	NaI(Tl) 平均	NaI(Tl) 最小	電離箱 最大	電離箱 平均	電離箱 最小	降水量 (mm)	感雨 有無
1	49.5	48.2	47.1	80.7	78.8	77.0		
2	48.2	47.5	47.0	79.6	78.3	77.1		
3	48.4	47.5	46.7	80.4	78.4	76.6		
4	48.3	47.4	46.6	79.5	78.0	76.4		
5	51.8	47.9	46.9	82.8	78.7	76.3		
6	51.7	47.7	46.4	82.3	78.2	75.9		
7	47.8	47.0	46.4	79.9	77.5	75.8		
8	51.9	48.7	47.0	82.5	79.5	77.6		
9	49.3	47.3	46.6	79.6	77.5	75.5		
10	48.2	47.5	46.8	80.2	78.1	76.6		
11	52.6	48.5	47.4	83.7	79.9	78.3		
12	61.2	49.0	47.2	90.2	79.3	76.6		
13	54.6	48.6	47.0	85.3	79.5	76.6		
14	52.0	48.4	46.9	83.2	78.9	76.2		
15	63.8	49.4	46.8	93.3	79.7	76.2		
16	57.9	48.8	47.2	90.0	79.4	77.0		
17	51.0	48.4	47.5	82.2	78.8	77.3		
18	48.2	47.3	46.7	78.8	77.3	75.6		
19	50.6	48.0	46.7	80.7	78.3	76.0		
20	51.5	48.6	47.4	82.2	77.8	75.0		
21	48.5	47.9	47.2	79.1	77.2	75.7		
22	50.0	48.2	47.3	80.1	78.0	76.6		
23	48.7	47.7	47.1	79.0	77.4	75.7		
24	49.3	48.1	47.4	79.9	78.3	76.1		
25	49.1	48.0	47.5	79.9	78.4	76.3		
26	48.9	48.0	47.2	79.6	77.9	76.4		
27	51.7	48.0	47.1	81.5	78.3	76.6		
28	48.8	47.8	47.1	79.6	78.1	76.3		
29	48.7	47.9	47.1	79.9	78.1	76.5		
30	48.8	47.9	47.2	79.7	78.1	76.9		
31	50.0	48.1	47.4	79.8	78.2	76.5		
月　間	63.8	48.0	46.4	93.3	78.4	75.0		
標準偏差		1.3			1.5			
欠測率（%）		0.6			0.6			

令和7年度

表－３－１－１　　1月における空間ガンマ線量率測定結果（９）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	寺間 NaI(Tl) 最大	寺間 NaI(Tl) 平均	寺間 NaI(Tl) 最小	寺間 電離箱 最大	寺間 電離箱 平均	寺間 電離箱 最小	降水量 (mm)	感雨 有無
1	39.7	38.7	37.7	75.7	73.8	72.1		○
2	38.7	38.1	37.4	75.1	73.3	71.2		
3	38.8	38.1	37.3	75.2	73.3	71.8		
4	38.4	37.8	37.1	74.5	72.6	71.1		○
5	39.8	38.2	37.3	75.3	73.3	71.2		○
6	40.4	38.1	37.2	75.6	72.9	70.5		○
7	38.4	37.6	37.1	74.8	72.4	70.8		
8	44.2	39.5	37.7	79.2	74.7	71.8		○
9	40.0	37.9	36.9	76.6	72.6	70.6		
10	38.9	38.1	37.6	75.3	73.1	71.2		
11	44.3	39.2	38.1	80.4	75.0	72.7		○
12	49.6	39.3	37.6	83.6	74.0	70.8		○
13	43.0	39.0	37.9	78.3	74.3	71.9		○
14	41.4	38.8	37.4	77.1	73.5	71.1		○
15	57.6	40.0	37.2	92.9	74.7	70.1	1.0	○
16	44.9	39.1	37.8	79.9	74.1	72.2	0.5	○
17	44.5	39.1	38.2	78.8	73.8	70.9		○
18	38.6	37.7	37.3	74.2	71.9	70.1		
19	39.8	38.2	37.2	75.1	72.8	70.5		○
20	39.9	38.6	37.4	75.6	71.9	68.8	0.5	○
21	38.9	38.3	37.7	73.6	71.9	70.3		
22	40.0	38.5	37.8	74.9	72.7	70.8		○
23	38.6	38.1	37.6	73.8	72.2	70.7		○
24	40.5	38.8	38.0	75.7	73.2	71.3		○
25	39.4	38.5	38.0	75.5	73.2	71.7		
26	39.3	38.5	37.6	74.6	72.7	70.8		○
27	42.0	38.4	37.4	77.5	73.1	70.8		○
28	39.1	38.2	37.7	75.4	72.8	71.4		○
29	39.0	38.3	37.6	74.9	72.9	71.5		○
30	39.2	38.3	37.7	74.7	73.0	71.1		
31	40.1	38.6	37.8	75.4	73.1	71.2		○
月　間	57.6	38.5	36.9	92.9	73.2	68.8	2.0	
標準偏差		1.3			1.5			
欠測率（%）		0.7			0.7			

令和7年度

表－３－１－１　　1月における空間ガンマ線量率測定結果（１０）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	江島							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感雨
	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	34.9	34.0	32.9	66.6	65.2	63.6		
2	33.7	33.1	32.4	65.6	64.6	63.0		
3	34.1	33.3	32.5	66.1	64.7	63.1		
4	34.2	33.0	32.2	65.8	64.1	62.8		○
5	39.0	33.5	32.5	70.6	64.8	62.5		○
6	35.5	33.2	32.0	66.5	64.3	61.7	0.5	○
7	33.2	32.4	31.8	66.3	63.5	62.2		
8	36.7	34.5	32.8	68.7	65.9	63.8		○
9	35.2	32.9	31.9	66.3	63.8	62.3		
10	33.8	32.9	32.2	65.9	64.1	62.9		
11	40.3	34.3	33.1	72.4	66.3	64.0		○
12	39.3	34.0	32.7	72.1	65.0	62.9		○
13	37.6	33.7	32.5	68.7	65.2	63.2		○
14	37.0	34.0	32.7	69.2	64.9	62.9		○
15	43.0	34.1	32.1	74.2	65.2	62.5	0.5	○
16	39.9	34.2	33.0	70.5	65.3	63.3		○
17	35.7	34.0	33.0	68.0	64.9	63.2		○
18	33.8	32.8	32.2	65.0	63.4	61.8		
19	35.0	33.1	32.2	66.3	64.0	61.7		○
20	35.1	33.9	32.9	67.1	63.5	60.8		○
21	34.1	33.4	32.9	64.6	63.3	62.3		
22	35.7	33.8	33.3	67.3	64.3	62.7		○
23	33.7	33.2	32.6	64.9	63.7	62.2		○
24	35.0	33.6	32.9	66.0	64.3	62.7		○
25	34.4	33.6	33.0	66.3	64.6	63.2		
26	34.8	33.7	32.6	66.2	64.1	62.6		
27	39.3	33.6	32.5	69.7	64.4	62.0		○
28	34.3	33.3	32.8	65.9	64.1	62.8		
29	34.3	33.4	32.7	66.2	64.3	62.8		
30	34.3	33.5	32.8	65.8	64.4	62.5		
31	34.6	33.6	32.9	65.7	64.4	62.9		
月　間	43.0	33.5	31.8	74.2	64.5	60.8	1.0	
標準偏差	1.0			1.2				
欠測率（%）	0.7			0.7				

令和7年度

表－３－１－１　　1月における空間ガンマ線量率測定結果（１１）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	前網 NaI(Tl) 最大	前網 NaI(Tl) 平均	前網 NaI(Tl) 最小	前網 電離箱 最大	前網 電離箱 平均	前網 電離箱 最小	降水量 (mm)	感雨 有無
1	55.1	53.6	52.7	85.1	83.2	81.4		
2	53.8	53.1	52.6	84.8	83.0	81.5		
3	53.6	53.1	52.4	85.1	83.0	81.1		
4	54.3	53.1	52.2	85.1	82.5	80.6		
5	57.8	53.5	52.4	88.0	83.3	81.2		
6	56.3	53.3	52.2	86.4	82.6	80.5		
7	53.5	52.8	52.2	84.3	82.2	80.5		
8	57.1	54.1	52.7	87.7	84.0	82.1		
9	54.7	53.0	52.1	84.7	82.2	80.4		
10	53.8	53.2	52.4	85.1	82.9	81.0		
11	56.2	53.8	52.8	86.8	84.4	82.3		
12	65.4	54.4	52.4	93.8	83.7	80.9		
13	57.3	54.0	52.9	87.3	84.0	81.4		
14	56.8	53.8	52.3	86.5	83.3	80.9		
15	65.8	54.7	52.3	94.9	84.1	81.0		
16	59.8	54.1	53.0	89.9	83.7	82.1		
17	54.8	53.8	53.2	85.6	83.3	81.4		
18	53.9	53.0	52.1	83.5	82.0	80.7		
19	55.7	53.7	52.5	85.8	83.1	80.7		
20	56.5	53.9	52.8	86.9	81.9	79.4		
21	54.0	53.5	53.0	83.3	81.9	80.5		
22	56.0	53.7	53.0	85.6	82.7	81.0		
23	54.3	53.4	52.9	83.8	82.2	80.5		
24	54.7	53.8	53.0	84.7	83.0	81.4		
25	54.3	53.6	53.0	85.0	83.1	81.4		
26	54.4	53.7	52.9	84.3	82.5	81.0		
27	56.8	53.7	52.9	86.8	83.0	81.5		
28	54.0	53.4	52.8	84.8	82.7	81.3		
29	54.4	53.6	52.8	85.0	82.8	81.1		
30	54.5	53.6	52.6	84.5	82.9	81.4		
31	54.2	53.7	52.7	84.9	82.8	81.1		
月　間	65.8	53.6	52.1	94.9	83.0	79.4		
標準偏差		1.0			1.3			
欠測率（%）		0.3			0.3			

令和7年度

表－３－１－２　　２月における空間ガンマ線量率測定結果　（１）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	女　川							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感　雨
	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	30.5	28.6	27.7	72.2	68.2	66.3		○
2	30.1	28.6	28.0	71.1	68.5	66.2		○
3	30.1	28.3	27.5	70.8	68.1	65.2		
4	30.1	28.5	27.7	71.2	68.2	65.2		○
5	34.5	29.5	28.0	73.9	69.5	67.1	0.5	○
6	30.2	29.0	28.0	71.9	69.2	66.1		○
7	30.2	28.3	27.5	72.2	68.3	66.2		
8	30.6	28.9	28.2	71.8	69.5	66.8		○
9	29.8	28.2	27.2	72.0	68.3	65.6		○
10	29.7	28.3	27.3	72.2	68.1	65.4		
11	29.7	28.6	27.7	71.0	69.2	66.8		
12	29.5	28.8	28.1	71.9	69.1	66.7		○
13	29.8	28.5	27.7	71.3	68.8	66.1		
14	30.4	29.0	28.3	71.7	69.3	66.8		○
15	30.2	29.1	28.4	71.9	69.8	67.1		
16	30.1	29.3	28.6	72.5	69.5	66.8		
17	31.7	29.8	28.6	72.6	69.6	67.4		
18	39.6	30.1	28.5	79.7	70.6	67.8	0.5	○
19	29.6	28.3	27.2	72.1	68.5	65.7		○
20	29.3	28.3	27.2	71.3	68.3	65.9		
21	29.9	28.9	27.9	71.4	68.9	67.0		
22	30.5	28.9	27.7	72.0	69.1	66.4		
23	29.0	28.1	27.3	70.9	68.4	66.1		
24	29.5	28.6	27.4	71.6	68.2	66.0		○
25	39.3	32.7	27.0	79.5	71.8	65.3	24.0	○
26	31.5	28.4	27.0	73.1	68.0	65.3	2.0	○
27	30.9	29.3	27.7	72.0	69.5	66.2	5.5	○
28	28.5	27.7	27.0	71.4	68.4	66.1		○
月　間	39.6	28.9	27.0	79.7	69.0	65.2	32.5	
標準偏差	1.4			1.6				
欠測率（%）	0.0			0.0				

令和7年度

表－３－１－２　　２月における空間ガンマ線量率測定結果　（２）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	飯子浜							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感雨
	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	43.5	42.4	41.7	87.0	83.2	80.6		
2	43.4	42.5	41.7	86.9	83.4	80.6		
3	43.0	42.2	41.4	85.5	82.8	79.7		
4	43.9	42.2	41.4	85.8	82.9	80.2		
5	46.2	42.6	41.8	87.2	83.4	80.5		
6	44.6	42.9	41.8	88.4	84.1	80.9		
7	43.1	42.4	41.6	87.3	83.6	80.5		
8	44.4	42.6	41.7	88.0	84.2	81.3		
9	44.4	42.5	41.5	86.4	83.5	79.8		
10	43.2	42.2	41.4	85.1	82.5	80.0		
11	43.3	42.6	41.9	86.6	83.9	80.2		
12	43.8	43.0	42.1	86.8	84.1	81.8		
13	43.4	42.7	42.1	87.4	83.6	80.8		
14	45.3	43.0	42.1	86.9	83.8	80.4		
15	43.7	42.9	42.1	87.2	83.8	80.8		
16	45.1	43.7	42.3	87.5	84.5	81.7		
17	44.3	43.2	42.1	86.2	83.8	80.6		
18	56.1	43.8	41.9	97.0	84.8	81.4		
19	43.8	42.6	41.5	86.7	83.6	80.1		
20	43.5	42.3	41.4	86.2	83.0	80.2		
21	43.5	42.5	41.5	86.8	83.1	79.4		
22	43.7	42.7	41.6	86.0	82.9	80.0		
23	43.4	42.4	41.4	86.7	83.0	79.8		
24	43.9	42.4	41.5	86.5	82.4	79.6		
25	59.4	48.6	40.6	99.4	88.1	79.2		
26	45.8	42.0	40.5	86.8	82.3	78.6		
27	45.5	43.4	41.6	86.8	83.8	80.6		
28	42.4	41.5	40.5	86.4	82.6	79.1		
月　間	59.4	42.9	40.5	99.4	83.6	78.6		
標準偏差	1.8			2.0				
欠測率（%）	0.0			0.0				

令和7年度

表－３－１－２　　２月における空間ガンマ線量率測定結果　（３）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	小屋取							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感雨
	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	48.9	47.6	46.5	88.1	84.5	81.0		○
2	48.1	47.4	46.3	87.8	84.3	81.3		○
3	47.9	47.2	46.3	86.5	83.9	81.2		
4	48.4	47.2	46.5	87.7	84.2	80.1		○
5	50.3	47.5	46.7	87.9	84.5	81.3		○
6	49.8	48.0	47.0	88.3	85.6	83.0		
7	48.1	47.3	46.6	87.6	84.8	81.8		
8	48.7	47.5	46.6	88.6	85.7	82.6		○
9	50.2	47.5	46.6	89.5	84.9	81.3		○
10	48.7	47.4	46.5	87.5	84.2	81.2		○
11	48.5	47.6	46.6	88.0	85.3	82.8		
12	48.6	47.8	46.6	88.9	85.2	82.6		○
13	48.1	47.5	46.7	88.7	84.6	81.9		
14	49.6	47.9	46.7	88.8	85.1	81.5		○
15	48.7	47.7	46.7	89.5	85.1	81.9		
16	49.1	48.2	46.9	88.9	85.5	82.8		
17	49.0	47.8	46.8	87.7	84.6	81.7		
18	57.6	48.3	47.1	94.9	85.9	81.7	0.5	○
19	48.7	47.5	46.2	89.5	84.8	81.0		○
20	48.3	47.4	46.3	88.2	84.5	81.7		
21	48.7	47.9	47.0	87.9	85.1	81.8		
22	49.7	48.2	47.0	87.5	84.8	81.4		○
23	48.7	47.8	46.7	88.3	85.0	81.6		
24	48.6	47.4	46.7	86.9	83.8	80.6		○
25	62.6	51.9	45.3	98.4	87.8	80.4	21.5	○
26	50.7	46.7	45.5	88.0	83.3	79.7	0.5	○
27	50.6	48.1	46.1	89.7	85.1	81.4	6.0	○
28	47.0	46.3	45.6	86.4	84.0	80.9	0.5	○
月　間	62.6	47.7	45.3	98.4	84.9	79.7	29.0	
標準偏差		1.5			1.8			
欠測率（%）		0.0			0.0			

令和7年度

表－３－１－２　　２月における空間ガンマ線量率測定結果　（４）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	寄磯 NaI(Tl) 最大	NaI(Tl) 平均	NaI(Tl) 最小	電離箱 最大	電離箱 平均	電離箱 最小	降水量 (mm)	感雨 有無
1	35.9	35.1	34.4	78.8	76.6	73.8		○
2	36.1	35.2	34.7	79.3	76.6	74.1		○
3	35.9	35.0	34.5	79.1	76.2	73.2		
4	36.5	35.2	34.5	79.3	76.5	73.8		○
5	37.1	35.5	34.8	79.5	77.0	73.9		○
6	37.1	35.7	34.5	80.4	77.6	74.7		
7	35.9	35.2	34.6	79.3	76.9	74.2		
8	36.4	35.3	34.5	81.2	77.8	74.9		○
9	36.1	35.0	34.2	80.7	76.8	72.6		○
10	35.9	35.0	34.1	79.6	76.3	73.4		○
11	36.0	35.3	34.7	81.4	77.5	74.5		
12	36.5	35.7	35.0	80.5	77.8	75.1		○
13	36.1	35.4	34.6	80.5	77.4	74.2		○
14	37.2	35.9	34.9	82.9	77.4	74.9		○
15	36.5	35.8	35.1	80.2	77.6	75.4		
16	37.1	36.4	35.6	81.4	78.1	75.2		
17	36.8	35.9	34.9	80.7	77.6	75.1		
18	42.8	36.2	35.1	86.2	78.6	75.2	0.5	○
19	36.5	35.2	34.1	80.7	77.1	74.1		○
20	35.9	35.0	34.2	80.0	76.6	74.1		
21	36.0	35.3	34.5	79.5	76.7	74.0		
22	36.6	35.6	34.6	80.2	77.1	73.8		○
23	36.1	35.1	34.4	79.6	76.7	73.8		
24	36.1	35.2	34.6	78.4	76.0	73.7		○
25	49.2	39.8	33.6	90.2	80.3	73.1	21.5	○
26	36.9	34.5	33.5	78.8	75.6	72.5	0.5	○
27	39.2	36.3	33.7	81.4	77.6	74.5	7.5	○
28	35.4	34.5	33.7	79.3	76.4	74.0		○
月　間	49.2	35.6	33.5	90.2	77.2	72.5	30.0	
標準偏差		1.4			1.7			
欠測率（%）		0.0			0.0			

令和7年度

表－３－１－２　　２月における空間ガンマ線量率測定結果　（５）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	鮫浦							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感雨
	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	52.1	51.1	50.1	102.5	98.7	95.0		○
2	52.9	51.2	50.3	101.9	98.8	95.8		○
3	51.6	50.9	50.0	102.1	98.3	94.7		
4	52.8	51.1	50.0	102.6	98.7	95.2		○
5	53.4	51.3	50.3	102.0	99.0	95.9		○
6	53.1	51.6	50.7	104.4	99.6	96.6		
7	52.1	51.2	50.2	103.5	99.0	96.1		
8	52.7	51.4	50.2	103.0	99.6	96.2		○
9	54.2	51.3	49.9	104.4	99.0	94.5		○
10	52.2	50.9	50.2	102.5	98.1	94.9		○
11	52.1	51.3	50.4	102.8	99.4	96.0		
12	53.0	51.9	50.9	103.4	99.9	95.8		○
13	52.2	51.5	50.6	102.5	99.1	95.4		
14	53.9	51.8	50.7	102.9	99.2	95.7		○
15	52.6	51.7	50.5	103.3	99.6	95.9		
16	53.4	52.4	51.7	103.3	100.3	95.4		
17	53.0	51.9	50.9	102.6	99.2	95.9		
18	64.5	52.5	50.9	112.5	100.4	96.4	0.5	○
19	52.8	51.4	50.0	102.9	98.9	95.4		○
20	51.9	51.1	50.2	102.3	98.6	95.8		
21	52.1	51.2	50.2	101.7	98.4	95.5		
22	52.8	51.4	50.6	103.2	98.6	94.8		
23	52.3	51.3	50.2	102.3	98.7	95.1		
24	52.2	51.3	50.4	102.6	98.1	93.9		○
25	70.4	57.7	49.0	116.0	103.9	94.3	26.5	○
26	55.1	50.6	49.0	103.4	97.8	94.0	1.0	○
27	55.9	52.4	49.6	103.9	99.8	94.8	6.5	○
28	51.3	49.9	48.6	101.5	98.0	94.9		○
月間	70.4	51.6	48.6	116.0	99.2	93.9	34.5	
標準偏差		1.9			2.2			
欠測率（%）		0.0			0.0			

令和7年度

表－３－１－２　　２月における空間ガンマ線量率測定結果　（６）

単位：nGy/h

局	谷　川							
項目	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感雨
日	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	51.0	49.1	48.0	84.7	82.4	79.5		
2	51.0	49.0	48.2	83.8	82.3	80.6		
3	49.7	48.7	48.0	84.6	81.8	80.0		
4	50.5	48.9	47.6	85.1	82.1	79.7		
5	50.7	49.2	48.2	84.5	82.5	80.2		
6	50.6	49.4	48.4	85.3	83.0	80.6		
7	50.0	49.0	48.2	85.6	82.4	80.0		
8	49.9	49.1	48.2	85.9	83.2	80.9		
9	52.8	49.1	47.9	86.3	82.4	79.9		
10	50.0	49.0	48.0	83.7	81.7	79.0		
11	50.1	49.2	48.2	85.3	82.9	80.5		
12	52.9	49.6	48.7	85.7	83.2	81.1		
13	50.3	49.3	48.4	85.1	82.8	80.3		
14	50.9	49.6	48.8	85.0	82.8	80.4		
15	50.3	49.6	48.7	85.5	83.2	80.9		
16	51.1	50.1	49.3	86.1	83.5	81.6		
17	51.0	49.9	48.8	84.9	83.0	80.7		
18	60.5	50.4	48.6	94.1	84.0	81.6		
19	51.0	49.2	48.0	85.9	82.6	79.7		
20	50.0	49.1	47.9	84.5	82.2	80.2		
21	50.4	49.4	48.5	84.5	82.3	80.6		
22	50.7	49.5	48.3	86.1	82.5	80.8		
23	50.3	49.1	48.2	84.3	82.2	80.1		
24	50.3	49.3	48.3	83.8	81.8	79.4		
25	65.3	54.9	47.1	95.9	86.7	78.1		
26	53.4	48.6	47.1	87.9	81.4	78.4		
27	53.1	50.2	47.6	86.2	83.4	80.0		
28	48.6	47.5	46.7	83.8	81.2	79.0		
月　間	65.3	49.5	46.7	95.9	82.7	78.1		
標準偏差	1.8			1.8				
欠測率（%）	0.0			0.0				

令和7年度

表－３－１－２　　２月における空間ガンマ線量率測定結果　（７）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	荻　浜							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量	感　雨
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	(mm)	有無
1	56.3	55.3	54.3	93.1	89.4	86.7		○
2	56.2	55.3	54.4	91.3	89.3	86.7		○
3	56.1	55.1	54.5	91.4	89.0	87.3		
4	57.9	55.4	54.4	92.6	89.4	87.1		○
5	58.1	55.7	54.9	93.5	89.9	88.0		○
6	57.3	55.7	54.8	92.5	90.3	88.3		
7	56.2	55.3	54.4	92.0	89.7	86.8		
8	56.5	55.5	54.7	92.5	90.5	88.4		○
9	58.7	55.5	54.2	93.5	89.8	87.2		○
10	56.3	55.3	54.2	91.7	89.0	86.4		○
11	56.6	55.6	54.8	92.2	90.3	88.1		
12	59.0	56.0	54.8	94.5	90.5	88.1		○
13	56.5	55.7	54.9	93.0	89.9	87.9		
14	57.6	56.0	54.9	92.8	90.0	87.7		○
15	57.2	56.0	55.0	92.5	90.6	88.4		
16	57.4	56.3	55.4	92.5	90.6	88.5		
17	56.9	56.0	54.9	92.0	89.9	87.9		
18	66.4	56.4	54.6	100.4	91.0	87.9		○
19	57.3	55.5	54.5	92.8	89.9	87.2		○
20	56.3	55.4	54.4	92.5	89.3	87.0		
21	56.5	55.6	54.8	92.1	89.5	87.0		
22	56.8	55.6	54.7	92.0	89.4	87.2		
23	56.3	55.4	54.6	92.1	89.4	86.6		○
24	56.4	55.4	54.6	91.1	88.8	87.0		○
25	67.5	60.1	53.3	102.0	93.4	86.1	25.5	○
26	60.8	55.2	53.3	94.4	88.8	85.7	3.5	○
27	59.3	56.6	53.8	94.1	90.9	88.2	9.5	○
28	55.1	54.0	53.1	91.7	88.9	85.8	0.5	○
月　間	67.5	55.7	53.1	102.0	89.9	85.7	39.0	
標 準 偏 差		1.5			1.7			
欠測率（%）		0.0			0.0			

令和7年度

表－３－１－２　　2月における空間ガンマ線量率測定結果（８）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	塚浜 NaI(Tl) 最大	NaI(Tl) 平均	NaI(Tl) 最小	電離箱 最大	電離箱 平均	電離箱 最小	降水量 (mm)	感雨 有無
1	49.4	48.0	47.3	80.5	78.2	76.4		
2	48.9	47.9	47.2	79.9	78.2	76.5		
3	48.2	47.7	47.0	79.0	77.7	76.4		
4	49.0	47.7	46.9	79.9	77.9	76.0		
5	51.3	48.0	47.3	81.4	78.3	76.9		
6	49.6	48.4	47.3	81.1	79.0	77.0		
7	48.9	48.0	47.4	80.2	78.4	77.0		
8	49.3	48.2	47.4	81.0	79.2	77.3		
9	50.2	48.1	47.1	81.1	78.4	76.4		
10	48.8	47.7	46.7	79.2	77.6	76.4		
11	48.5	47.9	47.3	80.0	78.8	77.1		
12	48.9	48.4	47.8	80.4	79.1	77.7		
13	48.8	48.1	47.7	79.9	78.5	77.2		
14	50.5	48.4	47.7	80.9	78.6	77.0		
15	48.9	48.3	47.7	80.4	78.8	76.9		
16	49.9	49.0	48.1	81.0	79.4	77.9		
17	49.6	48.5	47.6	80.0	78.4	77.0		
18	61.4	49.2	47.7	91.1	79.8	77.6		
19	49.2	48.1	47.0	81.2	78.5	76.4		
20	48.3	47.8	47.2	79.4	78.0	76.6		
21	48.7	47.9	47.1	79.6	78.0	76.7		
22	48.9	48.0	47.2	79.8	78.0	76.5		
23	48.8	47.9	47.2	79.5	78.1	75.7		
24	48.7	47.8	47.2	78.7	77.4	75.7		
25	65.1	53.3	45.9	93.9	82.4	74.9		
26	51.0	47.2	45.9	82.2	76.9	74.9		
27	50.7	48.5	46.7	81.1	78.6	75.9		
28	47.6	46.7	45.8	79.0	77.3	75.6		
月　間	65.1	48.2	45.8	93.9	78.5	74.9		
標準偏差		1.7			1.7			
欠測率（%）		0.0			0.0			

令和7年度

表－３－１－２　　2月における空間ガンマ線量率測定結果（９）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	寺間 NaI(Tl) 最大	寺間 NaI(Tl) 平均	寺間 NaI(Tl) 最小	寺間 電離箱 最大	寺間 電離箱 平均	寺間 電離箱 最小	降水量 (mm)	感雨 有無
1	40.5	38.4	37.8	75.5	72.8	71.1		○
2	40.3	38.4	37.9	75.5	73.0	71.3		○
3	38.7	38.2	37.6	74.4	72.5	70.9		
4	39.0	38.2	37.5	74.5	72.5	70.6		○
5	41.3	38.5	37.9	75.5	73.0	71.1		○
6	39.9	38.8	37.8	75.7	73.8	72.1		○
7	38.9	38.4	38.0	75.3	73.2	71.5		
8	39.7	38.6	37.9	75.9	74.0	72.1		○
9	39.9	38.3	37.4	76.5	73.2	71.0		○
10	39.0	38.2	37.5	74.1	72.5	70.6		
11	38.9	38.4	37.7	75.3	73.8	71.9		
12	39.3	38.9	37.9	75.4	73.9	72.5		○
13	39.5	38.6	38.0	75.2	73.6	71.6		
14	40.5	38.9	38.0	76.0	73.4	71.5		○
15	39.4	38.7	38.2	76.1	73.6	71.9		
16	40.3	39.6	38.8	76.3	74.4	72.7		
17	39.8	39.1	38.5	75.3	73.4	72.0		
18	47.0	39.4	37.9	82.0	74.4	72.5	0.5	○
19	39.9	38.6	37.6	75.5	73.3	71.3		○
20	38.8	38.3	37.5	74.6	72.8	70.6		
21	39.0	38.3	37.7	74.7	72.8	70.6		
22	39.1	38.3	37.6	74.1	72.6	71.0		
23	39.0	38.3	37.7	75.0	72.8	70.8		
24	38.9	38.2	37.6	73.9	72.0	70.3		
25	54.5	44.1	36.7	87.6	77.4	69.6	26.0	○
26	40.3	37.8	37.0	75.2	71.5	69.0		○
27	42.7	39.5	37.1	76.7	73.8	71.0	9.5	○
28	38.5	37.4	36.8	74.3	72.3	70.5	0.5	○
月　間	54.5	38.7	36.7	87.6	73.3	69.0	36.5	
標準偏差		1.7			1.7			
欠測率（%）		0.0			0.0			

令和7年度

表－３－１－２　　2月における空間ガンマ線量率測定結果（１０）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	江島 NaI(Tl) 最大	NaI(Tl) 平均	NaI(Tl) 最小	電離箱 最大	電離箱 平均	電離箱 最小	降水量 (mm)	感雨 有無
1	34.3	33.4	32.7	65.5	64.2	62.9		
2	34.0	33.4	32.7	65.9	64.2	62.7		○
3	33.7	33.2	32.6	65.8	63.8	62.3		
4	34.5	33.1	32.5	66.0	63.9	62.7		○
5	34.8	33.3	32.7	66.1	64.2	62.9		○
6	35.1	33.8	32.7	67.1	65.1	62.9		
7	34.1	33.4	32.8	66.3	64.6	63.1		
8	34.5	33.6	32.9	67.5	65.4	64.0		
9	34.6	33.4	32.5	66.6	64.5	62.5		
10	34.1	33.0	32.4	64.9	63.6	61.6		○
11	34.2	33.4	32.8	65.9	64.8	63.4		
12	34.7	33.9	33.0	66.8	65.2	63.9		
13	34.2	33.6	33.0	66.5	64.6	63.3		○
14	35.6	33.8	33.2	67.3	64.6	63.3		○
15	34.5	33.8	33.1	66.7	65.0	63.3		
16	35.4	34.6	33.7	67.0	65.5	64.3		
17	34.8	34.0	33.2	65.8	64.6	62.9		
18	42.7	34.2	33.0	74.2	65.5	63.4		○
19	34.7	33.5	32.5	66.6	64.6	62.4		
20	33.8	33.2	32.7	65.2	64.0	62.5		
21	34.8	33.6	32.5	66.2	64.2	62.4		
22	34.8	33.7	32.6	66.0	64.2	62.2		
23	34.2	33.3	32.5	65.7	64.0	62.6		
24	34.3	33.3	32.7	64.9	63.4	61.9		
25	46.4	37.7	31.8	75.6	67.4	61.5	20.5	○
26	33.8	32.5	31.9	64.5	62.8	61.5		○
27	39.7	34.7	32.2	70.3	65.4	62.3	5.0	○
28	34.2	32.5	31.8	65.3	63.7	62.3		○
月　間	46.4	33.7	31.8	75.6	64.5	61.5	25.5	
標準偏差		1.4			1.4			
欠測率（%）		0.0			0.0			

令和7年度

表－３－１－２　　2月における空間ガンマ線量率測定結果（１１）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	前網 NaI(Tl) 最大	前網 NaI(Tl) 平均	前網 NaI(Tl) 最小	前網 電離箱 最大	前網 電離箱 平均	前網 電離箱 最小	降水量 (mm)	感雨 有無
1	54.6	53.7	53.1	84.2	82.9	81.1		
2	55.0	53.6	53.0	85.0	83.0	80.7		
3	54.1	53.5	53.0	84.3	82.5	80.8		
4	54.5	53.6	53.0	84.3	82.7	81.1		
5	55.5	53.7	52.8	85.8	83.1	81.5		
6	54.8	53.9	53.1	86.4	83.6	81.7		
7	54.3	53.7	53.0	85.3	83.1	81.3		
8	54.8	53.9	53.3	85.7	84.0	82.3		
9	55.7	53.8	53.0	86.1	83.3	80.7		
10	54.4	53.5	52.8	84.8	82.5	80.8		
11	54.4	53.7	53.0	85.6	83.6	81.6		
12	54.8	54.2	53.7	85.4	83.8	81.9		
13	54.5	53.9	53.3	85.5	83.5	81.7		
14	56.3	54.2	53.3	86.1	83.5	81.4		
15	54.7	54.0	53.6	85.6	83.8	81.7		
16	55.2	54.6	53.8	86.0	84.2	82.1		
17	55.2	54.4	53.7	85.2	83.5	81.9		
18	63.8	54.8	53.3	93.5	84.5	82.2		
19	55.0	53.9	52.9	86.4	83.3	81.1		
20	54.4	53.7	53.1	85.0	82.9	81.4		
21	54.7	53.8	52.9	84.5	83.0	81.5		
22	54.8	53.9	52.8	84.9	83.0	81.7		
23	54.2	53.6	52.9	84.7	82.7	80.6		
24	54.4	53.6	52.9	84.0	82.2	80.8		
25	66.8	58.1	51.6	95.8	86.5	79.1		
26	54.8	52.4	51.4	84.3	81.1	79.2		
27	55.6	53.7	51.5	85.3	82.9	80.5		
28	52.8	52.1	51.5	83.6	81.9	80.3		
月　間	66.8	53.9	51.4	95.8	83.2	79.1		
標準偏差		1.5			1.6			
欠測率（%）		0.0			0.0			

令和7年度

表－３－１－３　　3 月における空間ガンマ線量率測定結果 （１）

単位：nGy/h

局	女　川							
項目	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量	感　雨
日	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	(mm)	有無
1	28.6	27.8	27.0	70.0	67.9	65.7		
2	29.2	27.8	26.9	70.5	67.8	65.3		
3	40.1	29.9	27.4	78.9	69.6	65.9	3.5	○
4	39.2	33.0	27.1	79.3	72.9	66.0	18.5	○
5	28.1	27.0	26.3	70.1	67.3	64.7		○
6	29.3	27.5	26.6	70.1	67.5	65.1		○
7	32.3	28.8	27.0	72.9	69.5	66.7	4.0	○
8	28.9	28.2	27.1	73.2	68.7	66.5		○
9	28.2	27.5	26.9	70.2	67.9	65.5		○
10	30.1	28.6	27.8	71.2	69.2	66.3		○
11	29.5	28.5	27.4	71.0	68.8	66.2		
12	29.7	28.3	27.5	71.5	69.0	67.1		
13	29.4	28.4	27.4	71.6	69.0	66.5		
14	29.5	28.2	27.2	70.8	68.6	66.4		
15	28.8	27.7	27.0	70.2	68.2	65.9		
16	30.1	28.3	26.9	71.4	68.7	65.4		
17	30.3	28.4	27.3	70.9	68.8	66.7		
18	33.0	29.0	28.1	74.2	69.3	66.6		○
19	39.9	29.8	27.1	80.8	71.0	67.2	2.0	○
20	30.3	28.5	27.5	73.7	69.4	66.7		○
21	29.8	28.1	27.0	71.1	68.5	65.4		○
22	29.1	28.3	27.6	70.4	68.4	66.5		
23	30.4	28.7	27.6	72.1	69.8	67.6		
24	29.3	28.4	27.7	71.8	69.3	67.0		
25	30.3	28.8	27.9	71.8	69.3	66.2		
26	35.6	31.9	27.6	76.9	72.2	66.6	20.5	○
27	29.2	27.9	27.2	71.1	68.8	66.5		○
28	29.3	28.1	27.0	71.2	69.1	67.3		
29	30.2	28.4	26.9	73.2	69.0	66.6		
30	29.4	28.0	27.1	70.8	68.6	66.7		
31	36.3	29.5	27.1	78.1	70.7	67.1	3.0	○
月　間	40.1	28.6	26.3	80.8	69.1	64.7	51.5	
標 準 偏 差	1.8			1.9				
欠測率 (%)	0.4			0.4				

令和7年度

表－３－１－３　　３月における空間ガンマ線量率測定結果　（２）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	飯子浜							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感雨
	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	42.6	41.8	40.8	85.8	82.5	79.7		
2	42.6	41.7	40.7	84.7	81.8	78.6		
3	47.4	42.5	41.2	88.6	82.8	80.0		
4	55.4	46.8	40.7	95.7	87.3	80.5		
5	41.7	41.0	40.1	84.6	81.8	78.0		
6	42.9	41.1	40.4	85.4	81.4	78.3		
7	46.9	42.8	41.0	87.8	83.8	80.0		
8	43.2	42.3	41.3	87.0	83.0	79.7		
9	42.4	41.5	40.9	85.3	82.2	79.5		
10	43.8	42.1	41.2	86.1	82.7	79.9		
11	42.8	42.0	41.3	85.3	82.5	79.7		
12	42.6	42.0	41.2	85.8	82.8	79.6		
13	42.7	41.8	40.9	86.1	82.5	80.0		
14	42.4	41.6	40.9	84.9	82.2	79.8		
15	42.5	41.7	41.0	85.5	82.1	79.3		
16	43.2	42.1	41.2	85.0	82.5	78.8		
17	43.1	42.2	41.4	85.4	82.7	79.6		
18	46.0	42.6	41.7	88.8	82.9	79.8		
19	52.6	43.7	41.5	93.0	84.2	80.3		
20	45.6	42.3	41.1	87.6	82.7	80.3		
21	45.3	42.6	41.5	85.9	82.8	79.4		
22	43.1	42.2	41.4	85.3	82.1	78.6		
23	44.0	42.4	41.5	85.9	82.8	79.9		
24	43.2	42.4	41.7	85.4	82.4	79.4		
25	44.0	42.6	41.7	85.2	82.4	79.1		
26	52.6	46.6	41.5	93.9	86.5	81.0		
27	44.7	41.5	40.5	85.5	81.8	77.8		
28	42.9	41.6	40.5	84.5	81.7	79.0		
29	43.5	41.9	40.7	86.5	81.7	79.1		
30	42.3	41.5	40.8	83.4	81.2	77.8		
31	53.1	43.3	40.9	93.4	83.6	79.0		
月　間	55.4	42.4	40.1	95.7	82.8	77.8		
標準偏差	1.8			2.1				
欠測率（%）	0.9			0.9				

令和7年度

表－３－１－３　　3 月における空間ガンマ線量率測定結果 （３）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	小屋取							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感雨
	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	47.6	46.7	45.6	87.4	83.9	80.9		
2	46.9	46.3	45.7	86.2	83.2	80.4		
3	51.4	47.0	45.8	87.9	83.5	80.9	0.5	○
4	56.2	50.3	45.2	94.8	87.3	81.6	13.5	○
5	46.7	45.8	45.0	86.5	83.1	80.1		○
6	47.9	46.1	45.3	88.3	82.9	79.8		○
7	52.0	47.8	46.0	89.8	85.3	81.8	5.0	○
8	48.2	47.3	46.0	88.9	84.9	82.1		○
9	47.0	46.3	45.6	86.7	83.6	81.1		○
10	47.3	46.6	45.8	86.8	83.8	81.4		○
11	47.3	46.6	45.8	85.8	83.6	80.8		
12	47.6	46.6	45.9	88.3	83.9	80.2		
13	47.4	46.7	45.6	87.8	83.9	81.0		
14	47.3	46.6	45.8	86.5	83.7	80.7		
15	47.7	46.6	45.8	87.1	83.5	80.6		
16	48.0	46.7	45.9	87.0	83.8	81.3		
17	47.5	46.8	46.1	86.2	83.6	80.7		
18	50.9	47.1	46.0	88.9	84.1	81.1		○
19	56.3	48.8	46.5	93.7	86.4	83.0	1.5	○
20	50.6	47.6	46.7	89.8	85.3	81.7		○
21	50.3	47.8	46.6	87.8	84.8	81.4		○
22	48.2	47.5	46.4	86.8	84.1	81.6		
23	48.1	47.1	46.3	87.7	84.3	80.9		
24	47.9	47.1	46.2	88.0	84.3	81.3		
25	48.7	47.3	46.1	87.9	84.2	81.0		
26	55.6	51.0	46.3	94.5	87.6	81.7	22.0	○
27	48.0	46.1	45.2	86.4	83.4	80.4		○
28	47.7	46.6	45.9	87.8	84.0	80.9		
29	48.2	46.8	45.4	86.7	83.9	80.5		
30	46.8	46.0	45.2	86.3	83.1	78.2		
31	57.8	48.1	45.2	94.7	85.5	80.0	7.0	○
月　間	57.8	47.1	45.0	94.8	84.3	78.2	49.5	
標準偏差	1.6			1.9				
欠測率（%）	0.9			0.9				

令和7年度

表－３－１－３　　3 月における空間ガンマ線量率測定結果 （４）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	寄磯 NaI(Tl) 最大	NaI(Tl) 平均	NaI(Tl) 最小	電離箱 最大	電離箱 平均	電離箱 最小	降水量 (mm)	感雨 有無
1	35.7	34.8	33.8	78.9	76.2	73.5		
2	35.3	34.5	33.9	79.0	75.7	73.3		
3	39.2	35.1	34.1	81.0	76.6	74.1	1.0	○
4	44.5	38.4	33.9	87.1	80.0	74.5	14.5	○
5	34.7	33.9	33.3	78.2	75.6	71.7		
6	36.3	34.0	33.2	79.4	75.3	72.5		○
7	38.7	35.5	33.8	81.9	77.4	74.3	5.0	○
8	35.6	35.0	34.1	80.2	76.8	74.2		○
9	35.1	34.4	33.7	78.9	75.7	72.1		○
10	35.8	35.0	34.3	79.4	76.5	73.9		○
11	35.6	35.0	34.5	78.9	76.3	73.7		
12	35.8	35.0	34.2	79.7	76.6	74.3		
13	35.6	34.8	34.1	80.4	76.4	73.7		
14	35.5	34.6	34.0	78.7	76.1	73.2		
15	35.4	34.7	33.9	78.1	76.1	73.0		
16	35.9	35.0	34.2	79.5	76.5	73.9		
17	35.5	35.0	34.2	79.3	76.3	73.9		
18	38.7	35.4	34.6	81.4	76.6	74.0		○
19	43.9	36.3	34.3	86.3	78.4	74.2	1.5	○
20	37.4	35.2	34.4	80.1	76.9	74.1		○
21	37.1	35.2	34.0	80.0	76.8	73.5		○
22	35.6	34.9	34.2	78.9	76.0	73.4		
23	36.2	35.2	34.3	79.8	77.0	74.2		
24	36.3	35.4	34.6	80.1	76.8	74.2		
25	37.2	35.7	34.6	80.3	77.0	74.5		
26	45.0	40.0	34.6	86.7	81.2	73.7	24.5	○
27	36.9	34.2	33.3	79.1	75.8	72.7		○
28	35.8	34.4	33.4	79.3	76.1	73.4		
29	36.0	34.7	33.5	80.6	76.3	73.0		
30	35.2	34.5	33.8	79.0	75.8	72.8		
31	42.8	35.8	34.0	86.5	77.6	74.0	2.5	○
月　間	45.0	35.2	33.2	87.1	76.7	71.7	49.0	
標準偏差		1.6			1.9			
欠測率（%）		0.3			0.3			

令和7年度

表－３－１－３　　３月における空間ガンマ線量率測定結果　（５）

単位：nGy/h

局	鮫　浦							
項目	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感雨
日	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	51.4	50.4	49.5	102.2	97.7	94.6		
2	51.5	50.2	49.0	101.1	97.4	93.3		
3	55.8	50.8	49.4	105.2	98.1	94.3	1.5	○
4	67.9	57.2	49.1	115.4	104.3	95.5	19.0	○
5	50.6	49.5	48.8	100.7	97.1	94.0		○
6	51.2	49.6	48.9	100.7	97.1	94.5		○
7	55.2	51.3	49.1	105.6	99.4	95.1	5.0	○
8	51.5	50.8	49.9	101.6	98.6	95.3		○
9	51.0	50.1	49.4	100.8	97.7	94.8		○
10	51.7	50.6	49.7	102.0	98.4	94.0		○
11	51.5	50.5	49.8	102.5	98.1	92.8		
12	51.3	50.6	49.6	102.2	98.3	95.2		
13	51.1	50.3	49.6	102.0	98.0	95.0		
14	51.1	50.2	49.5	101.1	97.8	94.9		
15	51.1	50.3	49.4	101.5	97.8	94.5		
16	51.7	50.7	49.6	102.0	98.2	94.6		
17	51.7	50.9	49.8	101.6	98.5	94.0		
18	54.3	51.1	50.2	102.9	98.5	95.2		○
19	61.1	52.2	49.9	111.2	100.3	95.9	1.0	○
20	53.7	50.9	49.6	102.7	98.8	95.1		○
21	53.5	51.2	49.8	103.5	98.6	95.2		○
22	51.4	50.7	49.8	101.4	98.0	94.8		
23	52.7	51.1	50.3	102.4	99.1	94.7		
24	51.9	51.0	50.1	103.1	98.9	94.3		
25	53.3	51.2	50.1	102.9	98.8	95.4		
26	59.6	54.9	50.3	109.0	102.2	95.4	19.5	○
27	53.5	49.9	48.8	102.6	97.9	94.7		○
28	50.9	49.9	48.8	101.0	97.9	94.6		○
29	51.5	50.2	49.3	102.0	97.8	93.1		○
30	51.1	50.0	49.4	100.9	97.5	94.1		
31	61.8	51.7	49.5	109.3	99.7	95.2	4.5	○
月　間	67.9	51.0	48.8	115.4	98.6	92.8	50.5	
標準偏差	2.1			2.4				
欠測率（%）	0.8			0.8				

令和7年度

表－３－１－３　　3 月における空間ガンマ線量率測定結果 （６）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	谷　川							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量	感　雨
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	(mm)	有無
1	48.9	47.9	47.1	83.2	81.1	78.4		
2	48.8	47.9	47.0	82.7	80.8	79.1		
3	52.2	48.6	47.0	85.3	81.5	79.2		
4	69.2	54.3	46.7	101.3	87.3	78.0		
5	47.8	47.0	46.2	83.8	80.6	78.8		
6	48.8	47.3	46.6	82.9	80.4	78.2		
7	52.7	48.8	46.9	86.6	82.5	79.4		
8	49.3	48.3	47.4	83.8	81.8	79.8		
9	48.4	47.7	47.2	83.9	81.1	79.0		
10	49.8	48.4	47.5	84.2	81.8	79.5		
11	49.4	48.3	47.6	83.9	81.6	79.3		
12	49.2	48.3	47.5	83.7	81.7	79.1		
13	49.1	48.2	47.4	83.7	81.5	79.1		
14	48.9	48.1	47.3	83.5	81.4	79.5		
15	48.9	48.2	47.3	83.5	81.3	79.1		
16	49.5	48.6	47.5	84.3	81.4	79.4		
17	49.7	48.6	47.9	85.0	81.7	79.8		
18	52.2	48.9	47.9	85.6	81.8	79.9		
19	59.7	50.0	47.5	93.0	83.7	80.5		
20	51.0	48.7	47.9	85.1	82.4	80.0		
21	51.1	49.0	47.7	85.1	82.1	79.5		
22	50.1	48.8	47.9	83.7	81.8	79.9		
23	50.3	48.9	48.0	84.7	82.6	80.3		
24	49.9	49.0	48.4	83.9	82.3	80.7		
25	50.7	49.2	48.0	85.5	82.3	80.5		
26	57.2	52.9	47.9	89.9	85.7	79.6		
27	52.3	47.6	46.4	84.8	81.1	78.8		
28	49.2	47.8	46.7	83.3	81.4	79.5		
29	49.4	48.1	46.9	84.0	81.2	78.2		
30	48.9	47.9	47.0	82.8	80.9	78.6		
31	55.6	49.3	47.1	89.0	82.9	79.2		
月　間	69.2	48.7	46.2	101.3	82.0	78.0		
標 準 偏 差		2.1			2.1			
欠測率（%）		0.8			0.9			

令和7年度

表－３－１－３　　３月における空間ガンマ線量率測定結果　（７）

単位：nGy/h

局	荻　浜							
項目	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感雨
日	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	55.2	54.4	53.5	90.7	88.5	86.5		
2	55.1	54.3	53.3	90.6	88.1	86.3		
3	64.5	55.8	54.0	98.1	89.5	86.8	3.0	○
4	68.5	60.4	53.1	103.1	94.4	86.6	23.0	○
5	54.2	53.5	52.8	90.3	87.9	84.7		○
6	54.7	53.8	52.9	90.0	87.8	85.9		○
7	59.3	55.1	53.6	94.1	89.8	86.6	5.0	○
8	56.0	54.7	53.3	92.2	89.2	86.3		○
9	55.0	54.2	53.4	90.4	88.3	85.8		○
10	55.8	54.6	53.7	91.1	88.8	86.7		○
11	55.4	54.6	53.5	91.7	88.9	86.7		
12	55.6	54.6	53.6	91.8	89.0	86.7		
13	55.4	54.5	53.4	91.2	89.0	87.2		
14	55.2	54.4	53.4	90.9	88.6	86.1		
15	55.2	54.4	53.6	90.5	88.4	86.1		
16	55.8	54.8	54.0	90.9	88.9	86.0		
17	55.9	55.0	53.5	92.7	89.0	86.9		
18	58.6	55.1	54.1	92.9	89.1	87.2		○
19	65.8	56.2	54.1	99.8	91.0	86.8	1.5	○
20	57.7	55.0	54.2	92.5	89.4	87.2		○
21	57.0	55.1	54.0	93.0	89.4	86.4		○
22	55.9	54.9	54.0	91.1	88.6	86.3		
23	55.6	54.9	54.2	92.1	89.5	86.7		
24	56.0	55.1	54.2	91.5	89.5	87.8		
25	56.5	55.3	54.4	91.6	89.2	87.0		
26	61.1	57.8	54.7	95.7	91.8	88.1	15.5	○
27	57.6	54.3	53.2	92.7	88.4	85.5	0.5	○
28	55.2	54.1	53.1	90.9	88.3	86.3		
29	55.8	54.6	53.5	91.7	88.7	86.3		
30	55.4	54.5	53.6	91.5	88.4	85.2		
31	64.4	56.0	53.9	97.9	90.3	87.0	4.0	○
月　間	68.5	55.0	52.8	103.1	89.2	84.7	52.5	
標準偏差	1.9			2.0				
欠測率（%）	0.8			0.8				

令和7年度

表－３－１－３　　3月における空間ガンマ線量率測定結果（８）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	塚浜 NaI(Tl) 最大	NaI(Tl) 平均	NaI(Tl) 最小	電離箱 最大	電離箱 平均	電離箱 最小	降水量 (mm)	感雨 有無
1	47.7	47.1	46.4	78.4	77.1	75.9		
2	47.7	46.9	46.3	77.9	76.7	75.0		
3	52.2	47.6	46.4	81.8	77.3	75.8		
4	57.8	51.1	46.2	88.3	81.3	76.4		
5	46.8	46.2	45.7	78.8	76.6	74.9		
6	48.2	46.3	45.7	78.7	76.3	75.0		
7	52.7	48.1	46.1	82.9	78.7	76.2		
8	48.1	47.6	46.8	79.5	77.9	76.4		
9	47.5	46.8	46.3	78.5	77.1	75.0		
10	48.4	47.1	46.4	78.8	77.5	76.2		
11	47.7	47.1	46.6	79.0	77.4	76.1		
12	47.8	47.1	46.6	79.4	77.6	76.2		
13	47.6	47.0	46.3	79.0	77.4	76.0		
14	47.8	46.9	46.2	78.8	77.2	75.5		
15	47.5	46.8	45.9	78.2	77.0	75.5		
16	47.9	47.2	46.6	78.8	77.5	76.0		
17	48.0	47.4	46.9	79.7	77.6	76.2		
18	52.1	47.7	46.9	82.9	77.8	76.3		
19	58.3	48.9	46.8	89.0	79.7	76.8		
20	51.2	47.5	46.8	81.7	78.2	76.7		
21	50.5	47.8	46.8	82.0	78.0	76.1		
22	48.1	47.4	46.5	78.9	77.4	75.9		
23	48.3	47.5	46.9	79.8	78.0	76.3		
24	48.1	47.5	46.8	79.6	78.0	76.7		
25	49.0	47.8	46.6	79.8	77.9	76.4		
26	57.9	52.5	46.9	88.6	82.3	76.2		
27	49.3	46.4	45.7	79.8	76.9	75.5		
28	47.5	46.4	45.5	78.7	77.1	75.8		
29	47.8	46.6	45.9	78.8	77.0	75.1		
30	46.9	46.4	45.9	77.8	76.5	75.0		
31	59.9	48.6	46.0	89.7	79.1	75.8		
月　間	59.9	47.5	45.5	89.7	77.8	74.9		
標準偏差		1.8			1.8			
欠測率（%）		0.1			0.1			

令和7年度

表－３－１－３　　3月における空間ガンマ線量率測定結果（９）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	寺間 NaI(Tl) 最大	寺間 NaI(Tl) 平均	寺間 NaI(Tl) 最小	寺間 電離箱 最大	寺間 電離箱 平均	寺間 電離箱 最小	降水量 (mm)	感雨 有無
1	38.5	37.9	37.2	74.2	72.1	70.3		
2	38.6	37.7	37.1	73.5	71.8	69.9		
3	41.3	38.2	37.3	76.3	72.3	70.1	0.5	○
4	50.6	42.0	37.1	84.6	76.4	71.2	13.5	○
5	37.8	37.1	36.3	73.2	71.6	69.8		○
6	38.3	36.9	36.5	73.0	71.1	69.1		○
7	41.9	38.5	36.8	77.5	73.5	70.9	4.5	○
8	38.8	38.1	37.2	74.9	73.0	70.7		○
9	38.1	37.4	36.8	73.9	72.0	70.5		○
10	38.7	37.9	37.1	74.3	72.5	70.4		○
11	38.5	37.9	37.3	74.5	72.4	70.7		
12	38.7	37.9	37.3	74.5	72.7	70.9		
13	38.1	37.5	36.9	73.7	72.3	70.7		
14	38.1	37.4	36.8	73.5	72.0	70.5		
15	38.1	37.4	36.9	73.2	72.0	69.8		
16	38.8	37.9	37.2	74.2	72.3	70.2		
17	38.7	38.0	37.4	73.8	72.4	70.3		
18	42.8	38.3	37.4	77.1	72.8	71.0		○
19	48.7	39.4	37.4	83.1	74.7	72.0	1.5	○
20	40.5	38.1	37.5	75.4	73.1	70.9		○
21	40.1	38.3	37.4	75.4	72.8	70.6		○
22	38.5	37.9	37.4	73.9	72.1	70.4		
23	38.7	37.9	37.4	75.0	72.9	71.1		
24	38.7	38.1	37.6	74.6	72.8	71.3		
25	39.7	38.3	37.5	75.4	72.9	70.7		
26	47.4	42.8	37.6	81.9	77.0	71.6	23.5	○
27	39.2	37.1	36.4	74.1	71.9	69.6	0.5	○
28	37.9	37.1	36.5	73.7	72.0	70.0		
29	38.7	37.4	36.5	74.2	72.0	69.7		
30	37.8	37.2	36.7	73.2	71.6	70.1		
31	48.8	39.4	37.1	84.4	74.3	70.9	6.5	○
月　間	50.6	38.2	36.3	84.6	72.7	69.1	50.5	
標準偏差		1.7			1.8			
欠測率（%）		0.1			0.1			

令和7年度

表－３－１－３　　3月における空間ガンマ線量率測定結果（１０）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	江島							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量	感雨
	最大	平均	最小	最大	平均	最小	(mm)	有無
1	33.5	33.0	32.3	65.1	63.6	62.3		
2	33.3	32.6	32.0	64.3	63.0	61.9		○
3	37.6	33.2	32.1	68.2	63.6	61.7	0.5	○
4	43.7	37.6	32.2	74.4	68.2	62.7	14.5	○
5	32.7	32.0	31.3	64.7	63.0	61.0		○
6	33.1	31.9	31.4	63.9	62.4	61.2		○
7	36.5	33.5	32.1	67.1	64.7	62.8	5.0	○
8	34.0	33.4	32.9	65.6	64.4	62.8		○
9	33.0	32.4	31.8	65.3	63.4	61.9		○
10	33.3	32.6	31.9	65.3	63.7	62.2		○
11	33.4	32.7	32.2	65.1	63.7	62.4		
12	33.4	32.7	32.1	65.1	63.9	62.3		
13	33.1	32.3	31.7	64.8	63.4	62.1		
14	33.2	32.3	31.6	65.0	63.3	61.9		○
15	32.8	32.2	31.7	64.8	63.1	61.8		○
16	33.5	32.7	32.0	65.2	63.6	62.3		○
17	33.2	32.7	32.0	65.1	63.6	62.3		
18	37.3	32.9	32.2	68.7	63.9	62.1		○
19	44.1	34.2	32.1	75.2	65.8	63.3	1.5	○
20	35.5	32.8	32.2	66.7	64.1	62.5		○
21	34.9	33.1	32.0	66.5	64.0	62.5		○
22	33.3	32.6	32.2	64.6	63.3	62.2		
23	33.9	32.8	32.1	65.5	64.0	62.7		○
24	33.4	32.9	32.3	65.6	63.9	62.5		
25	34.7	33.2	31.9	65.8	64.0	62.2		
26	42.4	37.2	32.1	73.8	67.8	62.1	17.5	○
27	35.1	32.0	31.4	65.4	63.1	61.7		○
28	33.1	32.1	31.1	65.4	63.5	61.3		
29	33.6	32.2	31.5	65.3	63.1	61.6		
30	32.4	31.9	31.4	64.0	62.5	61.2		○
31	45.3	34.2	31.7	75.7	65.4	61.7	8.5	○
月　間	45.3	33.0	31.1	75.7	64.0	61.0	47.5	
標準偏差	1.8			1.8				
欠測率（%）	0.1			0.1				

令和7年度

表－３－１－３　　3月における空間ガンマ線量率測定結果（１１）

単位：nGy/h

局 / 項目 / 日	前網 NaI(Tl) 最大	前網 NaI(Tl) 平均	前網 NaI(Tl) 最小	前網 電離箱 最大	前網 電離箱 平均	前網 電離箱 最小	降水量 (mm)	感雨 有無
1	53.3	52.5	51.8	83.1	81.6	80.1		
2	53.0	52.5	52.0	82.9	81.3	79.5		
3	57.3	53.1	52.1	86.4	81.9	79.9		
4	61.9	56.2	51.5	91.8	85.5	80.2		
5	52.4	51.7	51.0	82.8	81.0	79.3		
6	53.5	51.9	51.4	83.2	80.8	79.4		
7	56.3	53.3	51.7	86.7	83.1	81.2		
8	53.5	53.0	52.2	84.4	82.4	80.5		
9	53.0	52.5	51.9	83.4	81.7	80.4		
10	53.6	52.9	52.2	83.7	82.2	80.8		
11	53.4	52.9	52.3	83.7	81.9	80.6		
12	53.8	52.9	52.4	84.1	82.3	80.7		
13	53.6	52.7	52.0	83.7	82.1	80.9		
14	53.3	52.7	51.9	83.8	81.9	80.5		
15	53.1	52.6	52.1	83.5	81.8	80.2		
16	53.9	53.1	52.5	83.9	82.2	80.4		
17	53.8	53.2	52.5	84.1	82.2	80.8		
18	56.8	53.5	52.8	86.8	82.6	80.4		
19	61.9	54.3	52.7	91.7	84.3	81.6		
20	55.4	53.4	52.7	85.3	83.0	81.7		
21	55.6	53.6	52.5	84.7	82.7	80.5		
22	53.7	53.2	52.6	83.5	82.0	80.4		
23	54.4	53.5	52.7	84.5	83.1	81.5		
24	54.1	53.6	53.0	84.6	82.8	81.0		
25	55.2	53.9	52.9	84.8	82.8	81.3		
26	61.8	57.7	52.9	91.2	86.8	81.3		
27	54.6	52.1	51.1	84.1	81.3	79.8		
28	53.5	52.3	51.3	83.9	81.8	80.5		
29	53.7	52.5	51.7	83.9	81.7	79.7		
30	53.1	52.4	51.6	83.1	81.2	79.7		
31	64.2	54.1	52.1	94.0	83.7	80.3		
月　間	64.2	53.2	51.0	94.0	82.4	79.3		
標準偏差		1.6			1.7			
欠測率（%）		0.1			0.1			

令和7年度

（2）海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

表－３－２－１　　1月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

項目 / 日	放水口モニター											
	１号機（A）			１号機（B）			２号機			３号機		
	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小
1	312	293	272	264	248	232	434	414	397	488	470	453
2	314	292	277	261	246	231	430	415	402	490	467	450
3	312	293	275	264	248	231	429	416	401	488	469	447
4	306	292	277	262	247	234	439	416	401	487	468	451
5	314	291	269	262	246	228	433	417	398	490	468	451
6	301	285	267	257	242	225	436	416	399	483	468	452
7	298	286	267	254	242	229	435	416	402	493	471	444
8	303	284	264	262	242	223	436	418	404	490	474	457
9	299	286	271	256	243	230	435	416	397	484	468	454
10	309	290	274	262	244	231	435	418	397	489	472	459
11	304	287	274	258	244	230	436	421	404	494	476	457
12	299	287	276	258	244	232	443	420	397	489	467	444
13	302	288	270	257	243	225	437	420	406	496	476	452
14	304	288	276	255	244	230	443	418	403	490	470	454
15	311	289	270	257	245	230	441	420	403	500	470	439
16	302	289	269	259	243	228	436	419	401	490	469	447
17	309	289	273	260	244	230	432	417	400	495	467	446
18	302	288	274	256	243	231	432	417	403	482	465	447
19	313	287	268	260	242	224	435	418	397	493	470	449
20	304	286	273	256	240	228	439	415	394	496	468	448
21	295	282	267	253	238	225	432	415	400	488	464	446
22	308	285	272	251	239	227	431	413	394	485	467	447
23	301	287	274	257	243	233	425	412	393	482	467	447
24	301	288	271	260	243	229	431	412	393	484	470	456
25	300	288	271	260	243	229	433	413	390	488	471	451
26	302	288	276	259	243	230	427	410	392	483	468	447
27	306	285	272	256	240	225	432	413	400	492	475	457
28	305	288	275	256	243	227	430	412	396	496	470	452
29	304	289	273	261	243	231	429	413	397	486	469	452
30	304	286	264	254	241	224	429	412	394	484	469	454
31	306	285	271	256	240	225	432	414	396	486	470	453
月間	314	288	264	264	243	223	443	416	390	500	469	439
標準偏差	7			6			7			8		
欠測率(%)	0.2			0.2			0.8			0.8		

令和7年度

表－３－２－２　　2月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

項目 / 日	放水口モニター											
	１号機（A）			１号機（B）			２号機			３号機		
	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小
1	305	288	274	253	241	227	433	414	400	484	468	451
2	305	288	275	257	241	227	431	414	394	492	470	451
3	－	－	－	255	240	228	428	413	389	487	467	439
4	－	－	－	259	237	222	438	411	399	482	467	449
5	－	－	－	251	238	222	428	410	393	486	469	447
6	－	－	－	255	239	228	433	410	388	485	470	449
7	－	－	－	255	239	227	427	411	393	487	466	450
8	－	－	－	251	239	226	434	414	400	489	471	448
9	－	－	－	255	242	223	429	412	388	483	468	449
10	－	－	－	265	245	236	426	410	392	486	465	447
11	－	－	－	255	244	231	429	412	398	488	469	454
12	－	－	－	258	243	234	430	412	396	486	468	450
13	－	－	－	258	244	229	426	412	397	487	465	444
14	－	－	－	260	244	231	426	409	393	486	467	447
15	－	－	－	255	244	230	427	410	393	491	472	454
16	－	－	－	258	242	227	428	410	394	486	468	442
17	－	－	－	256	243	230	427	409	393	487	467	451
18	295	277	258	258	242	230	426	412	400	491	475	452
19	297	279	261	255	242	229	440	412	396	491	472	453
20	299	279	263	257	244	232	434	410	390	489	468	449
21	301	280	263	256	244	229	428	409	388	498	476	454
22	292	276	260	258	241	228	423	407	388	496	482	458
23	299	275	249	256	240	226	424	406	388	494	472	447
24	293	275	260	253	242	225	418	403	386	483	464	445
25	294	274	254	257	241	228	422	405	383	496	465	440
26	301	270	248	267	239	226	418	404	389	479	459	441
27	295	274	254	258	240	226	422	406	386	482	463	444
28	307	278	260	256	243	232	424	409	395	486	469	453
月間	(307)	(278)	(248)	267	242	222	440	410	383	498	469	439
標準偏差	(9)			6			7			9		
欠測率(%)	52.1			1.9			1.8			2.0		

－：有効データ数が１日の半数に満たないこと（日欠測）を示す。
（注）１号機放水口モニター（A）の２月３日～１７日の日欠測は、定期点検によるものである。
（　）は、有効データ数が当該月の半数に満たないことから、参考値扱いしたことを示す。

令和7年度

表－３－２－３　　3月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

項目 / 日	放水口モニター											
	１号機（A）			１号機（B）			２号機			３号機		
	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小
1	293	273	256	254	239	224	424	404	389	482	463	445
2	299	277	258	257	242	229	426	404	388	477	460	434
3	305	279	262	254	243	232	428	407	384	481	464	446
4	301	279	262	267	243	229	434	410	396	483	466	448
5	298	279	263	257	241	227	428	409	392	479	465	445
6	307	281	265	267	244	229	427	407	392	481	462	445
7	303	281	267	257	244	232	428	410	395	482	467	445
8	301	278	263	259	242	228	432	410	394	486	465	442
9	296	277	260	259	243	229	427	410	392	483	463	442
10	294	274	256	256	239	227	426	409	390	487	466	449
11	296	276	257	260	240	228	426	409	390	480	466	450
12	301	281	255	257	243	229	429	411	395	480	466	447
13	298	283	264	261	244	228	430	410	396	482	466	449
14	302	282	267	254	243	229	430	411	394	486	471	456
15	303	281	263	256	244	233	425	410	394	485	469	452
16	296	276	256	260	240	227	427	407	388	480	462	446
17	297	275	253	255	239	227	420	404	387	479	463	444
18	310	276	251	254	239	224	419	405	390	483	465	446
19	297	279	260	260	242	229	430	410	395	488	471	455
20	303	279	262	257	241	228	426	408	385	481	466	448
21	298	279	259	256	241	225	425	407	390	482	464	442
22	299	277	259	258	240	225	421	407	392	483	463	447
23	299	279	260	258	241	228	435	410	396	498	474	453
24	299	279	259	254	241	230	428	408	390	484	466	444
25	293	273	254	260	239	223	419	406	391	490	469	445
26	294	275	256	257	240	227	422	406	389	483	465	445
27	298	274	256	253	238	224	419	405	384	477	463	446
28	297	278	257	255	241	229	423	406	387	494	475	457
29	307	280	262	258	242	231	425	404	385	499	476	452
30	297	275	250	251	240	225	418	404	386	485	469	451
31	298	276	257	253	240	227	424	407	387	496	473	454
月間	310	278	250	267	241	223	435	408	384	499	467	434
標準偏差	8			6			7			8		
欠測率(%)	0.2			0.2			1.6			2.0		

令和7年度

（３）ダストモニタによる大気中の放射性物質の濃度

表３－３　大気中の放射性物質の全アルファ及び全ベータ放射能濃度測定結果

調査機関	局名	測定項目	項目	1月	2月	3月	過去4年度の測定値	単位
宮城県	飯子浜	全ベータ放射能濃度	平均値	1.37	1.59	1.54	1.33	Bq/m^3
			標準偏差	0.93	1.18	1.31	1.27	
			最大値	6.18	7.76	11.21	26.54	
			最小値	0.24	0.15	0.09	0.01	
		全アルファ放射能濃度	平均値	1.16	1.37	1.34	1.06	
			標準偏差	0.78	1.01	1.13	1.00	
			最大値	5.54	6.52	9.55	20.63	
			最小値	0.20	0.14	0.09	0.01	
		全ベータ／全アルファ放射能濃度比	平均値	1.18	1.15	1.15	1.25	
			標準偏差	0.07	0.07	0.07	0.10	
			最大値	1.41	1.39	1.50	2.83	
			最小値	0.96	0.96	1.00	0.22	
		欠測率		0.1	0.0	0.1		%
	鮫浦	全ベータ放射能濃度	平均値	1.39	1.54	1.57	1.28	Bq/m^3
			標準偏差	0.94	1.10	1.27	1.18	
			最大値	6.16	6.56	12.90	35.89	
			最小値	0.26	0.16	0.10	0.01	
		全アルファ放射能濃度	平均値	1.12	1.25	1.45	1.02	
			標準偏差	0.75	0.89	1.17	0.92	
			最大値	4.79	5.35	11.98	26.67	
			最小値	0.22	0.14	0.07	0.01	
		全ベータ／全アルファ放射能濃度比	平均値	1.23	1.24	1.09	1.25	
			標準偏差	0.07	0.08	0.08	0.10	
			最大値	1.48	1.62	1.48	4.92	
			最小値	1.06	1.05	0.94	0.42	
		欠測率		0.1	0.0	0.1		%

令和７年度

（４）空間ガンマ線積算線量測定結果

表－３－４　（１）　蛍光ガラス線量計による積算線量測定結果（宮城県調査分）

単位：mGy／90日

調査機関	地点番号	測定地点名	令和７年度第４四半期	前年度までの測定値[*1] 最小値～最大値（参考） （上段）S56年度～H22年度第3四半期 （下段）H24年度～R6年度[*2]
宮城県	ＭＰ－　１	出　　島[*3]	0.14	0.12 ～ 0.17 0.13 ～ 0.20
	ＭＰ－　２	尾　　浦[*4]	0.13	0.11 ～ 0.15 0.13 ～ 0.17
	ＭＰ－　３	桐　ヶ　崎[*3]	0.13	0.10 ～ 0.14 0.12 ～ 0.16
	ＭＰ－　４	高　　白[*3]	0.13	0.10 ～ 0.14 0.12 ～ 0.18
	ＭＰ－　５	大　石　原[*3]	0.14	0.13 ～ 0.16 0.13 ～ 0.19
	ＭＰ－　６	野　々　浜[*3]	0.15	0.12 ～ 0.17 0.14 ～ 0.19
	ＭＰ－　７	大　谷　川[*3]	0.15	0.11 ～ 0.14 0.14 ～ 0.17
	ＭＰ－　８	十八成浜[*3]	0.15	－ 0.14 ～ 0.17 [*5]
	ＭＰ－　９	泊　　浜	0.15	0.15 ～ 0.21 0.14 ～ 0.21
	ＭＰ－１０	桃　　浦[*3]	0.12	0.10 ～ 0.12 0.12 ～ 0.19
	ＭＰ－１１	小　網　倉[*3]	0.19	0.12 ～ 0.17 0.18 ～ 0.21
	ＭＰ－１２	大　原　浜	0.12	0.11 ～ 0.15 0.11 ～ 0.17
	ＭＰ－１３	女川ＭＳ	0.12	0.10 ～ 0.13 0.12 ～ 0.15
	ＭＰ－１４	飯子浜ＭＳ[*4]	0.14	0.14 ～ 0.17 0.14 ～ 0.22
	ＭＰ－１５	小屋取ＭＳ	0.13	0.13 ～ 0.17 0.14 ～ 0.20
	ＭＰ－１６	寄磯ＭＳ	0.14	0.12 ～ 0.17 0.14 ～ 0.22
	ＭＰ－１７	鮫浦ＭＳ	0.16	0.13 ～ 0.17 0.16 ～ 0.17 [*6]
	ＭＰ－１８	谷川ＭＳ[*4]	0.16	0.12 ～ 0.16 0.15 ～ 0.20
	ＭＰ－１９	荻浜ＭＳ[*4]	0.15	0.15 ～ 0.17 0.14 ～ 0.20

*1 福島第一原発事故の前後に分けて過去の測定値の範囲を表示した。
なお昭和56年度～平成22年度第3四半期測定値は、熱蛍光線量計によるものである。
*2 平成22年度第4四半期～平成23年度第4四半期は震災の影響により測定機器が消失し欠測となった。
また、集落の被災状況や復旧工事等の影響により、欠測期間や代替箇所での測定期間がある。
*3 令和3年度第1四半期から更新した積算線量計収納設備により測定している。
*4 令和4年度第1四半期から更新した積算線量計収納設備により測定している。
*5 令和元年度第1四半期から測定を開始した。
*6 令和元年度第1四半期から測定を再開した。

表－３－４（２） 蛍光ガラス線量計による積算線量測定結果（東北電力調査分）

単位：mGy/90日

調査機関	地点番号	測定地点名	令和７年度 第４四半期	前年度までの測定値[*1] 最小値～最大値（参考） （上段）S56年度～H22年度第3四半期 （下段）H22年度第4四半期～R6年度
東北電力	ＭＰ－２０	小 屋 取	0.15	0.14 ～ 0.17 0.15 ～ 0.38
	ＭＰ－２１	牧 浜	0.13	－ 0.13 ～ 0.14 *2
	ＭＰ－２２	横 浦	0.16	0.12 ～ 0.15 0.15 ～ 0.26
	ＭＰ－２３	女 川	0.13	0.11 ～ 0.15 0.13 ～ 0.21
	ＭＰ－２４	竹 浦	0.14	0.11 ～ 0.15 0.12 ～ 0.17
	ＭＰ－２５	寄 磯	0.16	0.13 ～ 0.18 0.15 ～ 0.22
	ＭＰ－２６	鮫 浦	0.14	0.13 ～ 0.17 0.14 ～ 0.25
	ＭＰ－２７	谷 川	0.15	0.13 ～ 0.17 0.14 ～ 0.23
	ＭＰ－２８	荻 浜	0.18	0.13 ～ 0.17 0.14 ～ 0.31
	ＭＰ－２９	塚浜ＭＳ	0.16	0.15 ～ 0.18 0.15 ～ 0.41
	ＭＰ－３０	寺間ＭＳ	0.14	0.13 ～ 0.18 0.14 ～ 0.37
	ＭＰ－３１	江島ＭＳ	0.13	0.11 ～ 0.16 0.13 ～ 0.34
	ＭＰ－３２	前網ＭＳ	0.18	0.17 ～ 0.23 0.18 ～ 0.58

*1 福島第一原発事故の前後に分けて過去の測定値の範囲を表示した。
なお、昭和56年度～平成26年度測定値は、熱蛍光線量計によるものである。
*2 令和元年度第1四半期から測定を開始した。

（５）移動観測車による空間ガンマ線量率測定結果

表－３－５（１）　宮城県調査分

単位：nGy/h

調査年月日		R８年２月20日	
天候		晴れ	
No	地点名	測定値	前年度までの測定値[*1] 最小値～最大値（参考） （上段）S60年度～H22年度第3四半期 （下段）H24年度～R6年度[*2]
1	女川駅前	29.4	33.9 ～ 42.6 27.7 ～ 46.8
2	コバルトライン入口	33.4	25.2 ～ 35.7 27.5 ～ 46.4
3	コバルトライン料金所跡	33.8	24.3 ～ 35.7 32.9 ～ 53.3
4	大六天駐車場	32.6	22.1 ～ 34.8 31.0 ～ 50.9
5	コバルトライン横浦西	44.5	27.5 ～ 39.2 42.4 ～ 66.5
6	コバルトライン大石原西	46.8	31.8 ～ 49.7 43.9 ～ 78.1
7	コバルトライン野々浜西	53.4	42.9 ～ 61.8 51.4 ～ 86.5
8	コバルトライン小積インター	58.4	38.3 ～ 55.8 54.8 ～ 133.0
9	コバルトライン小積展望所	38.1	27.0 ～ 38.2 36.7 ～ 50.5
10	コバルトライン大谷川林道	42.9	27.0 ～ 36.8 40.8 ～ 77.2
11	コバルトライン大原インター	42.1	28.7 ～ 46.8 40.5 ～ 76.8
12	水産技術総合センター 旧養殖生産部構内	39.7	27.0 ～ 39.4 34.5 ～ 54.4
13	旧大谷川ポンプ小屋付近	35.8	27.0 ～ 39.8 34.0 ～ 54.2
14	宮城県漁業協同組合 旧鮫浦支所前	39.1	24.7 ～ 37.4 37.6 ～ 48.2
15	付替県道牡鹿側交差点	37.8	28.6 ～ 44.4 39.9 ～ 77.3
16	発電所牡鹿ゲート	38.5	24.4 ～ 42.6 36.8 ～ 78.0
17	寄磯小学校入口	43.5	33.9 ～ 44.8 42.2 ～ 73.1
18	東北電力ＰＲセンター前	36.0	24.7 ～ 35.7 33.6 ～ 56.0
19	小屋取駐車場	34.2	24.6 ～ 35.7 31.0 ～ 47.4
20	旧夏浜海水浴場前	36.3	23.5 ～ 33.1 33.6 ～ 52.8
21	旧飯子浜バス停前	32.4	20.0 ～ 31.5 29.6 ～ 50.6
22	野々浜旧六小・四中前	38.9	27.0 ～ 43.1 40.3 ～ 63.0
23	横浦入口	37.0	26.1 ～ 37.3 32.0 ～ 49.1
24	高白	33.1	23.5 ～ 33.2 31.7 ～ 61.4

*1　測定地点を固定した昭和60年度からの測定値の範囲を福島第一原発事故の前後に分けて示す。

*2　平成22年度第4四半期～平成23年度第4四半期は、震災の影響により欠測となった。
また、集落の被災状況や復旧工事等の影響により、欠測期間や代替箇所での測定期間等がある。

表－３－５（２）　東北電力調査分

単位：nGy/h

調査年月日		R 8 年 2 月 18 日	
天候		晴れ	
No	地点名	測定値	前年度までの測定値[*1] 最小値～最大値（参考） （上段）S60年度～H22年度 （下段）H23年度～R6年度
1	野々浜県道交差点	35.5 *2	33.1 ～ 47.9 31.2 ～ 73.9
2	大石原入口	47.0	42.9 ～ 54.8 45.2 ～ 114.1
3	横浦入口	34.9 *2	26.1 ～ 35.7 33.9 ～ 102.0
4	高白入口	28.9 *2	28.7 ～ 38.3 28.0 ～ 102.4
5	桐ヶ崎	29.5 *2	20.0 ～ 29.6 28.1 ～ 51.7
6	竹浦	31.1 *2	25.2 ～ 35.7 30.4 ～ 54.8
7	飯子浜入口	41.5	31.3 ～ 45.2 38.4 ～ 79.1
8	小積防波堤付近	42.2 *2	29.6 ～ 45.6 *3 39.2 ～ 110.7
9	荻浜	35.6 *2	30.5 ～ 40.1 33.7 ～ 67.8
10	発電所女川ゲート	36.1	31.8 ～ 40.9 33.5 ～ 101.6
11	付替県道第四駐車場	32.9	29.0 ～ 47.0 31.9 ～ 123.3
12	発電所牡鹿ゲート	31.6	25.2 ～ 33.3 30.6 ～ 100.7
13	寄磯岸壁	34.1 *2	24.7 ～ 31.3 33.8 ～ 53.4
14	鮫浦ＭＰ前	33.2 *2	32.2 ～ 45.2 31.7 ～ 92.9
15	大谷川ポンプ小屋前	35.2 *2	31.3 ～ 43.5 32.8 ～ 71.4
16	水産技術総合センター 旧養殖生産部前（谷川）	41.9 *2	30.7 ～ 41.8 40.4 ～ 101.3
17	泊コミュニティセンター付近	51.0	44.5 ～ 59.2 48.6 ～ 107.0

*1　測定地点を固定した昭和60年度からの測定値範囲を福島第一原発事故の前後に分けて示す。
*2　震災の影響により、従来の測定地点付近において測定した。
*3　平成9年度第１四半期に測定地点を移動したが、旧地点のデータを含む。

（6）環境試料の核種分析結果

ア　ゲルマニウム半導体検出器による分析結果

表－３－６－１　月間降下物の核種分析結果（１）

単位：Bq/m^2

調査機関		宮　　城　　県					
試 料 名		降　下　物					
		雨水・ちり					
採取地点		女川町浦宿浜（女川オフサイトセンター）			仙台市宮城野区幸町（環境放射線監視センター）		
採取期間		R8.1.5 ～ R8.2.2	R8.2.2 ～ R8.3.2	R8.3.2 ～ R8.4.2	R8.1.5 ～ R8.2.2	R8.2.2 ～ R8.3.2	R8.3.2 ～ R8.4.2
対象核種	Mn- 54	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 58	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Fe- 59	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 60	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-134	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-137	ＮＤ	ＮＤ	0.11±0.02	0.47±0.03	0.12±0.02	0.22±0.02
天然核種	Be- 7	9.0±0.3	54.3±0.6	103.5±0.8	26.3±0.4	41.3±0.5	92.8±0.8
	K - 40	ＮＤ	ＮＤ	1.1±0.3	1.9±0.3	ＮＤ	ＮＤ
試料採取面積(m^2)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m^2)		1.0	1.7	4.1	4.8	1.8	3.4
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備　　考					対照地点		

表－３－６－２　月間降下物の核種分析結果（２）

単位：Bq/m^2

調査機関		東　北　電　力					
試 料 名		降　下　物					
		雨水・ちり					
採取地点		小　屋　取			牡　鹿　ゲ　ー　ト		
採取期間		R8.1.5 ～ R8.2.2	R8.2.2 ～ R8.3.2	R8.3.2 ～ R8.4.1	R8.1.5 ～ R8.2.2	R8.2.2 ～ R8.3.2	R8.3.2 ～ R8.4.1
対象核種	Mn- 54	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 58	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Fe- 59	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 60	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-134	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-137	0.21±0.02	0.13±0.02	0.13±0.02	0.38±0.02	0.26±0.02	0.24±0.02
天然核種	Be- 7	12.3±0.3	46.6±0.5	107.0±0.7	16.2±0.4	55.4±0.6	99.0±0.7
	K - 40	ＮＤ	1.2±0.2	1.5±0.2	22.3±0.5	11.8±0.4	6.5±0.3
試料採取面積（m^2）		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m^2)		1.1	2.2	4.7	28.7	15.0	11.8
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備　　考							

表－３－６－３　四半期間降下物の核種分析結果

単位：Bq/m^2

調査機関		宮　　城　　県			東　北　電　力	
試 料 名		降　下　物				
		雨水・ちり				
採取地点		飯子浜	鮫浦	谷川浜	塚浜	付替県道
採取期間		R8.1.5 ～ R8.4.2	R8.1.5 ～ R8.4.2	R8.1.5 ～ R8.4.2	R8.1.5 ～ R8.4.1	R8.1.5 ～ R8.4.1
対象核種	Mn- 54	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 58	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Fe- 59	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 60	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-134	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-137	ＮＤ	0.21±0.05	0.38±0.05	0.57±0.05	0.54±0.05
天然核種	Be- 7	144±2	175±2	125±2	106±1	129±1
	K - 40	2.7±0.7	ＮＤ	2.6±0.7	3.1±0.6	2.4±0.5
試料採取面積(m^2)		0.1886	0.1886	0.1886	0.173	0.173
蒸発残渣量(g/m^2)		6.0	6.9	8.3	9.0	6.4
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000
備　　考						

表－３－６－４　陸水の核種分析結果

単位：mBq/L

調査機関		宮　城　県		東北電力
試 料 名		陸　　水		
		水道原水		
採取地点		女川浜	泊浜	針浜
採取月日		R8.1.9	R8.1.9	R8.3.10
対象核種	Mn- 54	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 58	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Fe- 59	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 60	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-134	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-137	ＮＤ	1.4±0.4	ＮＤ
天然核種	Be- 7	ＮＤ	ＮＤ	(9.1)
	K - 40	ＮＤ	23±6	19±5
試料量(L)		20.0	20.0	20.0
測定時間(秒)		80000	80000	80000
備　　考				

（注）NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

表－３－６－５　浮遊じんの核種分析結果（１）

単位：mBq/m^3

調査機関		宮　　城　　県					
試 料 名		浮遊じん					
		－					
採取地点		女川ＭＳ			寄磯ＭＳ		
採取期間		R7.12.25 ～ R8.1.30	R8.1.30 ～ R8.2.27	R8.2.27 ～ R8.3.30	R7.12.25 ～ R8.1.30	R8.1.30 ～ R8.2.27	R8.2.27 ～ R8.3.30
対象核種	Mn- 54	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 58	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Fe- 59	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 60	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-134	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-137	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
天然核種	Be- 7	2.45±0.10	4.3±0.1	4.1±0.1	2.50±0.09	4.7±0.1	3.8±0.1
	K - 40	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
試料量(m^3)		1488	1140	1180	1534	1186	1346
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備　　考							

表－３－６－６　浮遊じんの核種分析結果（２）

単位：mBq/m^3

調査機関		東　北　電　力					
試 料 名		浮遊じん					
		－					
採取地点		塚浜ＭＳ			前網ＭＳ		
採取期間		R8.1.5 ～ R8.2.2	R8.2.2 ～ R8.3.2	R8.3.2 ～ R8.4.1	R8.1.5 ～ R8.2.2	R8.2.2 ～ R8.3.2	R8.3.2 ～ R8.4.1
対象核種	Mn- 54	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 58	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Fe- 59	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 60	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-134	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-137	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
天然核種	Be- 7	2.11±0.03	4.19±0.05	3.41±0.04	2.16±0.03	4.21±0.05	3.44±0.04
	K - 40	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	(0.052)
試料量(m^3)		6031	5924	6327	6124	6053	6507
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備　　考							

（注）NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（　）書きで示す。

表－３－６－７　浮遊じんの核種分析結果（３）

単位：mBq/m^3

調査機関		東北電力	
試 料 名		浮遊じん	
		－	
採取地点		寺間ＭＳ	江島ＭＳ
採取期間		R7.12.23 ～ R8.3.23	R7.12.23 ～ R8.3.23
対象核種	Mn- 54	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 58	ＮＤ	ＮＤ
	Fe- 59	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 60	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-134	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-137	ＮＤ	ＮＤ
天然核種	Be- 7	2.43±0.02	2.35±0.02
	K - 40	ＮＤ	ＮＤ
試料量(m^3)		19835	19317
測定時間(秒)		80000	80000
備　　考			

表－３－６－８　指標植物の核種分析結果

単位：Bq/kg生

調査機関		東北電力
試 料 名		松葉
		－
採取地点		小屋取
採取月日		R8.2.17
対象核種	Mn- 54	ＮＤ
	Co- 58	ＮＤ
	Fe- 59	ＮＤ
	Co- 60	ＮＤ
	Cs-134	ＮＤ
	Cs-137	0.135±0.009
天然核種	Be- 7	15.0±0.2
	K - 40	62.0±0.5
試料量(kg生)		2.00
測定時間(秒)		80000
備　　考		

表－３－６－９　魚介類の核種分析結果

単位：Bq/kg生

調査機関		東北電力
試料名		マガキ
		軟体部
採取地点		飯子浜
採取月日		R8.1.22
対象核種	Mn- 54	ＮＤ
	Co- 58	ＮＤ
	Fe- 59	ＮＤ
	Co- 60	ＮＤ
	Cs- 134	ＮＤ
	Cs- 137	0.030±0.007
天然核種	Be- 7	1.02±0.10
	K- 40	71.7±0.5
試料量(kg生)		2.00
測定時間(秒)		80000
備　考		

表－３－６－１０　海水の核種分析結果

単位：mBq/L

調査機関		宮　城　県		東北電力		
試 料 名		海　水				
		表層水				
採取地点		放水口付近		放水口付近		取水口付近
採取月日		R8.2.3	R8.3.18	R8.1.21	R8.1.21	R8.1.21
処理方法		迅速法	迅速法	共沈法	迅速法	共沈法
対象核種	Mn- 54	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 58	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Fe- 59	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 60	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-134	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-137	ＮＤ	ＮＤ	(2.1)	ＮＤ	ＮＤ
天然核種	Be- 7	ＮＤ	ＮＤ		ＮＤ	
	K - 40	12100±500	11500±500		11300±400	
参考核種	I- 131	ＮＤ	ＮＤ		ＮＤ	
試料量(L)		2.0	2.0	20.0	2.0	20.0
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000
備　　考						

（注）NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（　）書きで示す。

表－３－６－１１　海底土の核種分析結果

単位：Bq/kg乾土

調査機関		東北電力	
試 料 名		海底土	
		表層土	
採取地点		放水口付近	取水口付近
採取月日		R8.1.21	R8.1.21
対象核種	Mn- 54	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 58	ＮＤ	ＮＤ
	Fe- 59	ＮＤ	ＮＤ
	Co- 60	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-134	ＮＤ	ＮＤ
	Cs-137	0.91±0.17	6.1±0.2
天然核種	Be- 7	ＮＤ	ＮＤ
	K - 40	480±7	591±8
試料量(g乾土)		149	146
測定時間(秒)		80000	80000
備　　考			

表－３－６－１２　指標海産物の核種分析結果（１）

単位：Bq/kg生

調査機関			宮　城　県			東　北　電　力		
試 料 名			エゾノネジモク 除付着器					
採取地点			放水口付近	牡鹿半島北側	牡鹿半島西側	前面海域	周辺海域	牡鹿半島南側
採取月日			R8.2.4	R8.2.24	R8.2.24	R8.2.24		R8.2.13
灰化法	対象核種	Mn- 54	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ		ＮＤ
		Co- 58	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ		ＮＤ
		Fe- 59	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ		ＮＤ
		Co- 60	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ		ＮＤ
		Cs-134	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ		ＮＤ
		Cs-137	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ		ＮＤ
	天然核種	Be- 7	1.2±0.2	2.5±0.2	ＮＤ	0.89±0.10		4.2±0.2
		K - 40	194±2	327±2	216±2	185±1		218±1
	試料量(kg生)		1.20	1.20	1.20	1.50		1.50
	測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000		80000
迅速法	参考核種	I- 131	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ		ＮＤ
	試料量(kg生)		1.42	1.65	1.65	1.81		1.54
	測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000		80000
備　　考				対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.13±0.04	対照海域		＊	対照海域

＊　波が高い日が続き、採取できなかったため欠測となった。

表－３－６－１３　指標海産物の核種分析結果（２）

単位：Bq/kg生

調査機関		東北電力
試 料 名		ムラサキイガイ 軟体部
採取地点		前面海域
採取月日		R8.1.19
対象核種	Mn- 54	ＮＤ
	Co- 58	ＮＤ
	Fe- 59	ＮＤ
	Co- 60	ＮＤ
	Cs-134	ＮＤ
	Cs-137	0.042±0.009
天然核種	Be- 7	1.04±0.08
	K - 40	69.8±0.6
試料量(kg生)		1.50
測定時間(秒)		80000
備　　考		

イ　Ｓｒ(ストロンチウム)－９０の分析結果

表－３－６－１４　Ｓｒ－９０の分析結果

調査機関	試料名	部位	採取地点	採取年月日	Ｓｒ－９０　濃度		Ｃａ濃度 (g/kg生)	Ｓｒ単位 (Bq/g・Ca)
					測定値	単位		
宮城県	エゾノネジモク	除付着器	放水口付近	R8.2.4	ＮＤ	Bq/kg生	2.96	ＮＤ
東北電力	マガキ	軟体部	飯子浜	R8.1.22	ＮＤ	Bq/kg生	0.59	ＮＤ
	海水	表層水	放水口付近	R8.1.21	1.6±0.5	mBq/L		
	エゾノネジモク	除付着器	前面海域	R8.2.24	0.036±0.011	Bq/kg生	3.00	0.012±0.004

ウ　Ｈ－３(トリチウム)の分析結果

表－３－６－１５　Ｈ－３の分析結果

調査機関	試料名		採取地点	採取年月日	Ｈ－３濃度	
					測定値	単位
宮城県	陸水	水道原水	女川浜	R8.1.9	ＮＤ	mBq/L
			泊浜	R8.1.9	ＮＤ	
東北電力	海水	表層水	放水口付近	R8.1.21	ＮＤ	
			取水口付近	R8.1.21	ＮＤ	


４．女川原子力発電所の運転状況

（１） １号機の廃止措置の状況

H30/12/21　運転終了
R2/3/18　廃止措置計画認可
R2/7/28～　廃止措置作業（核燃料物質による汚染の除去）に着手
R2/8/3～　「核燃料物質の搬出」，「汚染状況の調査」，「設備の解体撤去」に係る詳細な検討に着手


（２） ２号機の運転状況

項目＼月	1月	2月	3月	計
発電日数　（日）	14	0	0	14
発電時間数　（時間）	313	0	0	313
電力量（発電端）　（10^3kWh）	256,000	0	0	256,000
最大電力　（kW）	836,000	0	0	836,000
時間稼動率*1　（%）	42.1	0.0	0.0	14.5
設備利用率*2　（%）	41.7	0.0	0.0	14.4
備　考	R8/1/1 20:13～R8/1/6 7:00　潮位低下に伴う発電機出力抑制 R8/1/14 1:00　解列（第１２回定期事業者検査のため）			

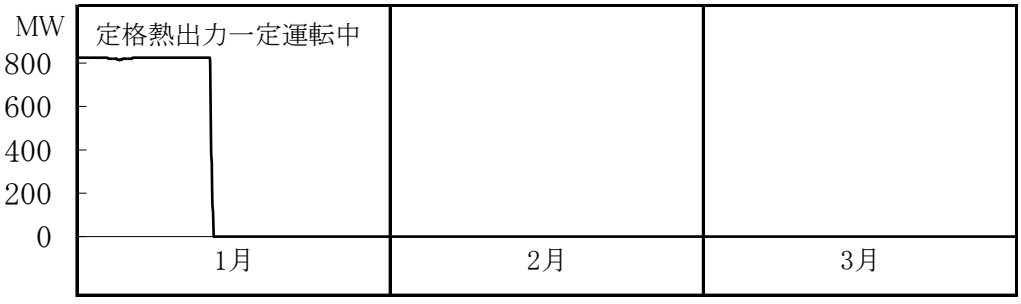

（３）　３号機の運転状況

項目＼月	1月	2月	3月	計
発電日数　（日）	0	0	0	0
発電時間数　（時間）	0	0	0	0
電力量（発電端）　(10^3kWh)	0	0	0	0
最大電力　（kW）	0	0	0	0
時間稼動率*1　（％）	0.0	0.0	0.0	0.0
設備利用率*2　（％）	0.0	0.0	0.0	0.0
備　　考	H23/3/11　地震による原子炉自動停止 H23/9/10～　第７回定期事業者検査			



*1　時間稼動率＝（発電時間／暦時間）×１００（％）

*2　設備利用率＝（発電電力量／（認可出力×暦時間））×１００（％）

(4) 放射性廃棄物の管理状況

単位:Bq


	放射性気体廃棄物						放射性液体廃棄物					
	放射性希ガス *1			Ｉ－131 *2			Ｈ－3を除く *3			Ｈ－３		
	1 号	2 号	3 号	1 号	2 号	3 号	1 号	2 号	3 号	1 号	2 号	3 号
令和8年 1月 ～ 3月	Ｎ Ｄ	Ｎ Ｄ	Ｎ Ｄ	Ｎ Ｄ	Ｎ Ｄ	Ｎ Ｄ	*4 ---	Ｎ Ｄ	*4 ---	*4 ---	8.8×10^{8}	*4 ---
令和7年度 累 計	Ｎ Ｄ	Ｎ Ｄ	Ｎ Ｄ	Ｎ Ｄ	Ｎ Ｄ	Ｎ Ｄ	*4 ---	Ｎ Ｄ	*4 ---	*4 ---	3.7×10^{9}	*4 ---
	Ｎ Ｄ			Ｎ Ｄ			Ｎ Ｄ			3.7×10^{9}		
年間放出管理目標値 *5	2.3×10^{15}			4.1×10^{10}			7.4×10^{9}			*6		

*1 測定下限濃度は2×10^{-2}Bq/cm^3である。
*2 測定下限濃度は7×10^{-9}Bq/cm^3である。
*3 測定下限濃度は2×10^{-2}Bq/cm^3である。(^{60}Coで代表した。)
*4 ---は当該号機放水路からの放射性廃棄物の放出がなかったことを表す。
*5 放出管理目標値は原子炉設置変更許可申請書において設定した値。また、原子炉施設保安規定で定める値である。
*6 原子炉施設保安規定で定める放出管理の基準値は年間7.4×10^{12}Bqである。


（５）モニタリングポスト測定結果　　（単位　nGy/h）

	1月				2月				3月				過去の測定値範囲*1	
	最大	平均	最小	標準偏差	最大	平均	最小	標準偏差	最大	平均	最小	標準偏差	最大	最小
MP-1	50	37	35	1.0	50	37	35	1.3	44	36	34	1.4	70	32
													63	34
MP-2	46	34	32	1.1	46	34	32	1.3	41	33	31	1.3	65	25
													63	31
MP-3	48	35	33	1.0	51	36	33	1.6	44	35	33	1.3	69	30
													66	32
MP-4	48	36	33	1.5	48	35	32	1.7	43	35	32	1.6	67	30
													64	31
MP-5	55	43	41	1.0	56	43	41	1.3	52	43	41	1.4	68	29
													67	33
MP-6	56	43	41	1.2	58	43	41	1.5	53	43	40	1.6	81	44
													71	39
備考	測定器：2” φ×2” NaI（Tl）シンチレーション検出器　温度補償型 ・定期点検による欠測 MP-1：1/13（4個）、1/15（5個）、3/30（85個）、3/31（100個）、MP-2：1/15（4個）、3/27（85個）、3/28（96個）、 MP-3：1/16（5個）、3/25（84個）、3/26（97個）、MP-4：1/16（5個）、3/23（83個）、3/24（93個）、 MP-5：1/9（8個）、1/16（6個）、3/18（81個）、3/19（113個）、MP-6：1/15（6個）、1/20（33個）、3/20（85個）、 3/21（95個） ・非破壊検査用線源搬入作業による欠測 MP-5：2/4（1個）													

*1上段：平成21年4月～平成23年3月11日までの測定値の範囲を示す（福島第一原発事故前）。
　下段：令和5年4月～令和7年3月までの測定値の範囲を示す（福島第一原発事故後）。
　なお、MP-5の過去の測定値範囲は、移設工事前の測定値の範囲を含む。

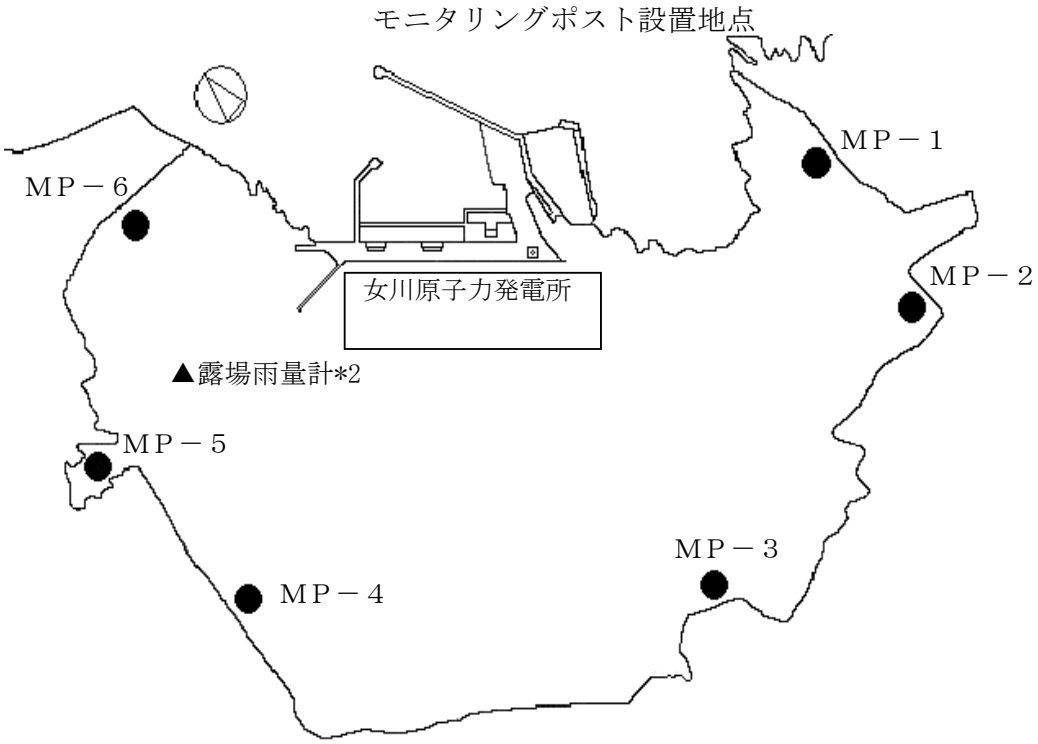


＊2次ページ以降の各モニタリングポストの時系列グラフ中に記載した降水量データは、▲で示した地点に設置した雨量計によって測定した。

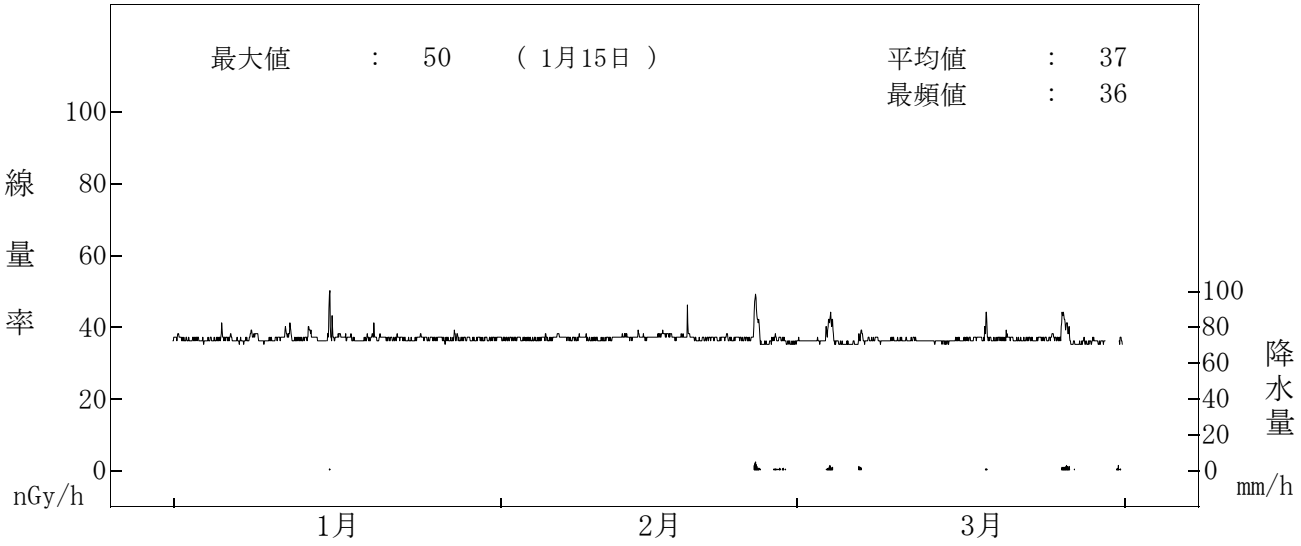

空間ガンマ線量率監視結果(ＭＰ－１)


（注）３月３０日～３１日の欠測は、定期点検によるものである。

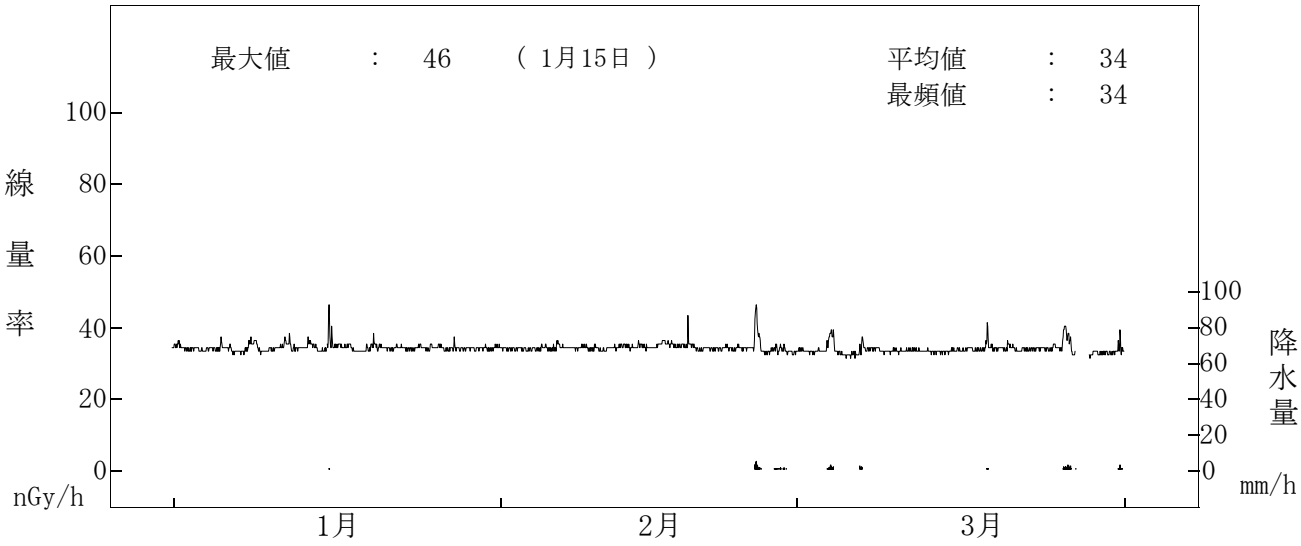

空間ガンマ線量率監視結果(ＭＰ－２)


（注）３月２７日～２８日の欠測は、定期点検によるものである。

令和7年度

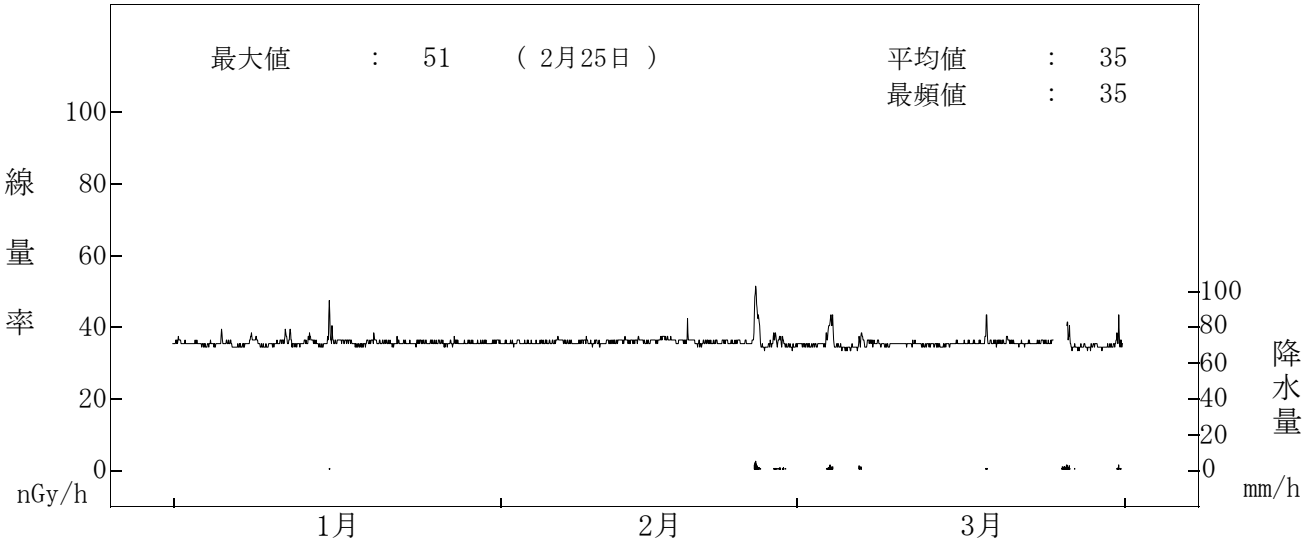

空間ガンマ線量率監視結果(ＭＰ－３)


（注）３月２５日～２６日の欠測は、定期点検によるものである。

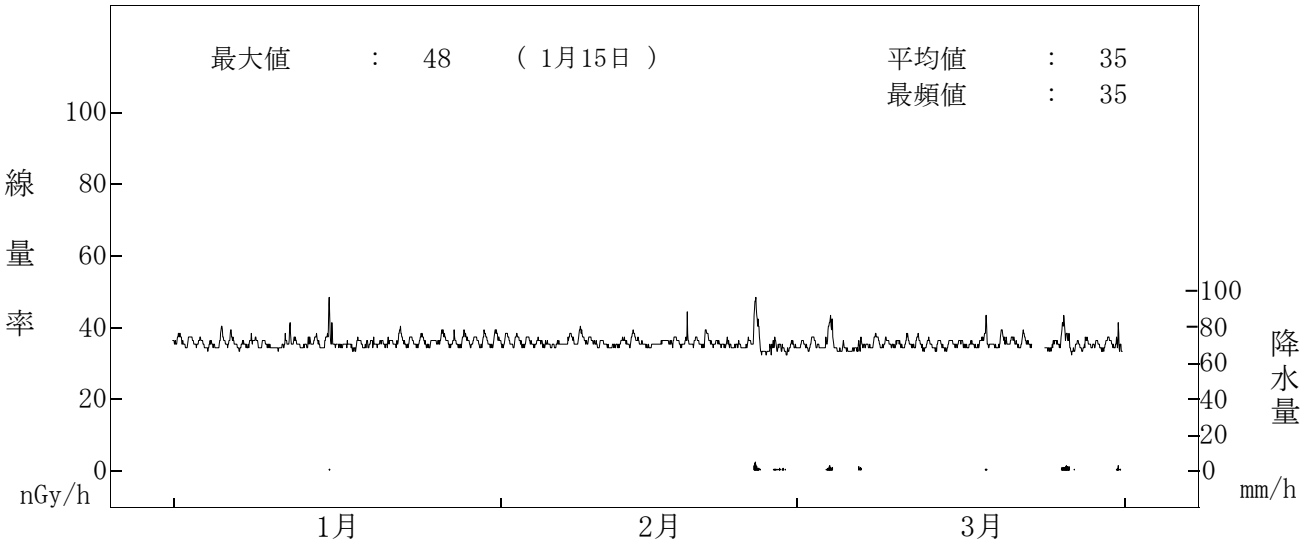

空間ガンマ線量率監視結果(ＭＰ－４)


（注）３月２３日～２４日の欠測は、定期点検によるものである。

令和7年度

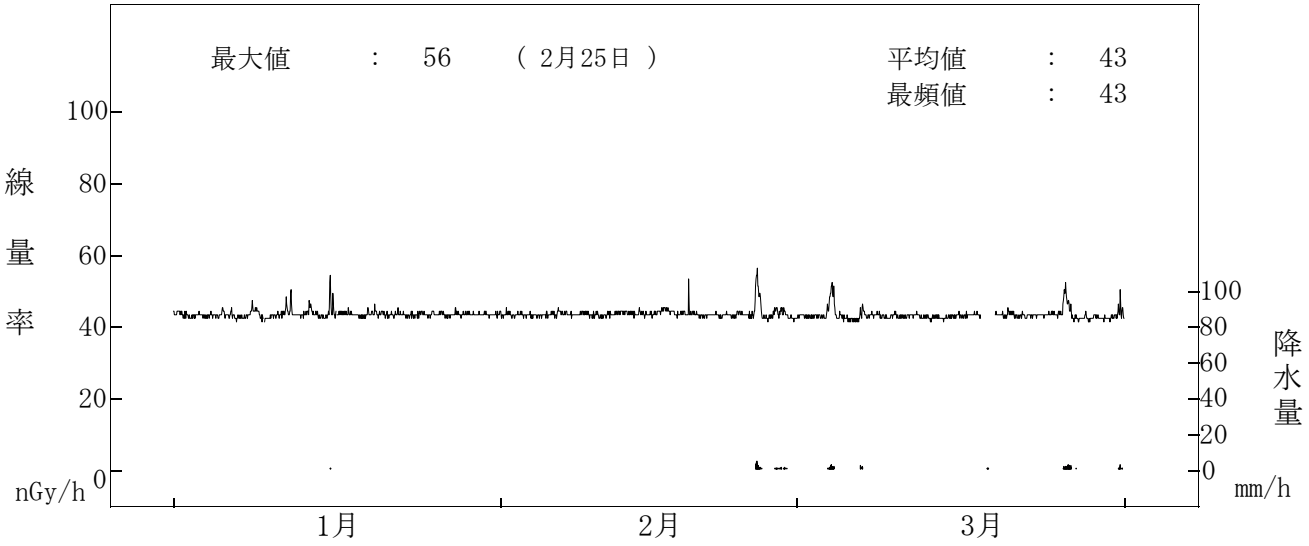

空間ガンマ線量率監視結果(ＭＰ－５)

（注）３月１８日～１９日の欠測は、定期点検によるものである。

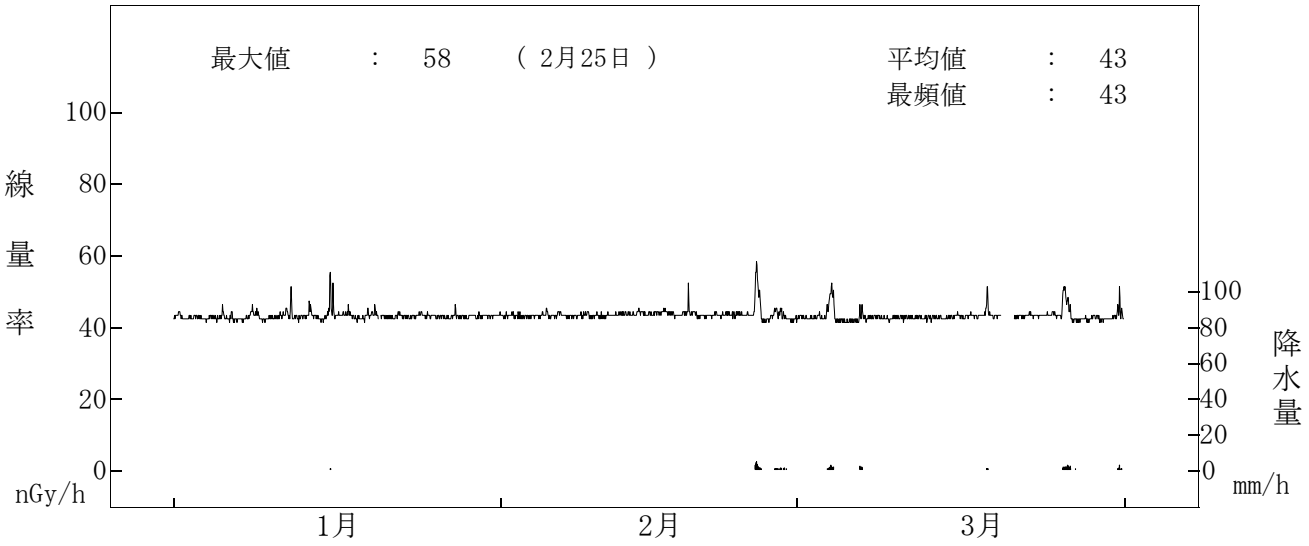

空間ガンマ線量率監視結果(ＭＰ－６)

（注）３月２０日～２１日の欠測は、定期点検によるものである。

令和7年度
